Conceptplanning De Sterrenkring, De Binnenstad en Heijenoordschool
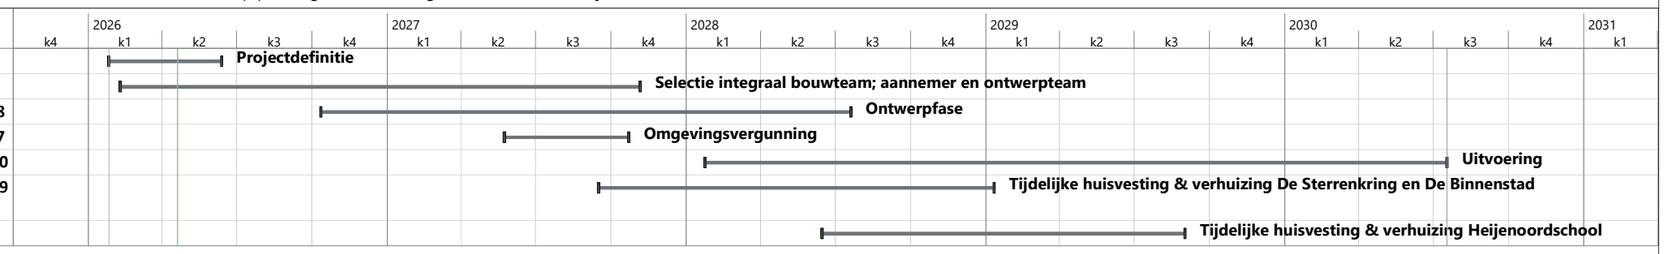
Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**1 Projectdefinitie**	**100 dagen**	**maa 26-1-26**	**vri 12-6-26**
9	**2 Selectie integraal bouwteam; aannemer en ontwerpte**	**445 dagen**	**maa 9-2-26**	**vri 5-11-27**
18	**3 Ontwerpfase**	**443 dagen**	**maa 12-10-2**	**don 20-7-28**
52	**4 Omgevingsvergunning**	**110 dagen**	**maa 24-5-27**	**vri 22-10-27**
56	**5 Uitvoering**	**628 dagen**	**maa 24-1-28**	**woe 17-7-30**
65	**6 Tijdelijke huisvesting & verhuizing De Sterrenkring en De Binnenstad**	**325 dagen**	**don 16-9-27**	**woe 10-1-29**
73	**7 Tijdelijke huisvesting & verhuizing Heijenoordschool**	**307 dagen**	**don 15-6-28**	**vri 31-8-29**
