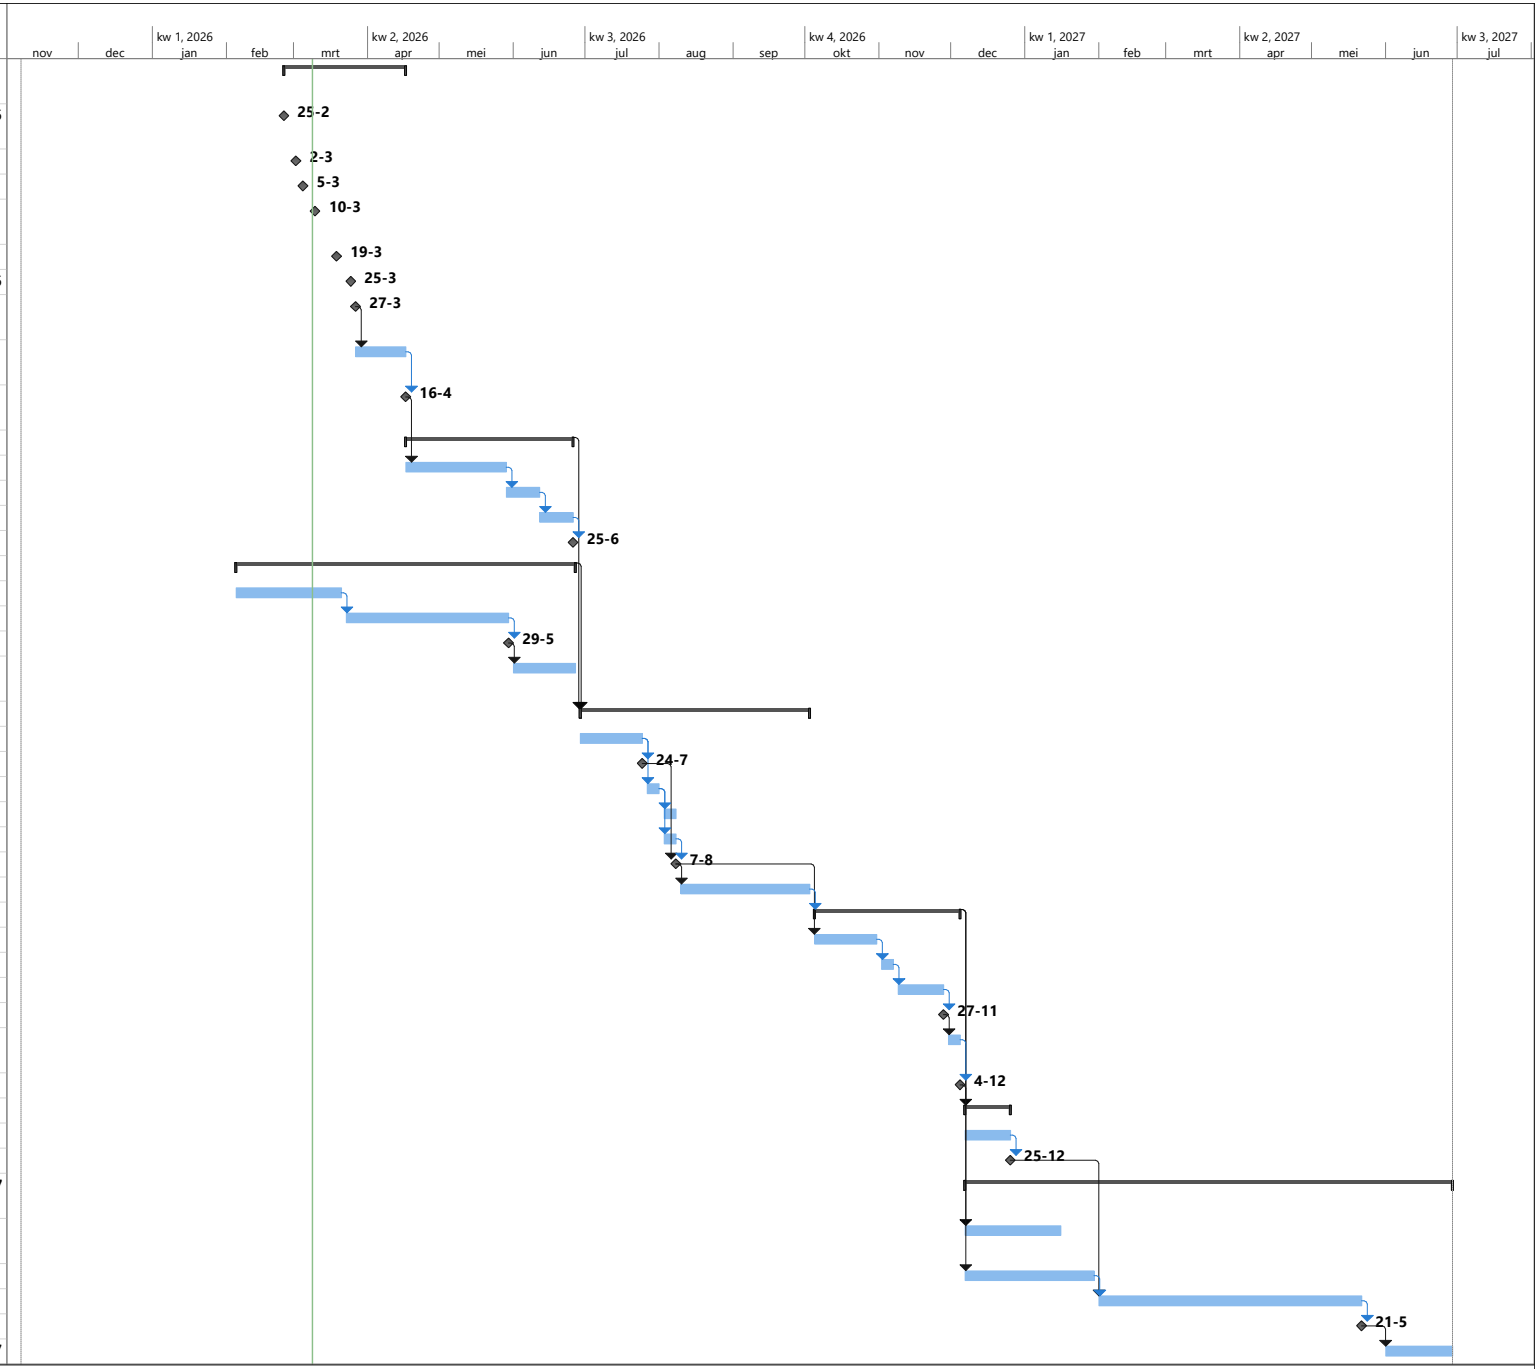Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Aanbesteding ontwerpteam**	**37 dagen**	**woe 25-2-26**	**don 16-4-26**
2	verklaring van deelname	0 dagen	woe 25-2-26	woe 25-2-26
3	bezichtiging Revius	0 dagen	maa 2-3-26	maa 2-3-26
4	indienen vragen	0 dagen	don 5-3-26	don 5-3-26
5	versturen Nota van Inlichtingen	0 dagen	din 10-3-26	din 10-3-26
6	indienen inschrijving	0 dagen	don 19-3-26	don 19-3-26
7	Presentatie	0 dagen	woe 25-3-26	woe 25-3-26
8	mededeling gunningbeslissing	0 dagen	vri 27-3-26	vri 27-3-26
9	eindigen rechtsberschermingsterm	15 dagen	vri 27-3-26	don 16-4-26
10	Contracteren ontwerpteam	0 dagen	don 16-4-26	don 16-4-26
11	**Voorlopig Ontwerp**	**50 dagen**	**vri 17-4-26**	**don 25-6-26**
12	VO maken	6 wkn	vri 17-4-26	don 28-5-26
13	Beoordelen VO	2 wkn	vri 29-5-26	don 11-6-26
14	Definitief VO	2 wkn	vri 12-6-26	don 25-6-26
15	VO afgerond	0 dagen	don 25-6-26	don 25-6-26
16	**Aanbesteding bouwteam**	**102 dagen**	**don 5-2-26**	**vri 26-6-26**
17	Voorbereiding	6,4 wkn	don 5-2-26	vri 20-3-26
18	Gunningsfase	50 dagen	maa 23-3-26	vri 29-5-26
19	Contractering	0 dagen	vri 29-5-26	vri 29-5-26
20	eindigen rechtsberschermingsterm	20 dagen	maa 1-6-26	vri 26-6-26
21	**Definitief Ontwerp**	**70 dagen**	**maa 29-6-26**	**vri 2-10-26**
22	DO maken	4 wkn	maa 29-6-26	vri 24-7-26
23	DO voor stuurgroep	0 dagen	vri 24-7-26	vri 24-7-26
24	Beoordelen DO	1 wk	maa 27-7-26	vri 31-7-26
25	Definitief DO	1 wk	maa 3-8-26	vri 7-8-26
26	DO kostenraming	1 wk	maa 3-8-26	vri 7-8-26
27	DO afgerond	0 dagen	vri 7-8-26	vri 7-8-26
28	Besluit DO - Gemeente	8 wkn	maa 10-8-26	vri 2-10-26
29	**Technisch Ontwerp**	**45 dagen**	**maa 5-10-26**	**vri 4-12-26**
30	TO maken	4 wkn	maa 5-10-26	vri 30-10-26
31	Beoordelen TO	1 wk	maa 2-11-26	vri 6-11-26
32	TO kostenraming	3 wkn	maa 9-11-26	vri 27-11-26
33	Vaststellen prijs	0 dagen	vri 27-11-26	vri 27-11-26
34	Vaststellen TO door stuurgroep	1 wk	maa 30-11-26	vri 4-12-26
35	Contractvorming	0 dagen	vri 4-12-26	vri 4-12-26
36	**Uitvoeringsontwerp**	**15 dagen**	**maa 7-12-26**	**vri 25-12-26**
37	UO maken	3 wkn	maa 7-12-26	vri 25-12-26
38	UO gereed	0 dagen	vri 25-12-26	vri 25-12-26
39	**Voorbereiding en realisatie**	**146 dagen**	**maa 7-12-26**	**maa 28-6-27**
40	Aanstellen en start toezichthouder	6 wkn	maa 7-12-26	vri 15-1-27
41	Bouwvoorbereiding	8 wkn	maa 7-12-26	vri 29-1-27
42	Realisatie	16 wkn	maa 1-2-27	vri 21-5-27
43	Oplevering	0 dagen	vri 21-5-27	vri 21-5-27
44	Inhuizen en nazorg	4 wkn	din 1-6-27	maa 28-6-27
