CONCEPT PLANNING KINDCENTRUM DRONTEN EN SWIFTERBANT

van Kruistum & de Smet BV

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Kindcentrum Dronten**			
2	Structuurontwerp	90 dagen	maa 16-3-26	vri 17-7-26
3	Voorlopig ontwerp	65 dagen	maa 24-8-26	vri 20-11-26
4	Definitief ontwerp	135 dagen	maa 23-11-2(	vri 28-5-27
5	Omgevingsvergunning	85 dagen	maa 1-3-27	vri 25-6-27
6	Technisch ontwerp	65 dagen	maa 1-3-27	vri 28-5-27
7	Prijs en contractvorming en voorbereiding	85 dagen	maa 7-6-27	vri 1-10-27
8	Realisatie kindcentrum Dronten	386 dagen	maa 4-10-27	maa 26-3-29
9	Sloop bestaande scholen	31 dagen	maa 2-4-29	maa 14-5-29
10	Realiseren nieuwe sporthal	155 dagen	maa 21-5-29	vri 21-12-29
11				
12				
13	**Kindcentrum Swifterbant**			
14	Getekend Programma van Eisen	75 dagen	maa 6-4-26	vri 17-7-26
15	Structuurontwerp	90 dagen	maa 24-8-26	vri 25-12-26
16	Voorlopig ontwerp	65 dagen	maa 4-1-27	vri 2-4-27
17	Definitief ontwerp	135 dagen	maa 5-4-27	vri 8-10-27
18	Omgevingsvergunning	85 dagen	maa 2-8-27	vri 26-11-27
19	Technisch ontwerp	65 dagen	maa 2-8-27	vri 29-10-27
20	Prijs en contractvorming en voorbereiding	85 dagen	din 12-10-27	maa 7-2-28
21	Realisatie kindcentrum Swifterbant	386 dagen	maa 7-2-28	maa 30-7-29

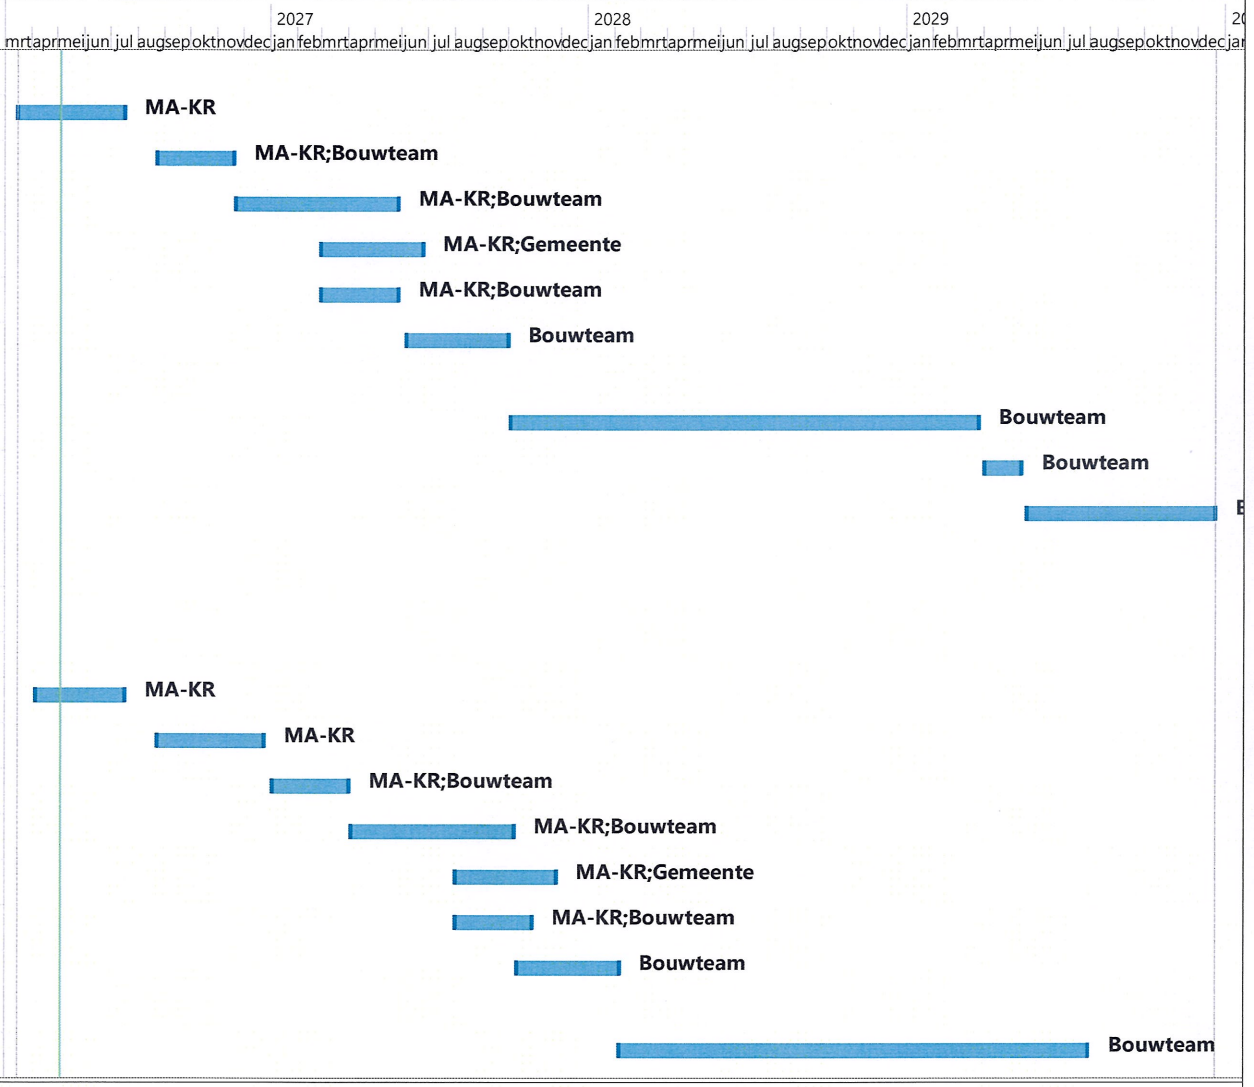

Project: Planning Dronten en Sw
Datum: din 5-5-26

Taak	Inactieve taken	Handmatige samenvatting	Externe mijlpaal		
Splitsing	Inactieve mijlpaal	Handmatige samenvatting	Deadline		
Mijlpaal	Inactieve samenvatting	Alleen begindatum	Voortgang		
Samenvatting	Handmatig taak	Alleen einddatum	Voortgang, handmatig		
Projectsamenvatting	Alleen duur	Externe taken			
