Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken
1		**Masterplanning programma HEZ**	**261 dagen?**	**woe 10-12-25**	**woe 9-12-26**		
2		**BESLUITVORMING & BESTUURLIJKE AFSTEMMING**	**209 dagen?**	**vri 20-2-26**	**woe 9-12-26**		
3		BO HEZ	0 dagen	vri 20-2-26	vri 20-2-26	13;46;52;59;(	16BE+2 we
4		- Go/ no go start procedure	0 dagen	maa 2-3-26	maa 2-3-26	13;46;52;59;(	
5		- lettre of intent samenwerking	0 dagen	maa 2-3-26	maa 2-3-26	13;46;52;59;(	
6		Besluit ontwerp omgevingsplan in B&W	0 dagen?	woe 1-7-26	woe 1-7-26	48	49BE+2,5 n
7		NTB | BO HEZ	1 maand	don 12-11-26	woe 9-12-26	33	43
8		- Go/ no go selectie winnaar	0 dagen	maa 2-11-26	maa 2-11-26		
9		**Programma algemeen**	**1 dag?**	**woe 10-12-25**	**woe 10-12-25**		
10		Jaarplan	1 dag?	woe 10-12-25	woe 10-12-25		
11		**Programma lijn leefomgeving**	**461 dagen?**	**woe 10-12-25**	**woe 15-9-27**		
12		**Partnerselectie**	**444 dagen**	**vri 2-1-26**	**woe 15-9-27**		
13		Formaliseren samenwerking gemeente en Woonstede	1,5 maanden	vri 2-1-26	don 12-2-26		52GB;59GB
14		Voorbereiden Tender	30 dagen	vri 2-1-26	don 12-2-26	13GB	16
15		**Selectiefase**	**43 dagen**	**maa 11-5-26**	**don 9-7-26**		
16		Publicatie selectieleidraad	0 dagen	**maa 11-5-26**	maa 11-5-26	**3BE+2 weker**	17
17		Sluitingstermijn indienen vragen	0 dagen	**din 2-6-26**	din 2-6-26	16	18
18		Publicatie Nota van inlichtingen 1	0 dagen	**din 9-6-26**	din 9-6-26	17	19
19		Sluitingstermijn Indiening Aanmelding	0 dagen	vri 19-6-26	vri 19-6-26	18	20
20		Bekendmaking selectie vijf geïnteresseerden	0 dagen	don 2-7-26	don 2-7-26	19	**21**
21		Bezwaarperiode (7 dagen)	5 dagen	don 2-7-26	**don 9-7-26**	20	**23**
22		**Dialoogfase met 3-5 partijen**	**89 dagen**	**vri 10-7-26**	**woe 11-11-26**		
23		Publicatie dialoogleidraad	0 dagen	vri 10-7-26	vri 10-7-26	21	24
24		Indienen vragen	0 dagen	vri 28-8-26	vri 28-8-26	23	25
25		Verzenden Nota van inlichtingen dialoogfase	0 dagen	vri 4-9-26	vri 4-9-26	24	26
26		Dialoogronde 1	0 dagen	don 10-9-26	don 10-9-26	25	27
27		Publicatie Nota van inlichtingen dialoogronde 1	0 dagen	woe 16-9-26	woe 16-9-26	26	28
28		Sluitingstermijn indiening concept dialoogproducten	0 dagen	din 22-9-26	din 22-9-26	27	29
29		Dialoogronde 2	0 dagen	don 1-10-26	don 1-10-26	28	30
30		Publicatie Nota van inlichtingen dialoogronde 2	0 dagen	woe 7-10-26	woe 7-10-26	29	31
31		Sluitingstermijn indiening dialoogproducten	0 dagen	woe 7-10-26	woe 7-10-26	30	32
32		Bekendmaking selectie drie Gegadigden	0 dagen	don 5-11-26	don 5-11-26	31	33
33		Bezwaarperiode (7 dagen)	5 dagen	don 5-11-26	woe 11-11-26	32	**7;35**
34		**Gunningsfase**	**68 dagen**	**vri 13-11-26**	**din 16-2-27**		
35		Publicatie gunningsleidraad	0 dagen	**vri 13-11-26**	vri 13-11-26	33	36
36		Sluitingstermijn indienen vragen	0 dagen	**vri 20-11-26**	vri 20-11-26	35	37
37		Publicatie Nota van inlichtingen	0 dagen	**vri 27-11-26**	vri 27-11-26	36	38
38		Sluitingstermijn indiening aanbieding	0 dagen	**vri 8-1-27**	vri 8-1-27	37	39
39		Presentatie Gegadigde partners	0 dagen	**don 14-1-27**	don 14-1-27	38	40
40		Bekendmaking uitslag en voorlopige gunning	0 dagen	**don 21-1-27**	**don 21-1-27**	39	41
41		Bezwaarperiode (20 dagen)	14 dagen	**don 21-1-27**	**woe 10-2-27**	40	42
42		Afronding overeenkomst(en)	5 dagen	**woe 10-2-27**	din 16-2-27	41	
43		Bezwaarperiode	1 maand	don 10-12-26	woe 6-1-27	7	44
44		Haalbaarheidsfase	9 maanden	don 7-1-27	woe 15-9-27	43	
45		**Omgevingsplan**	**268 dagen**	**vri 2-1-26**	**din 12-1-27**		
46		PvA Opstellen	1 maand	vri 2-1-26	don 29-1-26	13GB	3;4;5;47
47		Ruimtelijke onderzoeken	4,5 maanden	vri 30-1-26	don 4-6-26	46	48GB
48		Opstellen ontwerp regels, toelichting en verbeelding	4,5 maanden	vri 30-1-26	don 4-6-26	47GB	6
49		Procedure ontwerp omgevingsplan	2,5 maanden	woe 9-9-26	din 17-11-26	6BE+2,5 maa	50BE+1 ma
50		Procedure ontwerp omgevingsplan pt. 2	1 maand	woe 16-12-26	din 12-1-27	49BE+1 maar	
51		**Inrichtingsplan openbare ruimte**	**250 dagen**	**vri 2-1-26**	**don 17-12-26**		
52		PvA Opstellen	1 maand	vri 2-1-26	don 29-1-26	13GB	3;4;5;53
53		Opstellen ontwerp inrichtingsplan VO	4,5 maanden	vri 30-1-26	don 4-6-26	52	54GB+3 ma
54		Participatie VO	1 maand	vri 24-4-26	don 21-5-26	53GB+3 maa	55BE+2,5 n
55		Participatie DO	1 maand	vri 31-7-26	don 27-8-26	54BE+2,5 ma	56
56		Opstellen ontwerp inrichtingsplan DO	2,5 maanden	vri 28-8-26	don 5-11-26	55	57BE+1 ma
57		Opstellen ontwerp inrichtingsplan DO	0,5 maanden	vri 4-12-26	don 17-12-26	56BE+1 maar	
58		**Plintenaanpak**	**205 dagen**	**vri 2-1-26**	**don 15-10-26**		
59		PvA Opstellen	1 maand	vri 2-1-26	don 29-1-26	13GB	3;4;5;60BE
60		Opstellen plan op hoofdlijnen	4 maanden	vri 6-2-26	don 28-5-26	59BE+1 week	61BE+1 ma
61		Uitwerken plintinvulling	4 maanden	vri 26-6-26	don 15-10-26	60BE+1 maar	
62		**Deelgebied Hoge Tuinen - Herstructering**	**300 dagen**	**vri 2-1-26**	**don 25-2-27**		
63		PvA Opstellen	1 maand	vri 2-1-26	don 29-1-26	13GB	3;4;5;65;64
64		Jaarrond onderzoek flora en fauna | bureau BOOT	12 maanden	vri 27-3-26	don 25-2-27	63BE+2 maanden	
65		Uitvoeren sociaal plan | socicaal beheer en leefbaarheid | regie door Nelleke	12 maanden	vri 30-1-26	don 31-12-26	63	
66		**Deelgebied Parkhart**	**70 dagen**	**vri 2-1-26**	**don 9-4-26**		
67		PvA Opstellen	1 maand	vri 2-1-26	don 29-1-26	13GB	68
68		Initiatieffase	2,5 maanden	vri 30-1-26	don 9-4-26	67	
69		**Onderhoud en investeringen**	**164 dagen?**	**vri 15-5-26**	**don 31-12-26**		
70		Willem Marislaan (schilderwerk en console vervanging)	8,2 maanden	vri 15-5-26	don 31-12-26		
71		Stroombergflat (coating vervangen)	131 dagen?	woe 1-7-26	don 31-12-26		
72		Paviljoen	1 dag?	woe 10-12-25	woe 10-12-25		
73		**Groot Haversteeg**	**1 dag?**	**woe 10-12-25**	**woe 10-12-25**		
74		Uitponden	1 dag?	woe 10-12-25	woe 10-12-25		
75		Verduurzaming en kwaliteitsverbtering	1 dag?	woe 10-12-25	woe 10-12-25		
76		**Programma lijn bestaanszekerheid**	**1 dag?**	**woe 10-12-25**	**woe 10-12-25**		
77		Herhuisvesting	1 dag?	woe 10-12-25	woe 10-12-25		
78		Inzet social support team	1 dag?	woe 10-12-25	woe 10-12-25		

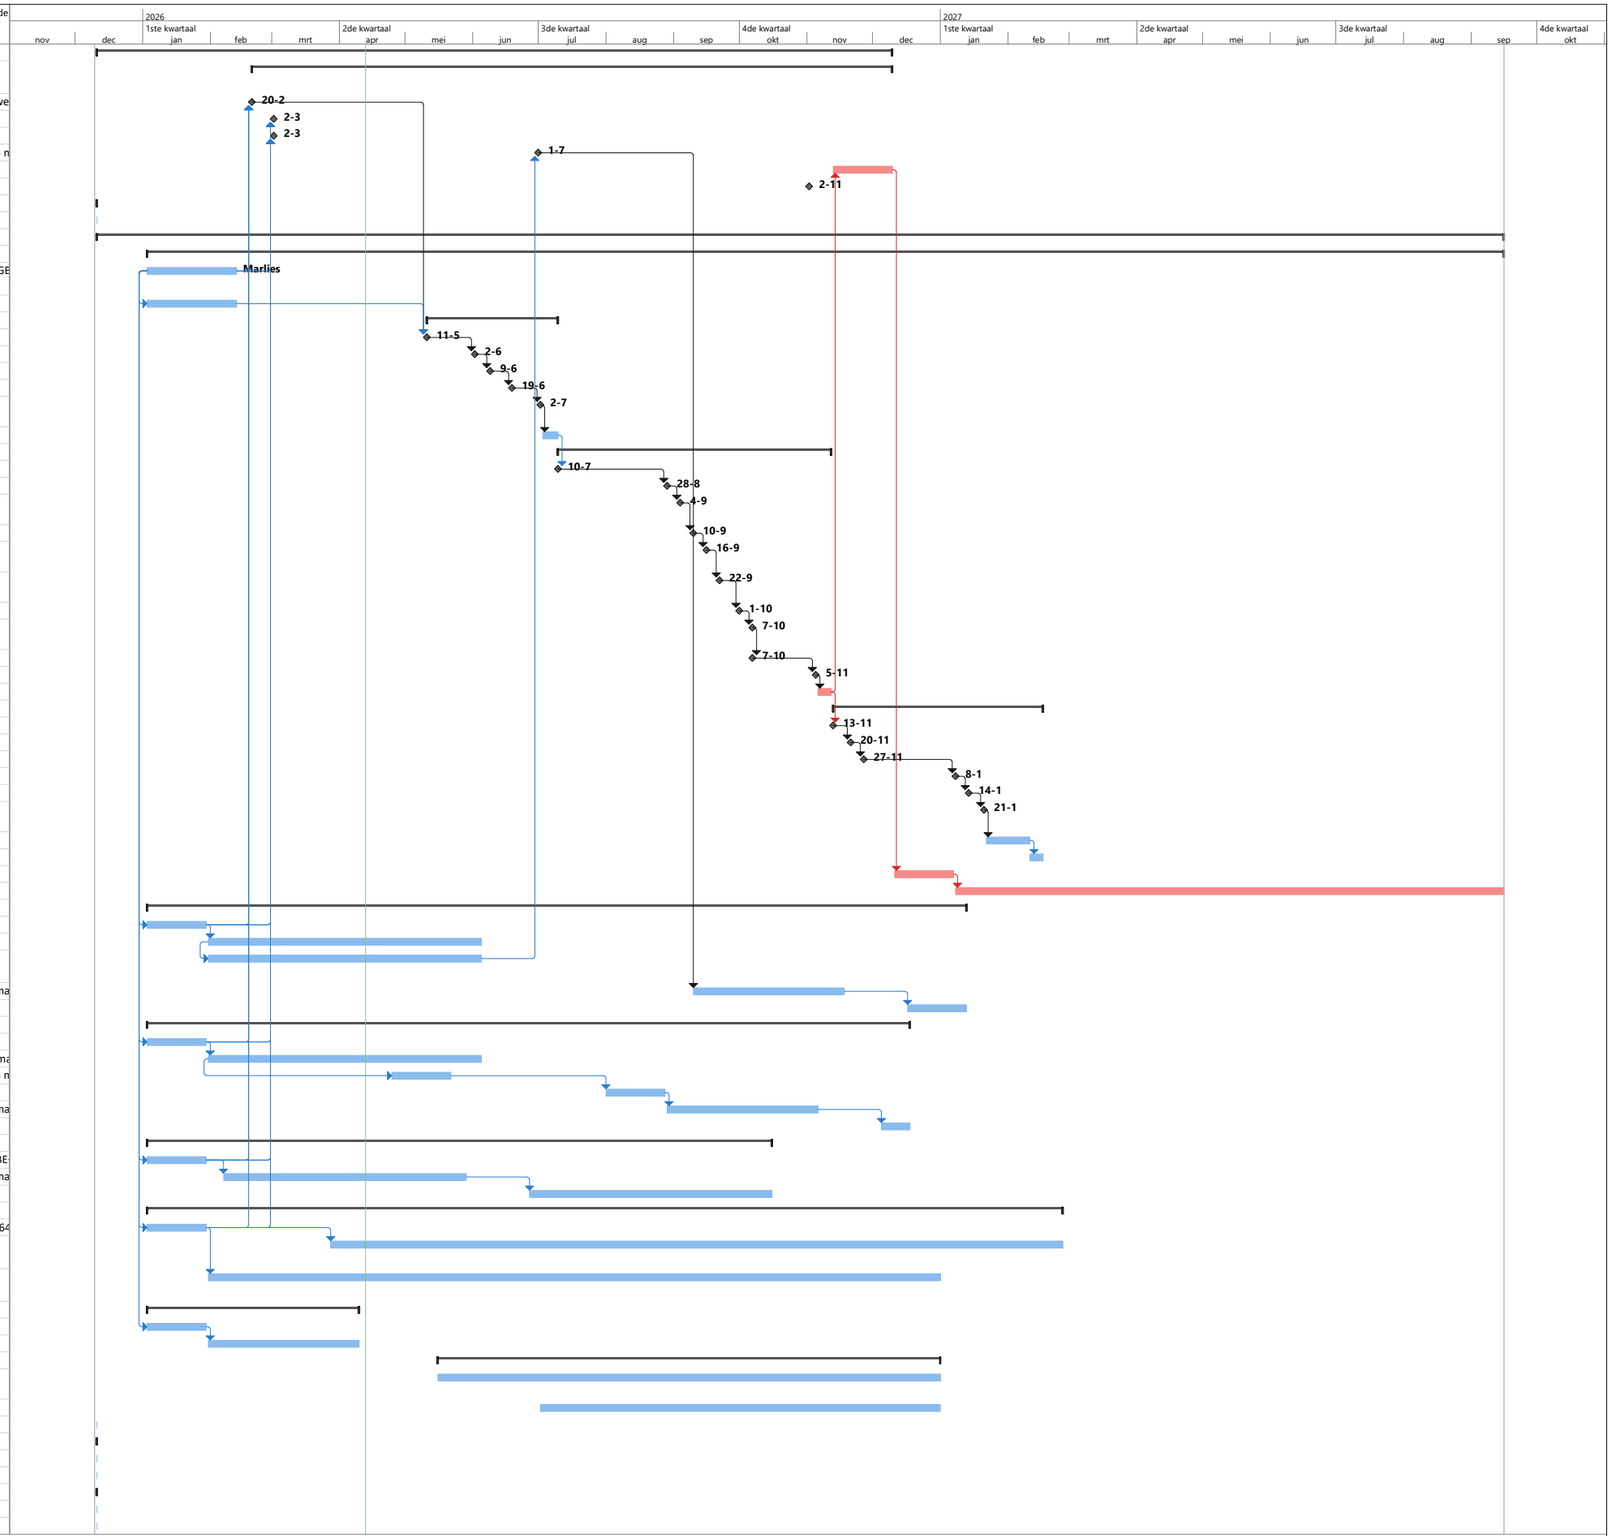

Project: Masterplanning HEZ.m
Datum: maa 13-4-26

Taak | Mijlpaal | Projectsamenvatting | Inactieve mijlpaal | Handmatig taak | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Externe taken | Deadline | Kritieke splitsing | Voortgang, handmatig
Splitsing | Samenvatting | Inactieve taken | Inactieve samenvatting | Alleen duur | Handmatige samenvatting | Alleen einddatum | Externe mijlpaal | Kritiek | Voortgang
