Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Id	Ta	Tijdsdsch taken	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
0			**23798 + VKS Woensdrecht**	**1365 dagen**	**don 7-8-25**	**din 15-7-31**
1		**10.03.01**	**Opstart**	**80 dagen**	**don 7-8-25**	**vri 19-12-25**
4		**10.03.02**	**DEFINITIE**	**180 dagen**	**vri 19-12-25**	**vri 9-10-26**
5			**Herijken behoefte**	**130 dagen**	**vri 2-1-26**	**don 2-7-26**
6			Herijken processen	13 wkn	vri 2-1-26	don 2-4-26
7			Herijken FPvE	6 wkn	vri 3-4-26	don 14-5-26
8			Update definitie document	9 wkn	vri 1-5-26	don 2-7-26
9			**Project initiatie document**	**75 dagen**	**vri 29-5-26**	**vri 9-10-26**
10			Update project initiatie documenten (hoe?)	40 dagen	vri 29-5-26	don 23-7-26
11			proces besluitvorming PID	10 dagen	vri 24-7-26	vri 4-9-26
12			**PID vastgesteld (intern)**	10 dagen	maa 7-9-26	vri 18-9-26
13			**PID vastgesteld (extern)**	15 dagen	maa 21-9-26	vri 9-10-26
14			**Onderzoeken en toestemmingen**	**0 dagen**	**vri 19-12-25**	**vri 19-12-25**
27		**10.03.05**	**CONTRACTVORMING ONTWERP / ADVIESDIENSTEN**	**558 dagen**	**vri 3-4-26**	**woe 20-9-28**
28			**Prijs en contractvorming Diensten**	**558 dagen**	**vri 3-4-26**	**woe 20-9-28**
29			**Aanbestedingsdocumenten**	**273 dagen**	**vri 3-4-26**	**woe 2-6-27**
30			Inkoopbeslisformulier	5 dagen	vri 3-4-26	don 9-4-26
31			opstellen concept aanbestedingsleidraad Adv Installaties	2 wkn	vri 3-4-26	don 16-4-26
32			review + vaststellen aanbestedingsleidraad Adv Installaties	9 wkn	vri 17-4-26	don 18-6-26
33			aanbestedingsleidraad definitief	8 dagen	vri 19-6-26	din 30-6-26
34			goedkeuringproces BA	1 wk	woe 1-7-26	din 7-7-26
35			opstellen concept aanbestedingsleidraad Adviseur gebouw	8 wkn	woe 8-7-26	woe 30-9-26
36			review + vaststellen aanbestedingsleidraad Adviseur gebouw	8 dagen	don 1-10-26	maa 12-10-26
37			aanbestedingsleidraad definitief	1 wk	din 13-10-26	maa 19-10-26
38			goedkeuringproces BA	0 dagen	maa 19-10-26	maa 19-10-26
39			**Openbare procedure Adviseur E&W&Proces installaties**	**106 dagen**	**woe 8-7-26**	**don 14-1-27**
40			**Gunningfase**	**106 dagen**	**woe 8-7-26**	**don 14-1-27**
41			Publicatie via TenderNed	2 dagen	woe 8-7-26	don 9-7-26
42			Bestuderen stukken	15 dagen	vri 10-7-26	don 30-7-26
43			Inlichtingenbijeenkomst voor marktpartijen	5 dagen	vri 31-7-26	vri 4-9-26
44			Nota van Inlichtingen	10 dagen	maa 7-9-26	vri 18-9-26
45			Rekentijd	30 dagen	maa 21-9-26	vri 30-10-26
46			Inschrijving	1 dag	maa 2-11-26	maa 2-11-26
47			Beoordeling (uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, minimumeisen, gunningscriteria)	20 dagen	din 3-11-26	maa 30-11-26
48			Gunningbesluit	2 dagen	din 1-12-26	woe 2-12-26
49			Alcateltermijn	20 dagen	don 3-12-26	woe 13-1-27
50			Opdrachtverstrekking	1 dag	don 14-1-27	don 14-1-27
51			**Niet openbare procedure Adviesdiensten gebouw**	**152 dagen**	**din 20-10-26**	**woe 2-6-27**
52			**Selectiefase**	**67 dagen**	**din 20-10-26**	**woe 3-2-27**
53			Publicatie via TenderNed	2 dagen	din 20-10-26	woe 21-10-26
54			Bestudering stukken	15 dagen	don 22-10-26	woe 11-11-26
55			Inlichtingenbijeenkomst voor marktpartijen	5 dagen	don 12-11-26	woe 18-11-26
56			Nota van Inlichtingen	10 dagen	don 19-11-26	woe 2-12-26
57			Schrijftijd	10 dagen	don 3-12-26	woe 16-12-26
58			Aanmelding	1 dag	don 17-12-26	don 17-12-26
59			Beoordeling (uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria)	15 dagen	vri 18-12-26	don 21-1-27
60			Selectiebesluit	2 dagen	vri 22-1-27	maa 25-1-27
61			Bezwaartermijn	7 dagen	din 26-1-27	woe 3-2-27
62			**Gunningfase**	**85 dagen**	**don 4-2-27**	**woe 2-6-27**
63			Uitnodiging gunningfase	1 dag	don 4-2-27	don 4-2-27
64			Nota van Inlichtingen	15 dagen	vri 5-2-27	don 25-2-27

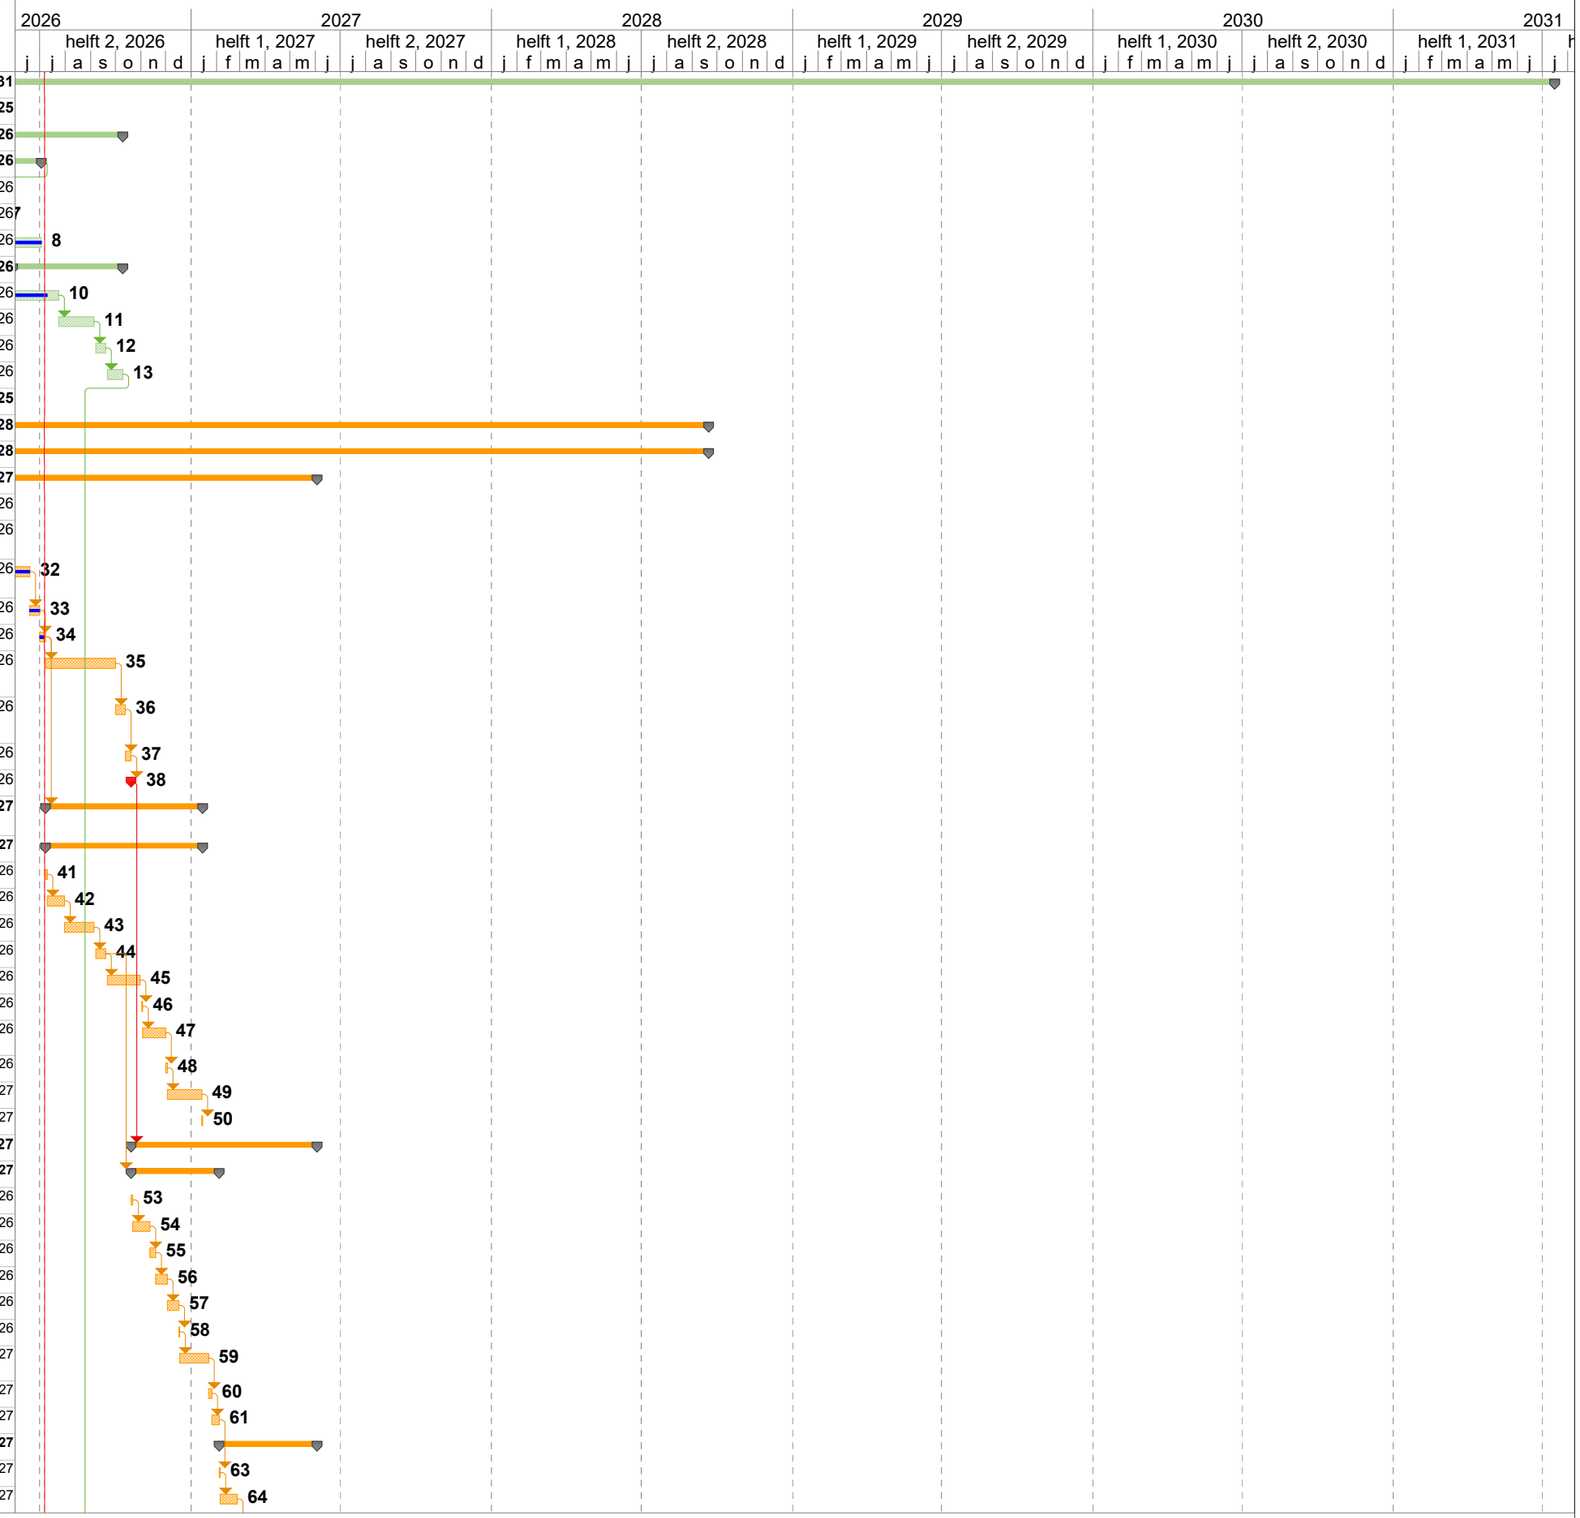

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Id	Ta	Tijdsdsch taken	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
65			Rekentijd	25 dagen	vri 26-2-27	don 1-4-27
66			Inschrijving	1 dag	vri 2-4-27	vri 2-4-27
67			Beoordeling (minimumeisen, gunningscriteria)	20 dagen	maa 5-4-27	vri 30-4-27
68			Gunningbesluit	2 dagen	maa 3-5-27	din 4-5-27
69			Alcateltermijn	20 dagen	woe 5-5-27	din 1-6-27
70			Opdrachtverstrekking	1 dag	woe 2-6-27	woe 2-6-27
71			**Onderhandelingsprocedure Dürr**	**142 dagen**	**maa 14-9-26**	**din 13-4-27**
72			**Opstellen uitvaag**	**49 dagen**	**maa 14-9-26**	**don 19-11-26**
73			Voorbereiding	14 dagen	maa 14-9-26	don 1-10-26
74			Opstellen uitvraag	4 wkn	vri 2-10-26	don 29-10-26
75			afstemmen uitvraag met gebruiker en DVM	2 wkn	vri 30-10-26	don 12-11-26
76			Definitief maken uitvraag	1 wk	vri 13-11-26	don 19-11-26
77			**Onderhandelingsperiode**	**93 dagen**	**vri 20-11-26**	**din 13-4-27**
78			Uitnodiging voor onderhandeling	1 dag	vri 20-11-26	vri 20-11-26
79			Toelichten uitvraag	3 wkn	maa 23-11-26	vri 11-12-26
80			Rekentijd	5 wkn	maa 14-12-26	vri 29-1-27
81			Indienen eerste offerte	1 dag	maa 1-2-27	maa 1-2-27
82			Onderhandelingen	6 wkn	din 2-2-27	maa 15-3-27
83			Herijken offerte	2 wkn	din 16-3-27	maa 29-3-27
84			Gunningsbeslissing	2 wkn	din 30-3-27	maa 12-4-27
85			Opdrachtverstrekking	1 dag	din 13-4-27	din 13-4-27
86			**Niet openbare procedure Directievoering en Toezicht**	**195 dagen**	**maa 8-11-27**	**woe 20-9-28**
87			**Selectiefase**	**97 dagen**	**maa 8-11-27**	**din 4-4-28**
88			Publicatie via TenderNed	2 dagen	maa 8-11-27	din 9-11-27
89			Bestudering stukken	15 dagen	woe 10-11-27	din 30-11-27
90			Inlichtingenbijeenkomst voor marktpartijen	5 dagen	woe 1-12-27	din 7-12-27
91			Nota van Inlichtingen	15 dagen	woe 8-12-27	din 11-1-28
92			Schrijftijd	30 dagen	woe 12-1-28	din 22-2-28
93			Aanmelding	1 dag	woe 23-2-28	woe 23-2-28
94			Beoordeling (uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, sele	20 dagen	don 24-2-28	woe 22-3-28
95			Selectiebesluit	2 dagen	don 23-3-28	vri 24-3-28
96			Bezwaartermijn	7 dagen	maa 27-3-28	din 4-4-28
97			**Gunningfase**	**98 dagen**	**woe 5-4-28**	**woe 20-9-28**
98			Uitnodiging gunningfase	1 dag	woe 5-4-28	woe 5-4-28
99			Bestuderen stukken	15 dagen	don 6-4-28	woe 26-4-28
100			Nota van Inlichtingen	10 dagen	don 27-4-28	woe 10-5-28
101			Rekentijd	28 dagen	don 11-5-28	maa 19-6-28
102			Inschrijving	1 dag	din 20-6-28	din 20-6-28
103			Beoordeling (minimumeisen, gunningscriteria)	20 dagen	woe 21-6-28	din 18-7-28
104			Gunningbesluit	2 dagen	woe 19-7-28	don 20-7-28
105			Alcateltermijn	20 dagen	vri 21-7-28	din 19-9-28
106			Opdrachtverstrekking	1 dag	woe 20-9-28	woe 20-9-28
107		10.03.03	**ONTWERP Gebouw**	**325 dagen**	**don 3-6-27**	**woe 15-11-28**
108			**Voorlopig ontwerp**	**90 dagen**	**don 3-6-27**	**vri 5-11-27**
109			opstellen VO	3 mndn	don 3-6-27	vri 24-9-27
110			toetsen VO	2 wkn	maa 27-9-27	vri 8-10-27
111			definitief VO	2 wkn	maa 11-10-27	vri 22-10-27
112			goedkeuring VO	2 wkn	maa 25-10-27	vri 5-11-27
113			**Definitief DO**	**90 dagen**	**maa 8-11-27**	**vri 24-3-28**
114			opstellen DO	3 mndn	maa 8-11-27	vri 11-2-28
115			toetsen DO	2 wkn	maa 14-2-28	vri 25-2-28
116			definitief DO	2 wkn	maa 28-2-28	vri 10-3-28
117			goedkeuring DO	2 wkn	maa 13-3-28	vri 24-3-28
118			**Omgevingsvergunning bouw**	**325 dagen**	**don 3-6-27**	**woe 15-11-28**

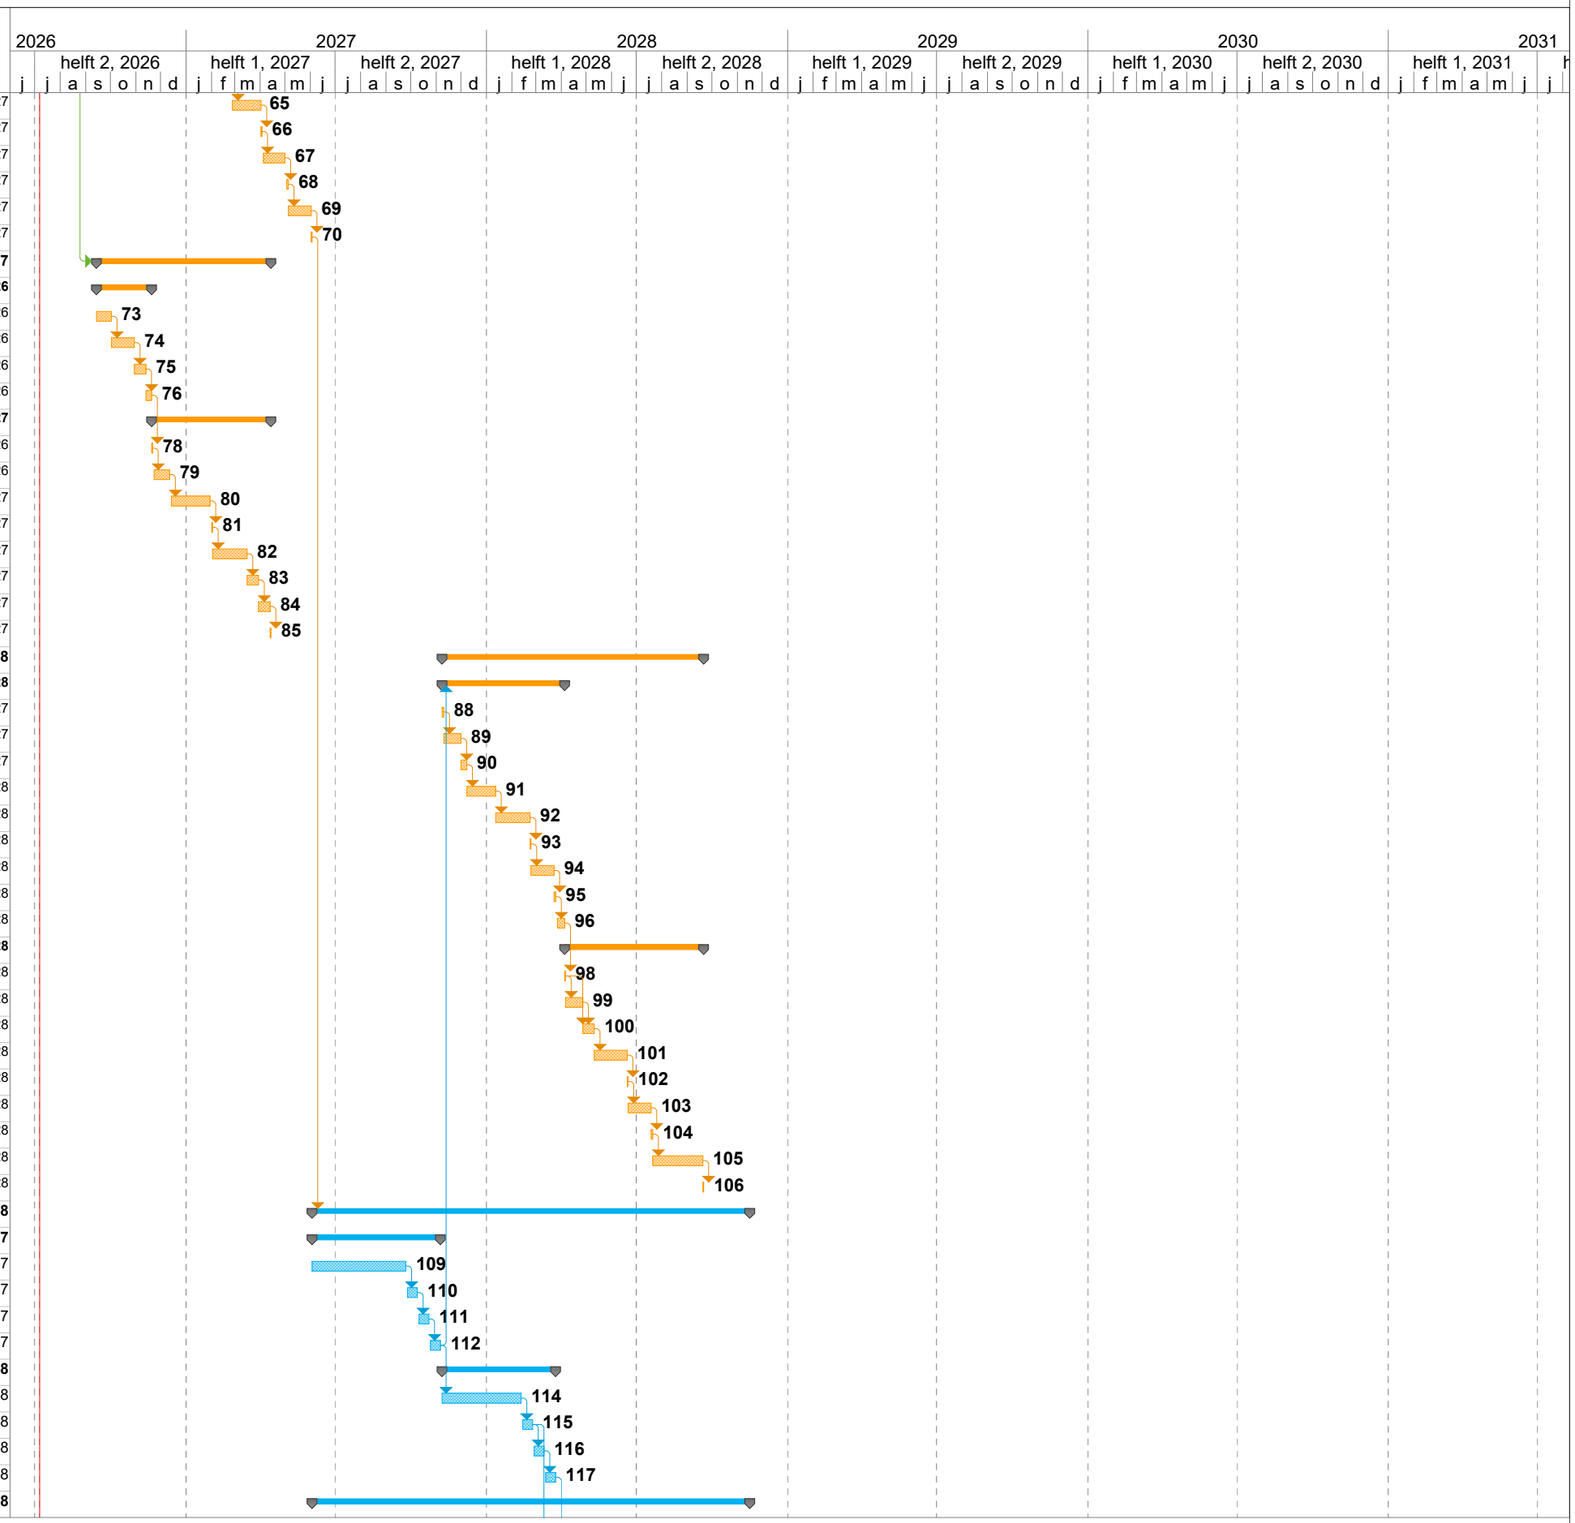

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
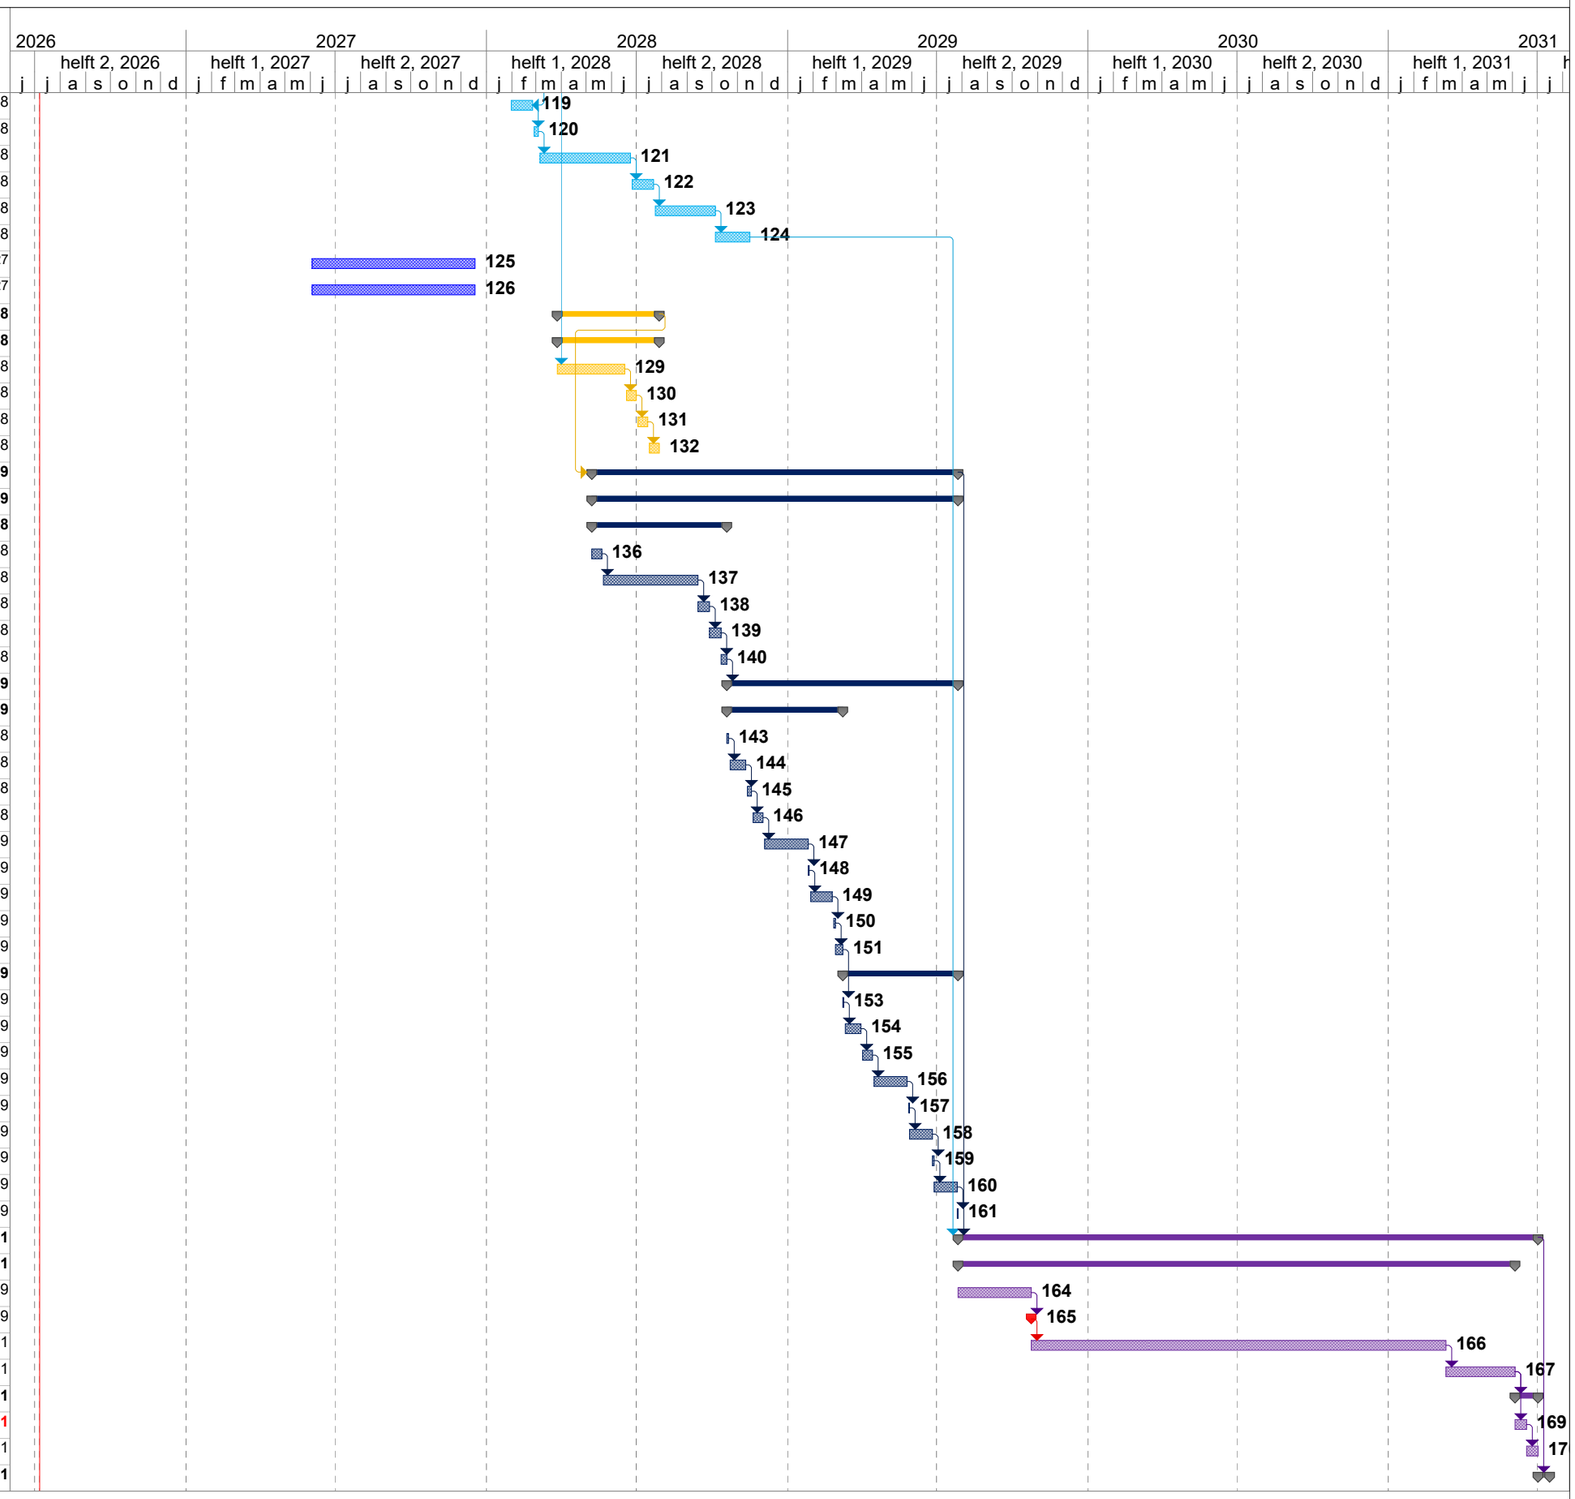
Id	Ta	Tijdsdsch taken	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
119			omgevingsvergunning voorbereiden	1 mnd	maa 31-1-28	vri 25-2-28
120			Indienen omgevingsvergunning	1 wk	maa 28-2-28	vri 3-3-28
121			omgevingsvergunning regulier	4 mndn	maa 6-3-28	vri 23-6-28
122			omgevingsvergunning verleend	4 wkn	maa 26-6-28	vri 21-7-28
123			bezwaartermijn	6 wkn	maa 24-7-28	woe 4-10-28
124			**omgevingsvergunning onherroepelijk**	6 wkn	don 5-10-28	woe 15-11-28
125			Opstellen ITO (JIVC)	6 mndn	don 3-6-27	vri 17-12-27
126			Opstellen beveiligingsplan (TYCO)	6 mndn	don 3-6-27	vri 17-12-27
127		10.03.04	**CONTRACT (bestek) Gebouw**	**90 dagen**	**maa 27-3-28**	**vri 28-7-28**
128			**Bestek**	**90 dagen**	**maa 27-3-28**	**vri 28-7-28**
129			opstellen bestek	3 mndn	maa 27-3-28	vri 16-6-28
130			toetsen bestek	2 wkn	maa 19-6-28	vri 30-6-28
131			definitief bestek	2 wkn	maa 3-7-28	vri 14-7-28
132			goedkeuring bestek	2 wkn	maa 17-7-28	vri 28-7-28
133		10.03.05	**CONTRACTVORMING ONTWERP EN UITVOERING Gebou**	**287 dagen**	**maa 8-5-28**	**don 26-7-29**
134			**Prijs en contractvorming ontwerp en uitvoering**	**287 dagen**	**maa 8-5-28**	**don 26-7-29**
135			**Aanbestedingsdocumenten**	**95 dagen**	**maa 8-5-28**	**woe 18-10-28**
136			Inkoopbeslisformulier	2 wkn	maa 8-5-28	vri 19-5-28
137			opstellen concept aanbestedingsleidraad	3 mndn	maa 22-5-28	woe 13-9-28
138			review + vaststellen aanbestedingsleidraad	2 wkn	don 14-9-28	woe 27-9-28
139			aanbestedingsleidraad definitief	2 wkn	don 28-9-28	woe 11-10-28
140			goedkeuringproces BA	1 wk	don 12-10-28	woe 18-10-28
141			**Niet-openbare procedure**	**192 dagen**	**don 19-10-28**	**don 26-7-29**
142			**Selectiefase**	**92 dagen**	**don 19-10-28**	**don 8-3-29**
143			Publicatie via TenderNed	2 dagen	don 19-10-28	vri 20-10-28
144			Bestuderen stukken	15 dagen	maa 23-10-28	vri 10-11-28
145			Inlichtingenbijeenkomst voor marktpartijen	5 dagen	maa 13-11-28	vri 17-11-28
146			Nota van Inlichtingen	10 dagen	maa 20-11-28	vri 1-12-28
147			Schrijftijd	30 dagen	maa 4-12-28	don 25-1-29
148			Aanmelding	1 dag	vri 26-1-29	vri 26-1-29
149			Beoordeling (uitsluitingsgronden, geschiktheidseise	20 dagen	maa 29-1-29	vri 23-2-29
150			Selectiebesluit	2 dagen	maa 26-2-29	din 27-2-29
151			Bezwaartermijn	7 dagen	woe 28-2-29	don 8-3-29
152			**Gunningfase**	**100 dagen**	**vri 9-3-29**	**don 26-7-29**
153			Uitnodiging gunningfase	1 dag	vri 9-3-29	vri 9-3-29
154			Bestuderen stukken	15 dagen	maa 12-3-29	vri 30-3-29
155			Nota van Inlichtingen	10 dagen	maa 2-4-29	vri 13-4-29
156			Rekentijd	30 dagen	maa 16-4-29	vri 25-5-29
157			Inschrijving	1 dag	maa 28-5-29	maa 28-5-29
158			Beoordeling (minimumeisen, gunningscriteria)	20 dagen	din 29-5-29	maa 25-6-29
159			Gunningsbesluit	2 dagen	din 26-6-29	woe 27-6-29
160			Alcateltermijn	20 dagen	don 28-6-29	woe 25-7-29
161			Opdrachtverstrekking	1 dag	don 26-7-29	don 26-7-29
162		10.03.06	**UITVOERING**	**440 dagen**	**vri 27-7-29**	**din 1-7-31**
163			**Uitvoering**	**420 dagen**	**vri 27-7-29**	**din 3-6-31**
164			bouwvoorbereiding	2 mndn	vri 27-7-29	din 23-10-29
165			**Aanvang bouw**	0 dagen	din 23-10-29	din 23-10-29
166			bouwwerkzaamheden	16 mndn	woe 24-10-29	din 11-3-31
167			**Bouwkundige oplevering**	3 mndn	woe 12-3-31	din 3-6-31
168			**Overdracht aan gebruiker**	**20 dagen**	**woe 4-6-31**	**din 1-7-31**
169			overdracht opdrachtgever	**2 wkn**	**woe 4-6-31**	**din 17-6-31**
170			Ingebruikgeving	2 wkn	woe 18-6-31	din 1-7-31
171		10.03.07	**NAZORG**	**10 dagen**	**din 1-7-31**	**din 15-7-31**
