
Project 1925 Royal Rivoli — woe 11-11-26

Id	% voltooi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	**99%**	**Exploitatie**	**799 dagen**	**don 1-1-26**	**don 24-5-29**	
2	10...	Second opinion	40 dagen	don 1-1-26	woe 25-2-26	
3	0%	Akkoord op exploitatie	0 dagen	don 30-9-27	don 30-9-27	126
4	10...	Sluiting Royal	0 dagen	don 1-10-26	don 1-10-26	
5	0%	**Exploitatie Royal**	0 dagen	don 24-5-29	don 24-5-29	204
6	0%					
7	**76%**	**Vergunningenprocedures**	**604 dagen**	**din 27-1-26**	**din 5-9-28**	
8	**84%**	**ETFAL BOPA, OPA + RCE (geen MER beoordelingsplicht) uitgebreide**	**604 dagen**	**din 27-1-26**	**din 5-9-28**	
9	10...	Verzoek tot vooroverleg	1 dag	maa 16-3-26	maa 16-3-26	
10	10...	Omgevingsplanscan	30 dagen	din 17-3-26	woe 29-4-26	9
11	10...	Offertes uitvragen RO	19 dagen	din 28-4-26	din 26-5-26	
12	10...	Gunning RO	20 dagen	woe 27-5-26	din 23-6-26	11
13	10...	Afstemming RCE en advies	20 dagen	din 27-1-26	maa 23-2-26	
14	**0%**	**Vooroverleg 4-wekelijks**	**564 dagen**	**din 24-3-26**	**din 5-9-28**	
48	10...	Vooroverleg CRK	1 dag	woe 27-5-26	woe 27-5-26	
49	80%	Voorbereiden procedure	100 dagen	woe 24-6-26	din 1-12-26	12
50	**10...**	**Opstellen bureauonderzoeken**	**60 dagen**	**woe 24-6-26**	**din 6-10-26**	
51	10...	Externe veiligheid	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
52	10...	Archeologisch onderzoek	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
53	10...	Bodemonderzoek	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
54	10...	Watertoets	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
55	10...	Akoestisch onderzoek	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
56	10...	Trillingen	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
57	10...	Verkeer	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
58	10...	Luchtkwaliteit	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
59	10...	Cultuurhistorie	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
60	10...	Stedenbouw/landschap	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
61	10...	Gezondheid	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
62	10...	Ecologie	60 dagen	woe 24-6-26	din 6-10-26	12
63	10...	OOO	20 dagen	woe 24-6-26	din 21-7-26	12
64	10...	Participatie	30 dagen	woe 26-8-26	din 6-10-26	12BE+30 dagen
65	10...	Nadeelcompensatie	30 dagen	woe 24-6-26	din 25-8-26	12
66	0%	**Indienen formele aanvraag**	1 dag	woe 2-12-26	woe 2-12-26	49
67	70%	Proceduretermijn (uitgebreid)	60 dagen	don 3-12-26	woe 10-3-27	66
68	0%	Ontwerpbesluit	0 dagen	woe 10-3-27	woe 10-3-27	67
69	0%	Zienswijzetermijn	30 dagen	don 11-3-27	don 22-4-27	68
70	0%	Definitief besluit	0 dagen	don 22-4-27	don 22-4-27	69
71	0%	Beroepstermijn	30 dagen	vri 23-4-27	din 8-6-27	70
72	0%	Onherroepelijk besluit (geen RvS)	0 dagen	don 17-6-27	don 17-6-27	71BE+7 dagen
73	**32%**	**Technische bouwactiviteit + Uitvoeren van een werk**	**140 dagen**	**woe 18-11-26**	**maa 21-6-27**	
74	70%	Voorbereiden procedure	60 dagen	woe 18-11-2	din 23-2-27	97
75	0%	Indienen formele aanvraag	1 dag	woe 2-12-26	woe 2-12-26	49
76	0%	Proceduretermijn (reguliер)	40 dagen	don 3-12-26	woe 10-2-27	75
77	0%	Beschikking	0 dagen	woe 10-2-27	woe 10-2-27	76
78	0%	Bezwaartermijn	30 dagen	don 11-2-27	woe 24-3-27	77
79	0%	Onherroepelijk besluit (geen RvS)	1 dag	maa 21-6-27	maa 21-6-27	78BE+7 dagen;72
80	0%					
81	0%	**Sloopmelding**				
82	**0%**	**Aanvullende indieningsvereisten**	**1 dag**	**maa 6-9-27**	**maa 6-9-27**	
89	0%					
90	**10...**	**Voorlopig ontwerp**	**386 dagen**	**woe 1-1-25**	**din 30-6-26**	
91	10...	Aanpassen VO	350 dagen	woe 1-1-25	don 7-5-26	
92	10...	Raming op basis van aangepast VO	5 dagen	vri 8-5-26	vri 15-5-26	91
93	10...	Aanleveren stukken	1 dag	woe 27-5-26	woe 27-5-26	
94	10...	Collegevergadering	1 dag	din 2-6-26	din 2-6-26	
95	10...	Vaststellen VO (parallel aan DO)	20 dagen	woe 3-6-26	din 30-6-26	94
96	0%					
97	**96%**	**Definitief ontwerp**	**172 dagen**	**din 24-2-26**	**din 17-11-26**	
98	10...	Opstellen concept DO	60 dagen	maa 15-6-26	vri 25-9-26	
99	10...	Overleg CRK	1 dag	din 24-2-26	din 24-2-26	13
100	10...	Raming op basis van concept DO	10 dagen	maa 28-9-26	vri 9-10-26	98
101	90%	Aanpassen definitief DO	5 dagen	maa 12-10-2	vri 16-10-26	100
102	10...	Raming aanscherpen definitief DO	16 dagen	maa 19-10-2	maa 9-11-26	101
103	50%	Vaststellen DO college	6 dagen	din 10-11-26	din 17-11-26	102
104	0%					
105	**24%**	**Bouwteamfase (op basis van DO)**	**319 dagen**	**vri 8-5-26**	**don 30-9-27**	
106	**35%**	**Aanbesteding**	**227 dagen**	**vri 8-5-26**	**vri 30-4-27**	
107	99%	Opstellen aanbestedingsleidraad + AOK	60 dagen	vri 8-5-26	maa 24-8-26	91
108	0%	Aankondiging aanbesteding	6 dagen	din 10-11-26	din 17-11-26	107;102
109	0%	Uitnodiging tot inschrijving	1 dag	woe 18-11-2	woe 18-11-2	108
110	0%	Indienen vragen Nvi	10 dagen	don 19-11-26	woe 2-12-26	109
111	0%	Beantwoorden Nvi	10 dagen	don 3-12-26	woe 16-12-2	110
112	0%	Deadline inschrijvingen	20 dagen	don 17-12-26	woe 27-1-27	111
113	0%	Beoordeling inschrijving	23 dagen	don 28-1-27	maa 1-3-27	112
114	0%	Voorlopige gunning	1 dag	din 2-3-27	din 2-3-27	113;103
115	0%	Alcatel	30 dagen	woe 3-3-27	woe 14-4-27	114
116	0%	Gunning	1 dag	don 15-4-27	don 15-4-27	115
117	0%	Overeenkomst	10 dagen	vri 16-4-27	vri 30-4-27	116
118	**0%**	**Technisch ontwerp**	**70 dagen**	**maa 3-5-27**	**din 31-8-27**	
119	0%	Opstellen concept TO	60 dagen	maa 3-5-27	din 27-7-27	117
120	0%	Raming op basis van concept TO	5 dagen	woe 28-7-27	din 3-8-27	119
121	0%	Aanpassen definitief TO	5 dagen	woe 28-7-27	din 3-8-27	119
122	0%	Raming aanscherp definitief TO	5 dagen	woe 4-8-27	din 31-8-27	121
123	**0%**	**Aannemingsovereenkomst**	**27 dagen**	**woe 4-8-27**	**don 30-9-27**	
124	0%	Voorleggen College	1 dag	woe 4-8-27	woe 4-8-27	103;120
125	0%	Aanleveren stukken Raad	1 dag	woe 18-8-27	woe 18-8-27	
126	0%	Vaststellen Raad investeringskosten	1 dag	woe 29-9-27	woe 29-9-27	
127	0%	Ondertekening	1 dag	don 30-9-27	don 30-9-27	124;72;122;126
128	0%					
129	**0%**	**Uitvoeringsontwerp**	**72 dagen**	**vri 1-10-27**	**maa 24-1-28**	
130	0%	Kick-off UO	1 dag	vri 1-10-27	vri 1-10-27	127
131	0%	Opstellen concept UO	60 dagen	maa 4-10-27	vri 7-1-28	130
132	0%	Aanpassen definitief UO	10 dagen	maa 10-1-28	vri 21-1-28	131
133	0%	Vaststelling	1 dag	maa 24-1-28	maa 24-1-28	132
134	0%	Integraal overleg ontwerpteam				
135	0%	Thema overleggen ontwerpteam				
136	0%					
137	**0%**	**Realisatiefase**	**781 dagen**	**din 27-1-26**	**don 24-5-29**	
138	0%	Start bouw	1 dag	vri 1-10-27	vri 1-10-27	79;127
139	0%	Ruwbouwfase	260 dagen	maa 4-10-27	don 9-11-28	138
140	0%	Afbouwfase	120 dagen	vri 10-11-28	don 10-5-29	139
141	0%	**Overig**	**0 dagen**	**din 27-1-26**	**din 27-1-26**	
146	0%	Vooropnames en commissioning	5 dagen	vri 11-5-29	don 17-5-29	140
147	0%	Opleverdatum bouwwerkzaamheden	0 dagen	don 10-5-29	don 10-5-29	140
148	0%	Nazorg	10 dagen	vri 11-5-29	don 24-5-29	140
149	0%					
150	**0%**	**Bouwwerkzaamheden inrichting**	**709 dagen**	**din 27-1-26**	**din 13-2-29**	
176	**0%**	**Subsidies**				
197	**0%**	**Communicatiemomenten**	**717 dagen**	**woe 29-4-26**	**don 24-5-29**	
198	0%	Bewonersbrief 1 VO	1 dag	woe 1-7-26	woe 1-7-26	95
199	0%	Digitale nieuwsbrief 1	1 dag	woe 29-4-26	woe 29-4-26	
200	0%	Bewonersbrief 2 DO	1 dag	woe 6-10-27	woe 6-10-27	103
201	0%	Bewonersavond 2 Start bouw	1 dag	don 10-6-27	don 10-6-27	127BE-30 dagen
202	0%	Bewonersbrief 3 Start bouw	1 dag	don 30-9-27	don 30-9-27	126
203	0%	Bewonersbrief 4 Opening	1 dag	vri 4-5-29	vri 4-5-29	204BE-15 dagen
204	0%	Opening	0 dagen	don 24-5-29	don 24-5-29	147BE+10 dagen
205	0%					
206	**0%**	**Overlegmomenten Gemeente**	**0 dagen**	**din 27-1-26**	**din 27-1-26**	
207	**0%**	**Intern projectteamoverleg**	**0 dagen**	**din 27-1-26**	**din 27-1-26**	
337	**0%**	**Kernteamoverleg**	**0 dagen**	**din 27-1-26**	**din 27-1-26**	
381	**0%**	**Bestuurlijke overlegmomenten**	**0 dagen**	**din 27-1-26**	**din 27-1-26**	
404	**0%**	**Overlegmomenten**	**558 dagen**	**woe 25-2-26**	**woe 12-7-28**	
405	**0%**	**Bouwvergaderingen**	**558 dagen**	**woe 25-2-26**	**woe 12-7-28**	

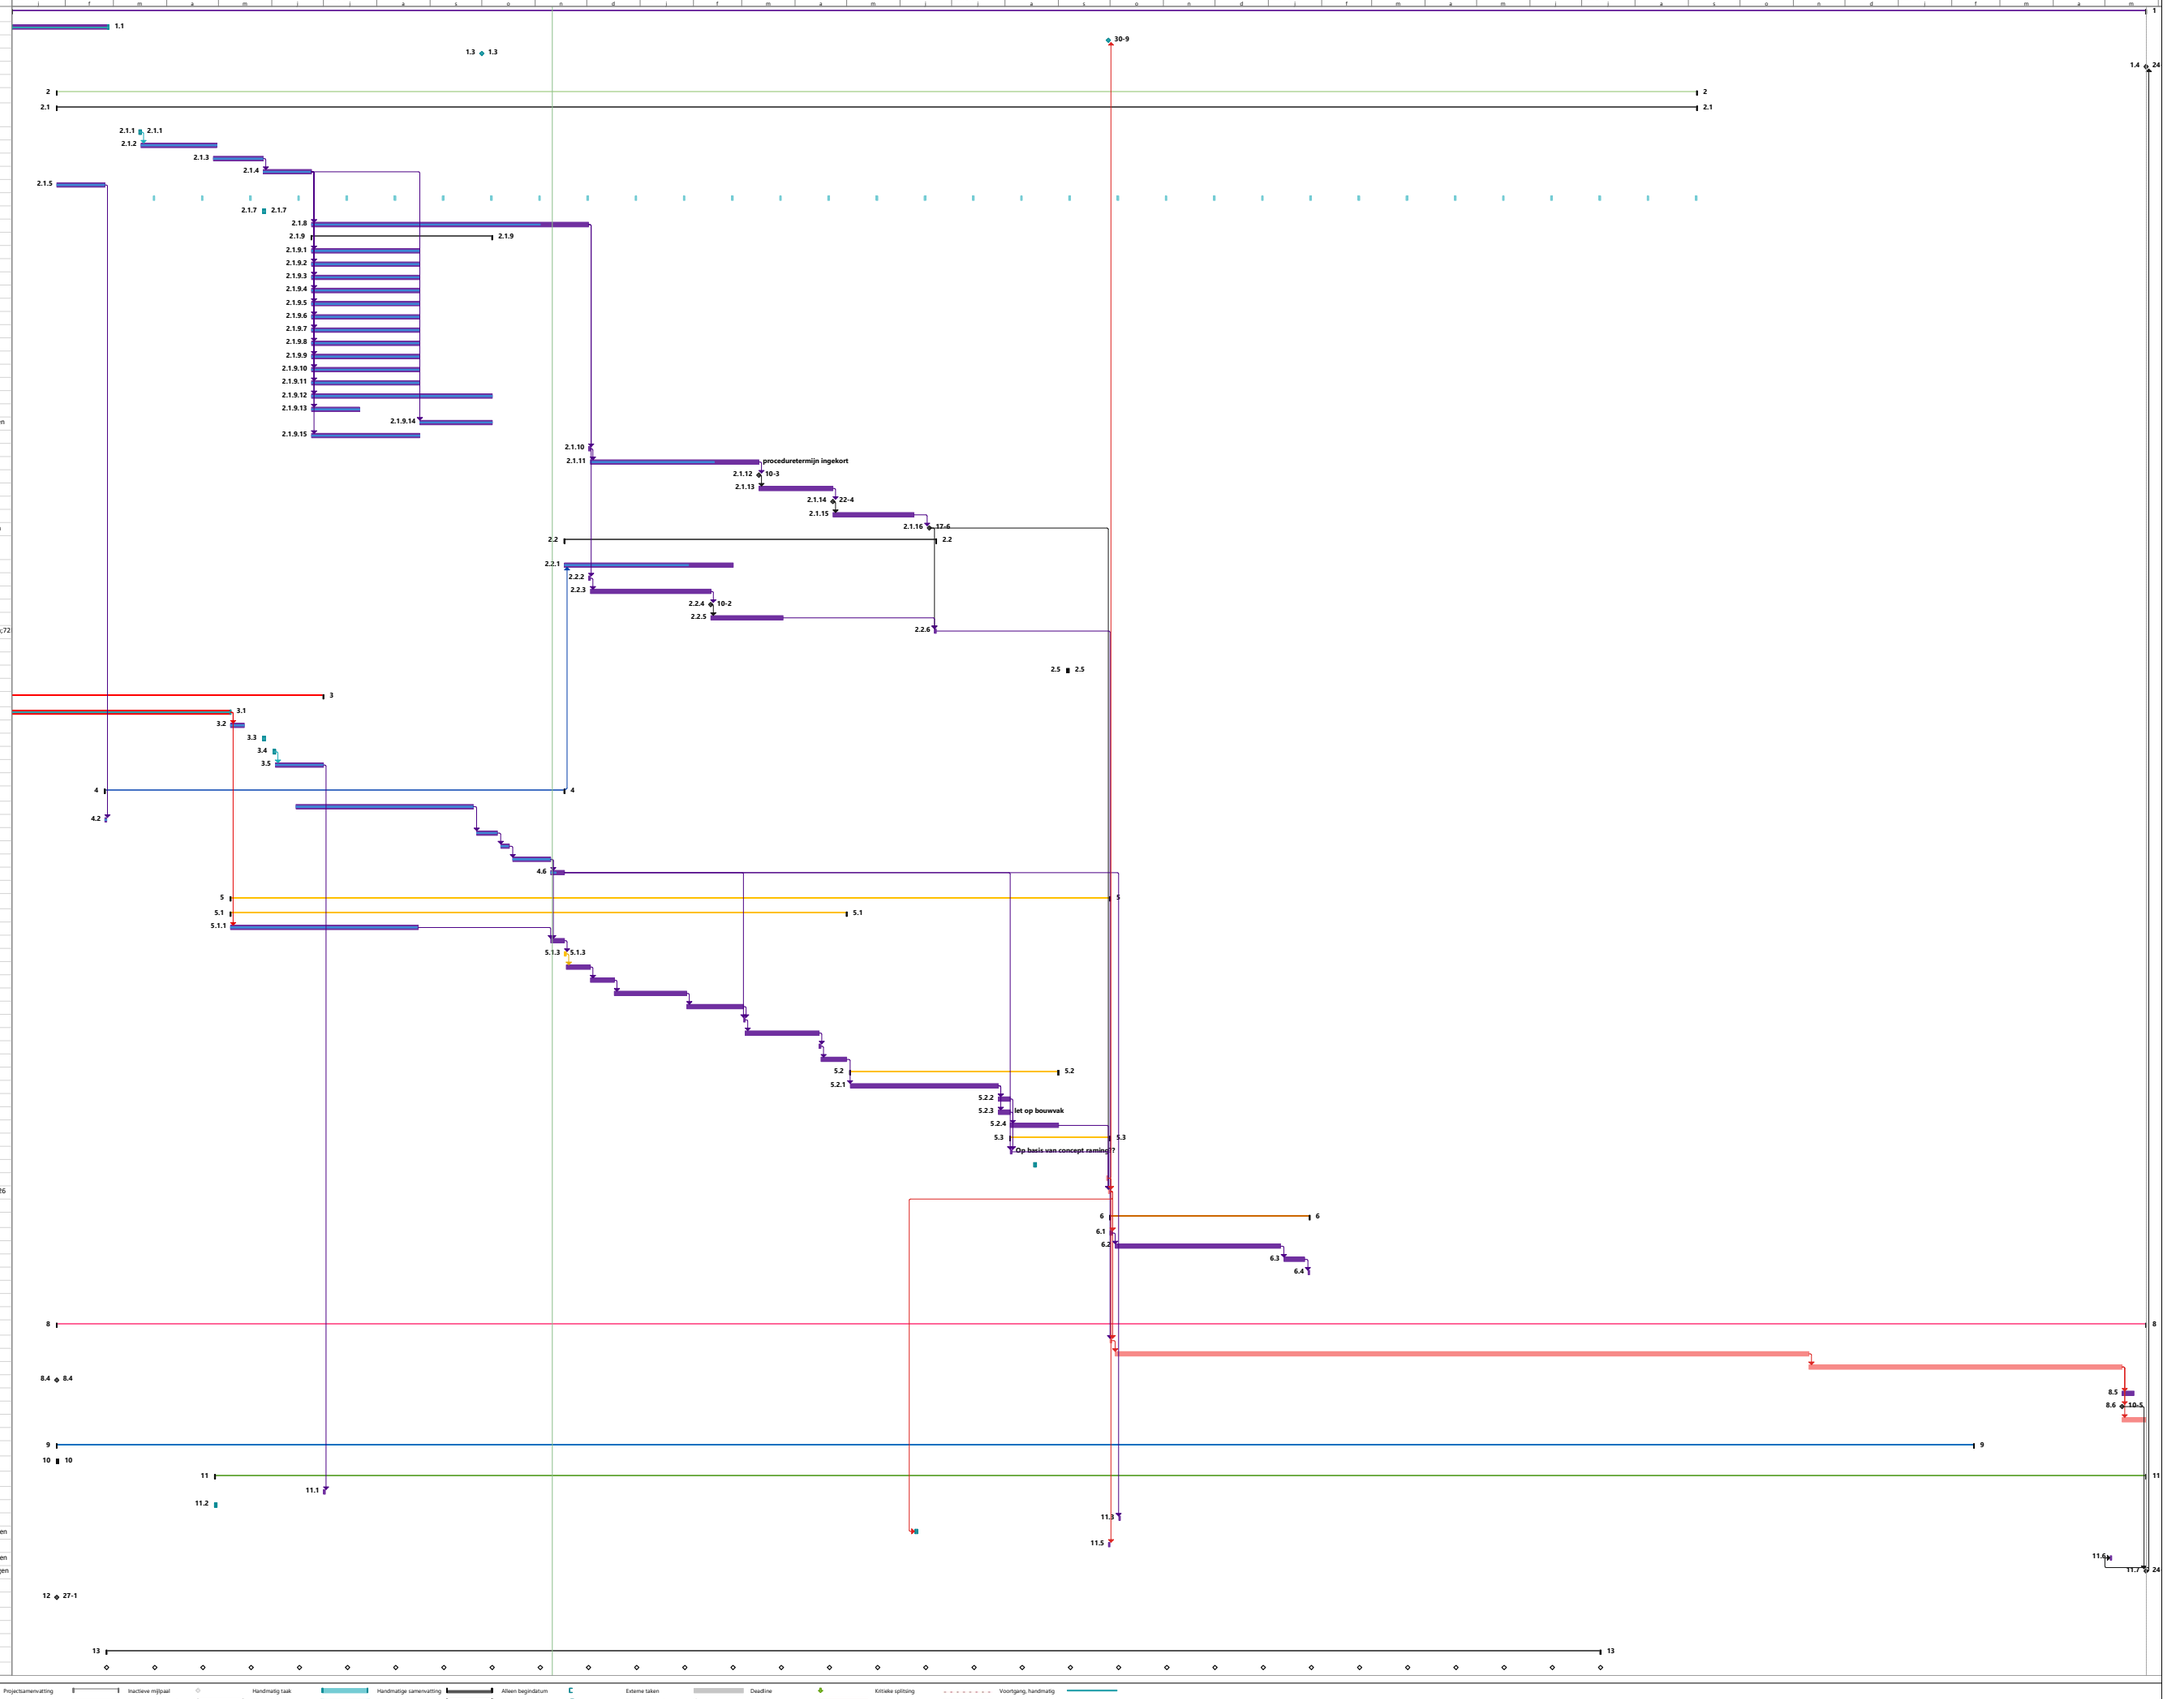

Project: Projectplanning
Datum: woe 11-11-26

Taak · Splitsing · Mijlpaal · Samenvatting · Projectsamenvatting · Inactieve taken · Inactieve mijlpaal · Inactieve samenvatting · Handmatig taak · Alleen duur · Handmatige samenvatting · Handmatige samenvatting · Alleen begindatum · Alleen einddatum · Externe taken · Externe mijlpaal · Deadline · Kritiek · Kritieke splitsing · Voortgang · Voortgang, handmatig
