Provincie Fryslan
Vervanging Ebdeuren kleine kolk THS
Bestek nr. 12-34-KB

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	**Totale projectduur**	**192 dagen?**	**maa 11-01-16**	**din 04-10-16**	
2					
3	**Provincie Fryslan**	**65 dagen?**	**maa 11-01-16**	**vri 08-04-16**	
4	Publicatie dienstenbestek op Tendernet	4 dagen	din 12-01-16	vri 15-01-16	
5	Uiterste datum stellen van vragen	1 dag	maa 08-02-16	maa 08-02-16	
6	Uitbrengen nota van inlichtingen	1 dag?	don 11-02-16	don 11-02-16	
7	Aanbesteding dienstenbestek	1 dag	woe 17-02-16	woe 17-02-16	
8	Beoordelen inschrijvingen	4 dagen	don 18-02-16	din 23-02-16	7
9	Voornemen tot gunning	1 dag	woe 24-02-16	woe 24-02-16	8
10	Stand still periode	20 dagen	don 25-02-16	woe 23-03-16	9
11	Gunning dienstenbestek	1 dag	don 24-03-16	don 24-03-16	10
12	Voorbereiden en overdracht	10 dagen	vri 25-03-16	don 07-04-16	11
13	Start bespreking	1 dag	vri 08-04-16	vri 08-04-16	12
14	Uitvoeren grondonderzoeken	50 dagen?	maa 11-01-16	zon 20-03-16	
15	beschikbaar komen grondonderzoeken	1 dag?	maa 21-03-16	maa 21-03-16	14
16					
17	**Opdrachtnemer**	**139 dagen**	**don 24-03-16**	**din 04-10-16**	
18	Opstellen overall tijdschema en documentenplanning	14 dagen	don 24-03-16	din 12-04-16	10
19	VO Engineering	30 dagen	maa 11-04-16	vri 20-05-16	
20	Opstellen constructieve berekeningen	25 dagen	maa 11-04-16	vri 13-05-16	
21	Concept VO gereed	1 dag	maa 16-05-16	maa 16-05-16	20
22	beoodelen VO door OG	14 dagen	din 17-05-16	vri 03-06-16	21
23	Verwerken opmerkingen / aanpassingen	10 dagen	maa 06-06-16	vri 17-06-16	22
24	Mijlpaal A: VO gereed	1 dag	maa 20-06-16	maa 20-06-16	23
25	Opstellen ramingen	10 dagen	don 16-06-16	woe 29-06-16	
26	VO bijwerken tot DO	20 dagen	don 30-06-16	woe 27-07-16	25
27	Aanvragen vergunningen en ontheffingen	4 dagen	don 28-07-16	din 02-08-16	26
28	Opstellen RAW bestekken	25 dagen	woe 03-08-16	din 06-09-16	27
29	Beoordelen RAW bestekken door OG	14 dagen	woe 07-09-16	maa 26-09-16	28
30	Verwerken aanpassingen RAW bestekken	5 dagen	din 27-09-16	maa 03-10-16	29
31	Mijlpaal B: RAW bestekken gereed	1 dag	din 04-10-16	din 04-10-16	30
32	**aanbestedingsprocedure onderhands**	**27 dagen**	**woe 05-10-16**	**don 10-11-16**	
33	Bestekken op Tendernet door OG	4 dagen	woe 05-10-16	maa 10-10-16	31
34	Uiterste datum stellen van vragen	1 dag?	din 25-10-16	din 25-10-16	
35	Uitbrengen Nota van Inlichtingen, uiterlijk	1 dag?	woe 02-11-16	woe 02-11-16	
36	Aanbesteding	1 dag	din 08-11-16	din 08-11-16	

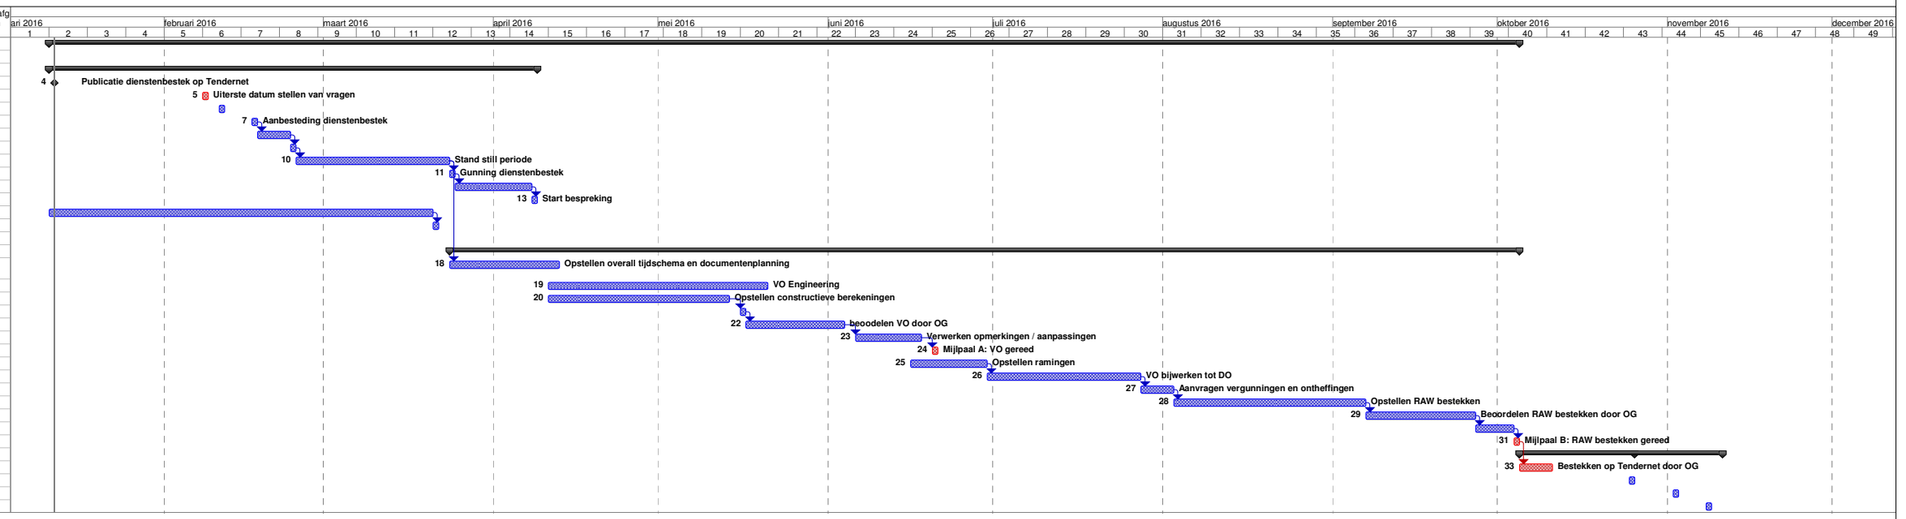

Project: Planning voorbereiding en uitv
Datum: din 12-01-16

Taak · Splitsing · Mijlpaal · Samenvatting · Projectsamenvatting · Externe taken · Externe mijlpaal · Inactieve taken · Inactieve mijlpaal · Inactieve samenvatting · Handmatig taak · Alleen duur · Handmatige samenvatting · Handmatige samenvatting · Alleen begindatum · Alleen einddatum · Voortgang · Deadline
