OPERA AMSTERDAM

Planning
Museum Boerhaave
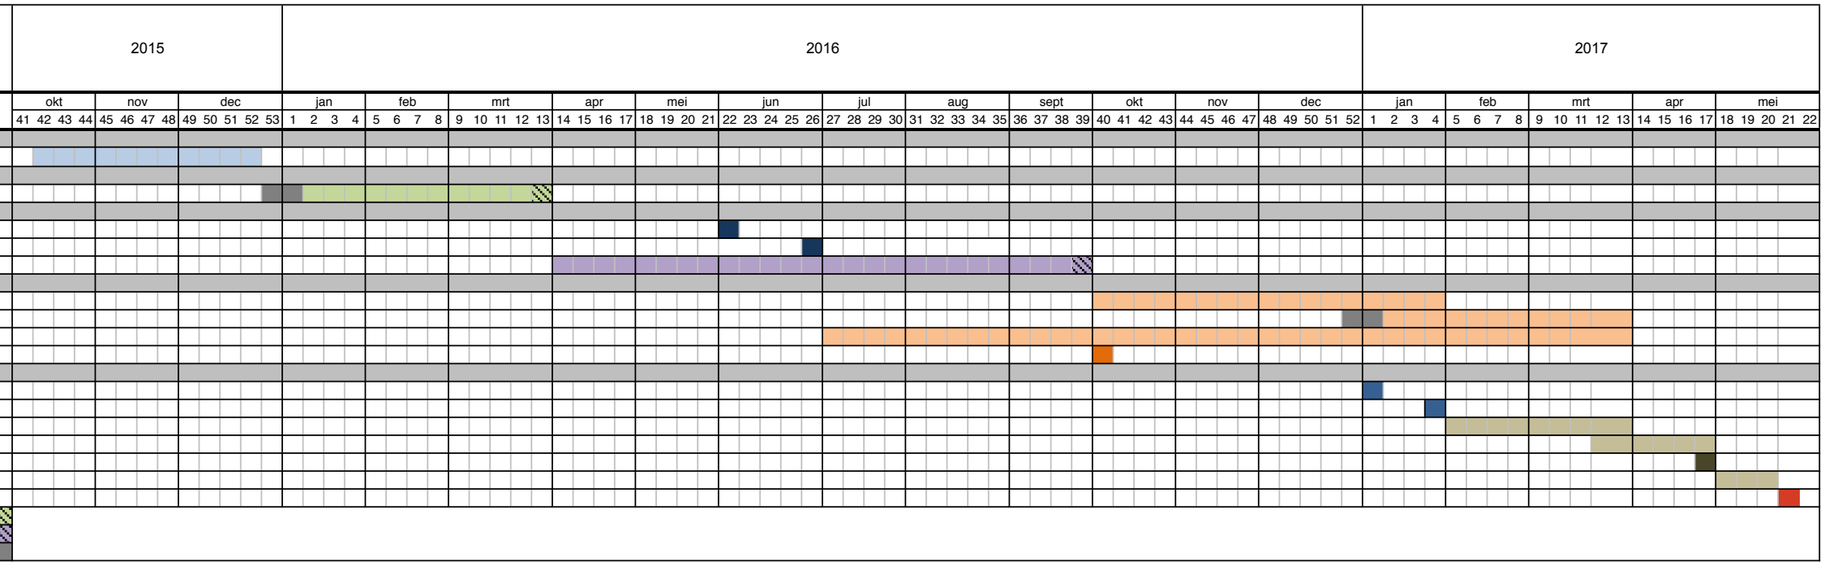
Taak	05.10.2015	Duur
Fase 1		
Concept / Schetsontwerp		11 w
Fase 2		
Voorlopig ontwerp		12 w
Fase 3		
Gunning uitvoering		-
Gunning uitvoering AV multimedia		-
Definitief ontwerp		26 w
Fase 4		
Productie off site		17 w
Productie op locatie		12 w
Productie AV multimedia		39 w
Levering hardware AV multimedia in studio		-
Fase 5		
Oplevering gebouw		-
Oplevering netwerk + e-data		-
Installatie hardware AV multimedia		9 w
Installatie objecten, uitlichten		6 w
Oplevering AV multimedia		-
Snagging / testing		3 w
Opening		-
	VO gereed: 30 mrt	
	DO gereed: 30 sept	
	feestdagen
