


Bijlage 7 - Fasering van de transformatie nieuw Applicatielandschap

De transformatie naar een nieuw Applicatielandschap is met inachtneming van de verandercapaciteit van de CIZ organisatie gesteld op één jaar en drie maanden. In de transformatiefase wordt met parallelle teams gewerkt, een team voor beheer as-is (CIZ plus huidige leverancier) en één of meerdere teams voor de transformatie naar een nieuw Applicatielandschap (CIZ plus Opdrachtnemer). Hierdoor kunnen de voorbereidingen op de transformatie naar een nieuw Applicatielandschap direct na gunning van start gaan. De beschreven doorlooptijd betreft een maximale doorlooptijd, indien de transformatie of onderdelen binnen de transformatiefase sneller kunnen worden gerealiseerd is dit toegestaan.

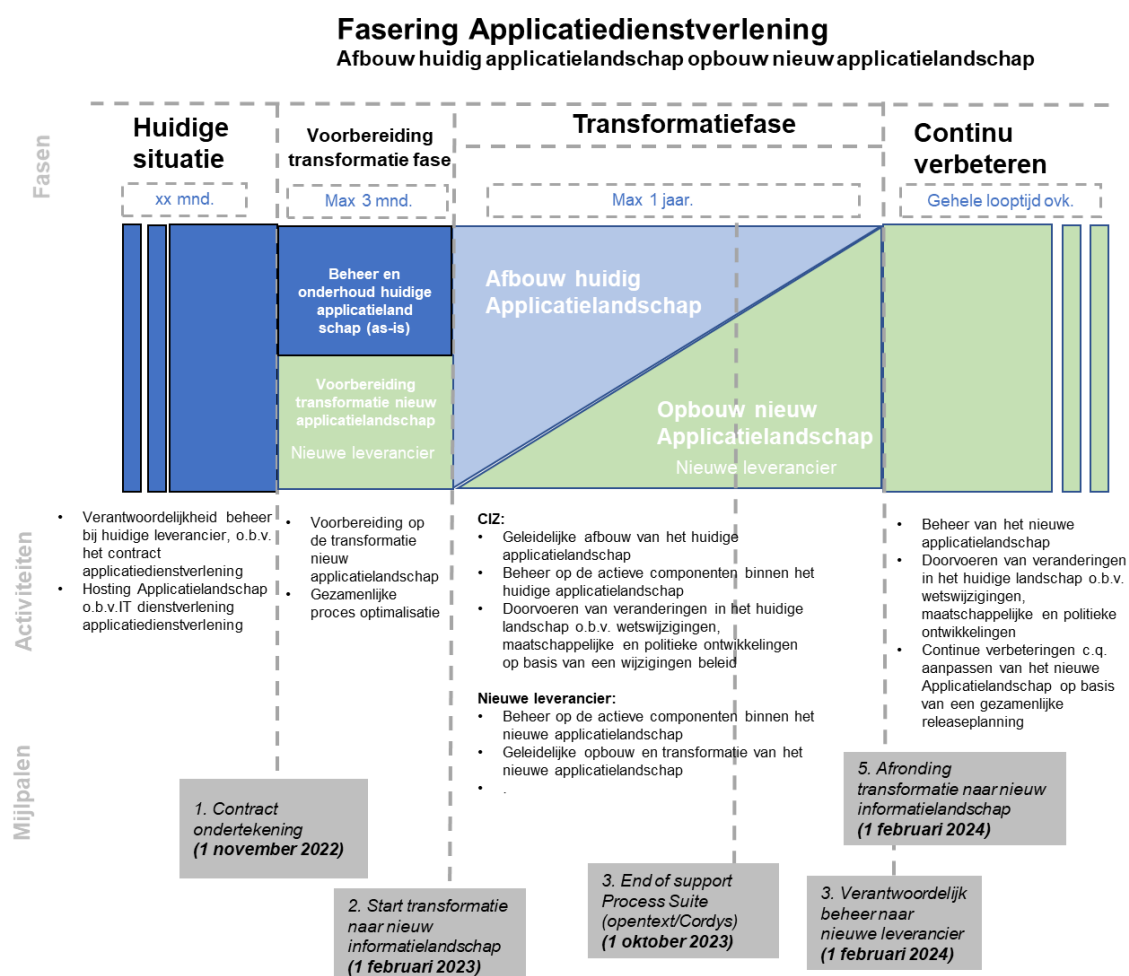

Voorbereiding op de transformatie

In deze fase wordt er gestart met de voorbereidingen op de transformatie en de bouw van het nieuwe Applicatielandschap. In deze fase worden de primaire CIZ processen gezamenlijk doorlopen, afgestemd met de mogelijkheden van de DCM applicatie en geoptimaliseerd in co-creatiesessies. Daarnaast worden de regieorganisatie, samenwerkingsmodel en governance op elkaar afgestemd en wordt het CIZ klaargestoomd voor de transformatie.

Transformatiefase

Na de afronding van de voorbereidingsfase start het CIZ gedurende met een fasegewijze transformatie naar een nieuwe Applicatielandschap. Dit mag sneller met inachtneming van de verandercapaciteit binnen het CIZ. De transformatie staat in het teken van de geleidelijke afbouw van het huidige Applicatielandschap en de opbouw van het nieuwe Applicatielandschap.

In deze fase zullen er parallel naast elkaar twee systemen bestaan. Gezamenlijk met de Opdrachtnemer wordt besloten of er gefaseerd, per proces, in delen (vanaf een nieuwe aanvraag) of in één keer wordt overgegaan naar het nieuwe Applicatielandschap. Het CIZ heeft in paragraaf 6.4. Randvoorwaarden ten aanzien van migratie- conversiestrategie primaire processen opgesteld. De Opdrachtnemer dient in haar Transformatieplan rekening te houden met deze randvoorwaarden. Deze fase loopt over in de fase Continue Verbeteringen.

De fase 'Continue Verbeteringen'

Deze fase staat in het teken van het beheer van het nieuwe Applicatielandschap. Daarnaast dienen er continue verbeteringen c.q. aanpassingen van het nieuwe Applicatielandschap te worden doorgevoerd op basis van een gezamenlijke releaseplanning en veranderende wet- en regelgeving, rekening houdend met de dan geldende stand van de techniek en de continu opkomende functionele eisen en wensen vanuit de organisatie. Daarnaast draagt Opdrachtnemer zorg voor het actueel en technologisch op niveau houden van de infraomgeving, aansluitend op de functionele eisen en binnen de architectuorkaders van het CIZ. In deze fase wordt een proactieve houding van de Opdrachtnemer verwacht in het aandragen en implementeren van innovatieve marktontwikkelingen op functioneel en technisch gebied binnen het nieuwe Applicatielandschap.
