



CAB bruggen gemeente Haarlem

Marktconsultatie

projectnummer 0413188.206
definitief
15 september 2022

CAB bruggen gemeente Haarlem

Marktconsultatie

projectnummer 0413188.206

definitief
15 september 2022

Auteurs

J. Engelhart, G. van der Heide

Opdrachtgever

Gemeente Haarlem
Grote Markt 2
2011 RD HAARLEM

Gecontroleerd:

M. Brinkman



datum
15 september 2022

beschrijving
definitief

vrijgave
J. Rozema



Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Doel	1
1.3	Doelgroep	1
1.4	Opsomming werkzaamheden per brug	1
1.5	Leeswijzer	2
2	Procedure marktconsultatie	3
2.1	Aanpak en vraagstelling	3
2.1.1	Stap 1: schriftelijke consultatie	3
2.1.2	Stap 2: individuele verdiepende consultatie	3
2.2	Spelregels	4
2.3	Planning	5
Bijlage 1 - Planning		6
Bijlage 2 - Aanmeldingsformulier		7

1 Inleiding

De gemeente Haarlem is bezig met het groot onderhoud en het aanbrengen van centrale afstandsbediening (hierna: CAB) op een groot aantal van haar beweegbare bruggen. Deze werken worden in een aantal separate projecten op de markt gezet. De voorliggende marktconsultatie heeft als doel de markt de gelegenheid te geven informatie te leveren om de marktbenaderingsstrategie vorm te geven.

1.1 Aanleiding

Gezien de huidige, bijna overspannen, markt wil gemeente Haarlem toetsen hoe zij de verschillende projecten het beste in de markt kan zetten. Daartoe wil zij de markt vooraf consulteren.

1.2 Doel

De verschillende projecten binnen de scope CAB beweegbare bruggen op zo'n manier op de markt zetten, dat er voldoende capaciteit en animo bij de markt is om in te schrijven en uiteindelijk te komen tot succesvolle projecten.

1.3 Doelgroep

Aannemers, gespecialiseerd in W&E installaties en met ervaring met beweegbare bruggen.

1.4 Opsomming werkzaamheden per brug

Hieronder is beschreven welke werkzaamheden er per brug moeten worden uitgevoerd. In bijlage 1 is per brug de planning van de voorbereiding en uitvoering weergegeven.

CAB brug projecten	
Schoterbrug	De huidige brugbesturing wordt vervangen door een nieuwe brugbesturing en aangesloten op de CAB.
Waarderbrug	De huidige brugbesturing wordt vervangen door een nieuwe brugbesturing en aangesloten op de CAB. ook worden er camera's en spreek/luister voorzieningen aangebracht.
Figeebrug	De huidige brugbesturing wordt aangepast (beschilt) en aangesloten op de CAB als deze gereed is. Componenten met een lange levertijd wordt middels een directieleverantie ter beschikking gesteld.
Prinsenbrug (bascule)	De huidige brugbesturing wordt vervangen door een nieuwe brugbesturing en aangesloten op de CAB als deze gereed is. Ook worden er camera's en spreek/luister voorzieningen aangebracht. Componenten met een lange levertijd wordt middels een directieleverantie ter beschikking gesteld.
Prinsenbrug (tafel)	De huidige brugbesturing wordt vervangen door een nieuwe brugbesturing en aangesloten op de CAB als deze gereed is. Ook worden er camera's en spreek/luister voorzieningen aangebracht.

	Daarnaast wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de aandrijving en het bewegingswerk van de brug. Componenten met een lange levertijd wordt middels een directieleverantie ter beschikking gesteld.
Spaarne spoorbrug	ProRail vervangt de besturing van de brug. De gemeente Haarlem verzorgt de lokale bediening vanaf de Prinsenbrug en de aansluiting op de CAB.
Nevenprojecten	
CAB Havenkantoor	In het nieuw te realiseren havenkantoor wordt de Centrale Afstandsbediening Bruggen (CAB) gerealiseerd. In een bouwteamverband wordt de technische installatie en inrichting van de CAB uitgewerkt en aanbesteed. De uitvraag van dit bouwteam loopt gelijktijdig met de markt consultatie.
GO Catharijnebrug	De huidige brugbesturing wordt vervangen door een nieuwe brugbesturing. Deze brug wordt niet aangesloten op de CAB maar wel voorbereid dat dit niet onmogelijk is. Daarnaast wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de aandrijving, het bewegingswerk, staal en constructie van de brug. Componenten met een lange levertijd wordt middels een directieleverantie ter beschikking gesteld.
GO Gravestenenbrug	De huidige brugbesturing wordt vervangen door een nieuwe brugbesturing. Deze brug wordt niet aangesloten op de CAB maar wel voorbereid dat dit niet onmogelijk is. Daarnaast wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de aandrijving, het bewegingswerk, staal en constructie van de brug. De aanbesteding van dit werk loopt al.

Tabel 1: Opsomming werkzaamheden per brug

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 gaan we nader in op de procedure van de marktconsultatie.

2 Procedure marktconsultatie

2.1 Aanpak en vraagstelling

De marktconsultatie ontwikkelt zich in 2 stappen;

Stap 1: schriftelijke consultatie;

Stap 2: individuele verdiepende consultatie, als vervolg op stap 1.

2.1.1 Stap 1: schriftelijke consultatie

In deze stap nodigen wij u uit om 3 algemene consultatie vragen te beantwoorden:

1. Is met onze planning (Bijlage 1) uw bijdrage in één of meerdere projecten haalbaar?
 - a. Welke mogelijkheden ziet u om de planning te optimaliseren?
2. In welke mate bent u in staat om, qua omvang, één of meerdere projecten tegelijk te realiseren?
 - a. Welke mogelijkheden ziet u om projecten samen te voegen?
3. Welke contract-/ samenwerkingsvorm ziet u bij voorkeur voor de uit te voeren werkzaamheden?

U dient voor de beantwoording van bovenstaande vragen het aanmeldingsformulier (Bijlage 2) te gebruiken. Het aanmeldingsformulier dient na ondertekening via Tendered geretourneerd te worden.

2.1.2 Stap 2: individuele verdiepende consultatie

Aan de hand van de aanmeldingsformulieren wordt een selectie gemaakt van maximaal 8 marktpartijen met het doel een evenwichtige markt vertegenwoordiging te creëren. De geselecteerden ontvangen een uitnodiging voor deelname aan het vervolg van de marktconsultatie. De marktpartijen die niet worden uitgenodigd krijgen hier melding van.

De individuele marktconsultatie wordt digitaal en individueel gehouden. Genodigden krijgen hiervoor een teams vergaderverzoek gemaild. In deze tweede stap kunt u nader toelichten op welke wijze u kunt bijdragen aan de projecten. Van deze tweede consultatieronde maken wij een verslag dat eerst individueel wordt gedeeld en waarbij u de vraag krijgt welke onderdelen openbaar gedeeld kunnen worden en welke een commercieel belang inhouden. Van de gehele marktconsultatie stellen we een integraal consultatierapport op welke is voorzien van geanonimiseerde bijdragen welke erkend zijn om openbaar te delen.

Uiteindelijk leidt de marktconsultatie tot een planning met verschillende aanbestedingen die voldoende deelname zal hebben.

2.2 Spelregels

Voor de deelnemende partijen zijn er een aantal spelregels opgesteld:

- Deelname aan de marktconsultatie is vrijwillig en wederzijds vrijblijvend. Partijen die aan de marktconsultatie deelnemen kunnen daar op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. Dit geldt voor de opdrachtgever én voor de potentiële opdrachtnemers.
- Deelname aan de marktconsultatie is slechts mogelijk door middel van tijdige inzending van het aanmeldingsformulier. Door deelname aan de marktconsultatie accepteert de deelnemer de voorwaarden voor deelname, waaronder deze spelregels voor de marktconsultatie;
- Gemaakte of te maken kosten door marktpartijen voor de marktconsultatie worden niet vergoed;
- Gemeente Haarlem heeft het recht zonder nadere toelichting of verantwoording een selectie van de deelnemers van stap 1 (schriftelijke consultatie) uit te nodigen voor stap 2 (individuele verdiepende consultatie);
- Gemeente Haarlem is zich ervan bewust dat het deelnemen aan de marktconsultatie niet mag leiden tot een kennisvoorsprong bij deelnemende partijen ten opzichte van niet-deelnemende partijen, indien zij na de gehouden marktconsultatie overgaat tot het uitvoeren van de voorziene aanbestedingsprocedure. Om te borgen dat ook niet-deelnemende geïnteresseerden dezelfde informatie over de opdracht verkrijgen, wordt tijdens de marktconsultatie ingewonnen informatie verwerkt in een geanonimiseerde rapportage. De concept rapportage wordt naar de deelnemers toegestuurd. Deelnemers dienen binnen vijf werkdagen gemotiveerd hun reactie op de rapportage te geven. Aan de hand van deze motivatie beoordeelt het projectteam of zij de door de geconsulteerde partij gewenste aanpassing van de rapportage noodzakelijk acht en daadwerkelijk doorvoert.
- De rapportage wordt ter beschikking gesteld voor alle mogelijk geïnteresseerden;
- Partijen die aan de marktconsultatie deelnemen beschikken door deze procesgangen niet over méér informatie betreffende het project dan anderen. Zij verkeren in geval van een eventuele aanbesteding van het project in een vervolgtraject dan ook op gelijke voet met andere marktpartijen die niet of slechts ten dele aan de bijeenkomst hebben deelgenomen;
- In verslaglegging van bijeenkomsten blijven de deelnemende marktpartijen anoniem;
- De informatie die tijdens de marktconsultatie door of vanwege het projectteam wordt verstrekt, evenals de door de deelnemers aan de bijeenkomst gestelde vragen en verstrekte informatie worden als openbaar beschouwd. Informatie welke door de deelnemers tijdens de marktconsultatie onder vertrouwelijkheid wordt verstrekt zal door het projectteam als vertrouwelijk worden behandeld, mits dit voorafgaand aan het verstrekken van de informatie door de betreffende deelnemer expliciet aan het projectteam kenbaar is gemaakt.

Bij deelname aan de marktconsultatie committeren partijen zich aan bovengenoemde spelregels.

2.3 Planning

De activiteiten met betrekking tot de marktconsultatie zien er als volgt uit:

Activiteit	Verantwoordelijke	Planning (2022)
Uitnodigen gegadigden	Gemeente Haarlem	16 september
Stap 1		
Uiterlijk indienen deelnameformulier	Deelnemers	23 september
Uitnodiging individuele consultatieronde	Gemeente Haarlem	30 september
Stap 2		
Uitvoeren individuele consultaties (30 minuten per consultatie)	Gemeente Haarlem	10 oktober en 11 oktober 13:00-17:00
Versturen concept verslag	Gemeente Haarlem	18 oktober
Reactie review deelnemers	Deelnemers	25 oktober
Verslag marktconsultatie definitief	Gemeente Haarlem	1 november


Tabel 2: Planning m.b.t. marktconsultatie

Gemeente Haarlem behoudt zich het recht voor om wanneer zij dit noodzakelijk acht de planning te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig openbaar gemaakt, dan wel aan de deelnemers kenbaar gemaakt.

Bijlage 1 - Planning

Planning CAB en bruggen Haarlem

Datum: 06-09-2022

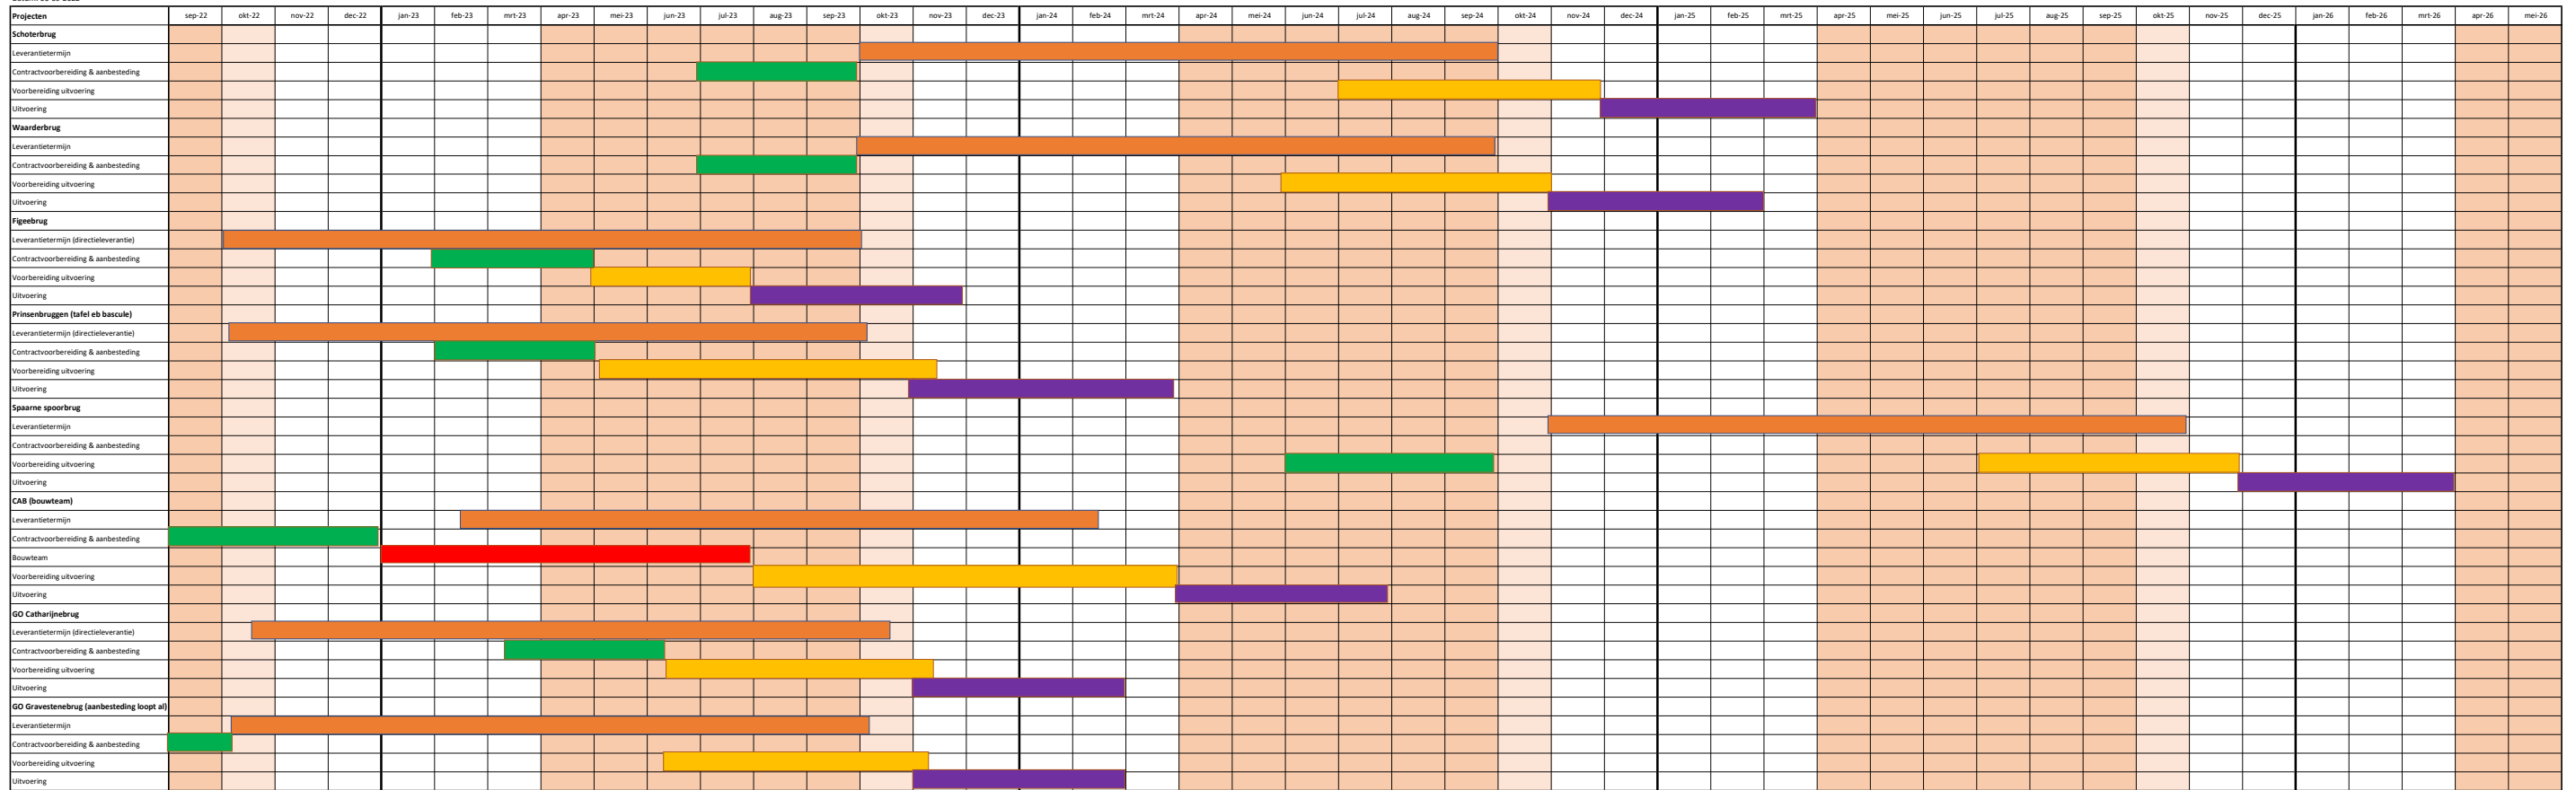

Bijlage 2 - Aanmeldingsformulier

Deelnameformulier Marktconsultatie CAB bruggen gemeente Haarlem

Naam onderneming met rechtsvorm :
Nr. inschrijving handelsregister :

Postadres :
Postcode en plaats :
Land :
Telefoon :

Contactpersoon :
Naam :
Functie :
Telefoon :
e-mail :

Ondergetekende verklaart zich met de invulling van het aanmeld formulier en het beantwoorden van de consultatievragen als deelnemer te hebben aangemeld.

Verklaring

Ondergetekende verklaart zich hierbij in te schrijven voor deelname aan de marktconsultatie CAB bruggen gemeente Haarlem en daarmee in te stemmen met de voorwaarden/spelregels zoals vermeld in het document 'Marktconsultatie CAB bruggen gemeente Haarlem'.

Aldus naar waarheid opgemaakt op (datum) te (plaats)

..... (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger gegadigde)

..... (functie vertegenwoordiger)

..... (handtekening vertegenwoordiger)

Vragenformulier Marktconsultatie CAB bruggen gemeente Haarlem

1. Is met onze planning (Bijlage 1) uw bijdrage in één of meerdere projecten haalbaar?

.....

- a. Welke mogelijkheden ziet u om de planning te optimaliseren?

.....

2. In welke mate bent u in staat om, qua omvang, één of meerdere projecten tegelijk te realiseren?

.....

- a. Welke mogelijkheden ziet u om projecten samen te voegen?

.....

3. Welke contract-/ samenwerkingsvorm ziet u bij voorkeur voor de uit te voeren werkzaamheden?

.....

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

www.anteagroup.nl

Copyright © 2022

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.
