

Bijlage 1 –2^e Nvl Selectiefase IB-diensten PUW-fase Guisweg

Vanuit OG worden onderstaande wijzigingen doorgevoerd in de contractdocumenten. Tevens zijn onderstaande bijlagen bij de 1e Nota van Inlichtingen Dialoofase gevoegd.

Tabel overzicht bijgevoegde bijlagen 2^e Nvl Selectiefase.

Nr.	Naam document	Te voegen in informatiemap van het contractdossier:	Status	Vraag	Nvl
1	-				

Wijzigingen in het document Selectieleidraad:

Opdrachtgever wenst alsnog de IB-diensten K&L verleggingen in de scope van de opdracht op te nemen van de IB-diensten PUW fase. De redenen voor Opdrachtgever om hier alsnog voor te kiezen zijn:

- De K&L verleggingen zijn onlosmakelijk met de integraliteit van het op te stellen ontwerp met elkaar verweven. Zonder kennis en inzicht van de benodigde K&L verleggingen is geen integraal ontwerp te maken. De K&L verleggingen maken bij nader inzien logischerwijs onderdeel van de IB-diensten PUW opdracht;
- De coördinatie tussen IB-diensten PUW fase en de IB K&L-verleggingen maken ook al onderdeel uit van de scope van de IB-diensten PUW fase. De K&L verleggingen kunnen dus goed onder onderdeel b) engineering gevoegd worden;
- Opdrachtgever wegens oponthoud in de bestuurlijke besluitvorming de IB-diensten K&L verleggingen niet zoals gewenst voorafgaand aan de IB-diensten PUW-fase heeft kunnen uitvragen en uitvoeren en dit als input voor de IB-diensten PUW fase te gebruiken;
- Opdrachtgever nu omwille van het integraliteitsvraagstuk van het ontwerp en vanuit efficiency de IB-diensten K&L verleggingen het beste belegd ziet bij de Opdrachtnemer IB-diensten PUW fase onder onderdeel b) engineering;
- De IB-diensten K&L verleggingen in dezelfde range vallen als het gaat om Ingenieursdiensten en -adviezen en daarmee toegevoegd kunnen worden in deze uitvraag;
- Opdrachtgever hiertoe geen aanpassing doet op de gestelde Selectiecriteria, met de toelichting dat Gegadigden dit voldoende kunnen meenemen in de kerncompetentie 2 “Gegadigde dient aantoonbare kennis van en ervaring met te hebben met de gevraagde diensten onderdeel b) Engineering in soortgelijke projecten”
- Opdrachtgever verwacht dat de potentiële marktpartijen de K&L verlegging werkzaamheden en adviezen goed kunnen leveren dan wel daar een specialistisch ingenieurs-/adviesbureau voor in zullen schakelen als onderaannemer/-leverancier;


Voor Opdrachtgever zijn bovenstaande redenen de project specifieke motivering en wenst deze aan de marktpartijen mee te geven.

Opdrachtgever maakt dit met deze extra Nota van Inlichtingen aan alle marktpartijen kenbaar zodat zij allen daardoor voldoende kunnen anticiperen op deze aanvulling onder onderdeel b) engineering.

Bovenstaande betekent dat Opdrachtgever de Selectieleidraad op onderstaande punten aanpast:

- **Selectieleidraad, in het gehele document:**
Daar waar onderdeel b) engineering staat dient te worden gelezen onderdeel b) engineering incl. K&L-verleggingen.
- **Paragraaf 1.8 Scope, aard en omvang van de aan te besteden opdracht:**

De behoefte aan ingenieursdiensten voor het project Guisweg bestaat uit verschillende contracten zoals hieronder weergegeven.

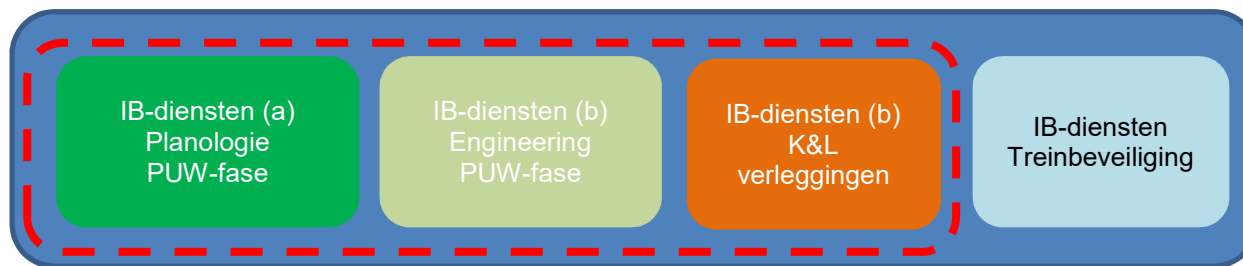

Deze opdracht is opgebouwd uit twee onderdelen (a) Planologie en (b) Engineering incl. K&L verleggingen Planuitwerkingsfase (PUW-fase).

--- / ---

De omvang van de opdracht concreet naar producten en diensten is weergegeven in bijlage 4 Overzicht werkpakketten en wordt in het Programma van Eisen (PvE) definitief uiteengezet. Het PvE wordt aan de geselecteerde gegadigden verstrekt bij uitnodiging tot deelname aan de Gunningfase.

--- / ---

Par. 1.8 onder 'De scope en aard van de opdracht onderdeel ~~b: Engineering Ingenieursdiensten~~ PUW-fase project Guisweg, bestaan uit:'

De scope wordt aangevuld met de volgende werkpakketten:

1. Kabels en Leidingen, inventariseren
2. Kabels en Leidingen, proefsleuven
3. Kabels en Leidingen, inpassen
4. Kabels en Leidingen, Overeenstemming bereiken

Par. 1.8 onder 'De scope en aard van de optionele diensten:'

De optionele scope wordt aangevuld met:

5. Kabels en Leidingen, Begeleiding bij uitvoering verleggingen cat. 1 en 2

Om te bepalen of optionele werkzaamheden bij het ingenieursbureau worden neergelegd, vindt een evaluatiegesprek plaats waarin de samenwerking en kwaliteit van het werk wordt geëvalueerd. Het gaat daarbij om zaken als het naar tevredenheid van Opdrachtgever tijdig opleveren van stukken, oplossingsgericht opereren, goede coördinatie van taken/werkzaamheden, kwaliteit van het geleverde werk en dergelijke. Op basis van het evaluatiegesprek wordt door opdrachtgever bepaald om wel of niet de optionele werkzaamheden op te voeren en af te nemen.

--- 0 ---
