



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Marktinformatie

Portfolio ROK Vernieuwen MB2.0
Bediening en Besturing Maasobjecten

Henk van Duinen, Erik van Duijvendijk

12 januari 2026
MarktconsultatieMB2.0@rws.nl



Programma

09.30 – 09.35 uur	Opening, welkom
09.35 – 09.55 uur	Toelichting ontwikkelingen
09.55 – 10.15 uur	Ruimte voor vragen
10.15 – 10:25 uur	Vervolg en concept aanbestedingsplanning
10.25 – 10:30 uur	Afsluiting



Proces en spelregels marktinformatie bijeenkomst

- Gezien het vrijblijvende karakter van de marktinformatie bijeenkomst, kunnen er geen rechten ontleend worden aan enige informatie verstrekt in het kader van dit marktinformatie moment. Informatie uit deze marktinformatie kan afwijken van informatie die later in het kader van een aanbesteding wordt verstrekt.
- Er ontstaan geen voorkeursposities of uitsluitingsgronden door deelname.
- Er vloeien geen consequenties voort uit de deelname ten aanzien van een aanbesteding in de toekomst.
- Ter borging van transparantie, objectiviteit en gelijkheid wordt een verslag opgesteld en gedeeld via TenderNed. Vragen en opmerkingen zijn geanonimiseerd en daarmee niet herleidbaar tot partijen.
- Vragen stellen gedurende presentatie wordt gewaardeerd, spelregels worden hierna toegelicht.
- De presentatie wordt via TenderNed gedeeld.



Proces en spelregels vraag en antwoord

- Vraag: Digitale hand opsteken;
- Schriftelijke vragen via TN marktinformatie tot uiterlijk 14-01-2026;
- Niet alle vragen kunnen op dit moment beantwoord worden, er zijn de volgende mogelijkheden:
 - Vraag wordt direct beantwoord en opgenomen in het verslag;
 - Vraag wordt geparkeerd tijdens bijeenkomst en beantwoord in verslag;
 - Vraag kan nog niet beantwoord worden. De aanbestedingsdocumenten bij publicatie van de opdracht brengen mogelijk verduidelijking. Indien dit niet het geval is, is er de mogelijkheid tijdens de aanmeldfase de vraag te herhalen (opnieuw indienen tijdens aanbestedingsprocedure).



Doel marktinformatie bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is marktpartijen te informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de marktbenadering van de Portfolio ROK Vernieuwen MB2.0, o.a. ten aanzien van:

- Het samenvoegen in één opdracht van het onderhoud voorafgaand aan en tijdens de vernieuwingsopgave met de werkzaamheden van de vernieuwingsopgave zelf en het onderhoud tot maximaal 5 jaar na het laatst vernieuwde object .
- Door de keuze tot samenvoegen wordt de scope die eerder onder het contract 31193635 IMO viel niet meer zelfstandig terug op de markt gezet;
- De voorgenomen datum van publicatie van aankondiging van opdracht 31121609 wordt gewijzigd van 12 januari 2026 naar 4 februari 2026 (zeer waarschijnlijk).



Aanleiding ontwikkelingen

- Vroegtijdig beëindigde aanbesteding;
De aanbesteding 311936356 In standhouden Maasobjecten (IMO) is vroegtijdig beëindigd vanwege een fundamenteel gebrek in de aanbesteding;
- Zorgvuldige afweging nieuwe marktbenadering;
Het projectteam heeft de verschillende mogelijkheden onderzocht om de inkoop van het onderhoud (IMO) opnieuw aan te besteden te worden;
- Gewijzigde wijze van marktbenadering
De oorspronkelijke inkoopstrategie voorzag reeds in een bundeling van de werkzaamheden d.m.v. een MDBM contract. Deze wijze van marktbenadering was destijds te risicovol, waardoor gesplitst is. Inmiddels is een nieuw model Raamovereenkomst ontwikkeld binnen RWS, waardoor het mogelijk is de werkzaamheden gezamenlijk aan te besteden met een acceptabel risicoprofiel.



Motivatie bundelen twee scopes

Enkele redenen uitgelicht:

- Raakvlakbeheersing en risico's verminderen die de demarcatie tussen beide scopes kon opleveren;
- Van start tot einde looptijd één calamiteiten- en storingenorganisatie die continue een redelijk vaste onderhoudsscope bevat;
- Minder overdrachtsmomenten (transities);
- Meer ruimte voor ON om planning te optimaliseren;
- Minder (tender)capaciteit nodig bij markt en Rijkswaterstaat door één aanbesteding.



Kenmerken marktbenadering


- Financiële omvang 500 – 750 miljoen euro excl. Omzetbelasting;
- Contractuele portfolio die d.m.v. een Raamovereenkomst (ROK) wordt aanbesteed;
- Onder de ROK bestaan de volgende type Nadere overeenkomst (NOK):
 - NOK Portfoliomanagement;
 - NOK Object;
 - NOK Onderhoud (al het onderhoud, inclusief calamiteiten- en storingsorganisatie);
 - NOK Calamiteiten (enkel indien noodzakelijk);
- Verdeling vernieuwing 65% / onderhoud 35%;
- Van het onderhoud zit, circa 60 % onderhoud na vernieuwing o.b.v. ontwerp uit ontwerpfase.



Scopebeschrijving



- 18 complexen, incl. bediengebouwen;
57 objecten beweegbare objecten, waarvan o.a.:
 - 24 sluiskolken;
 - 4 beweegbare objecten;
 - 4 kraanwagens/traverse;
 - 25 waterreguleringswerken;
 - o.a. stuwen, gemalen, waterkrachtcentrales, vistrappen, uitlaatwerken);
- 75 vaste objecten.

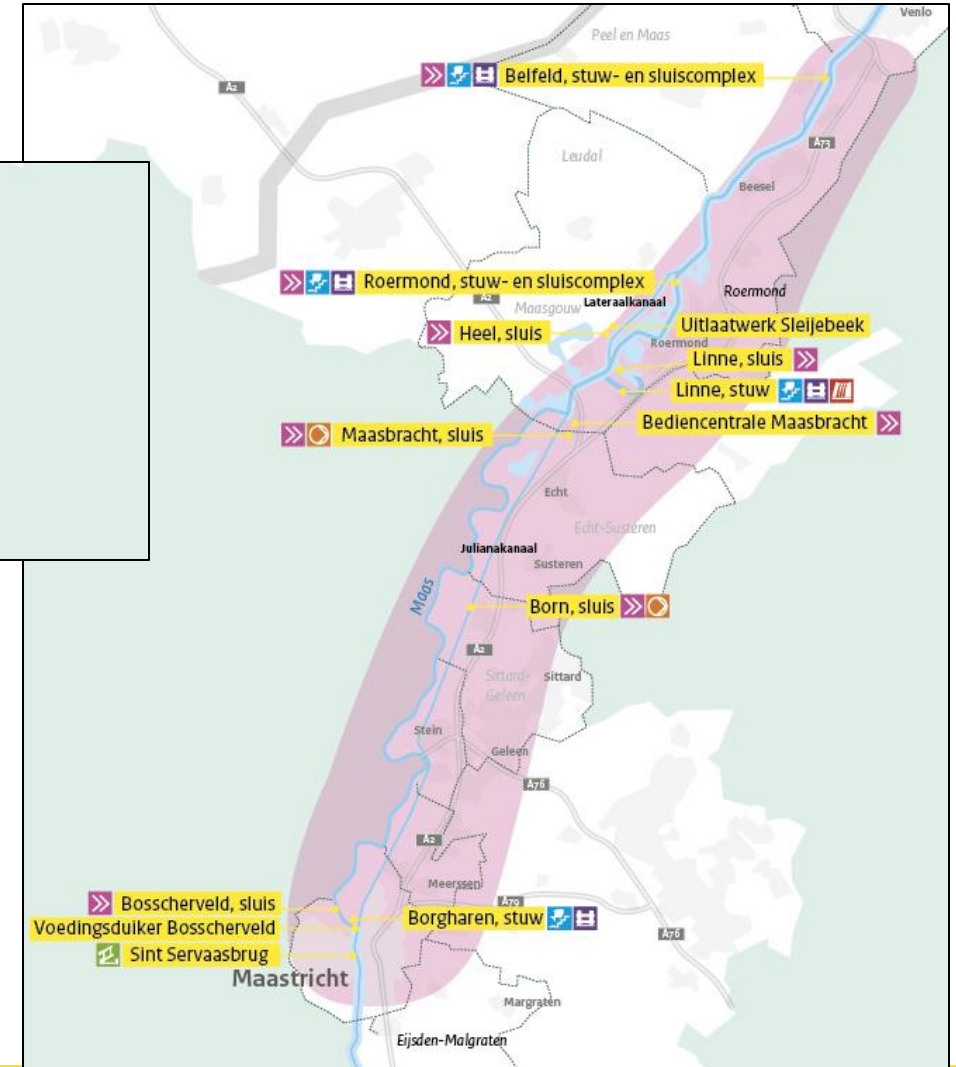



Onderhoud

De scopebeschrijving is verwoord in het marktinformatie document.

Belangrijke highlights:

- Het onderhoud voorafgaande aan de vernieuwingsopgave is onderdeel geworden van de scope;
- Naar verwachting wordt er één Nadere overeenkomst Onderhoud opgedragen;
- Opdrachtgever is voornemens om in gezamenlijkheid met de opdrachtnemer een afweging te maken of en hoe de variabele maatregelen uit de IMO scope (31193635) uitgevoerd zullen worden om te komen tot een optimale aanpak in relatie tot de vernieuwingsopgave. De afprijzing van deze maatregelen zal via het Prijzenboek plaats vinden.



Overige beschikbare informatie


Overige informatie over het project:

- Verslagen Marktconsultaties (TenderNed);
- Marktinformatie document (TenderNed);
- Inkoopplanning.



Ruimte voor vragen

- Hand opsteken, voorzitter geeft het woord

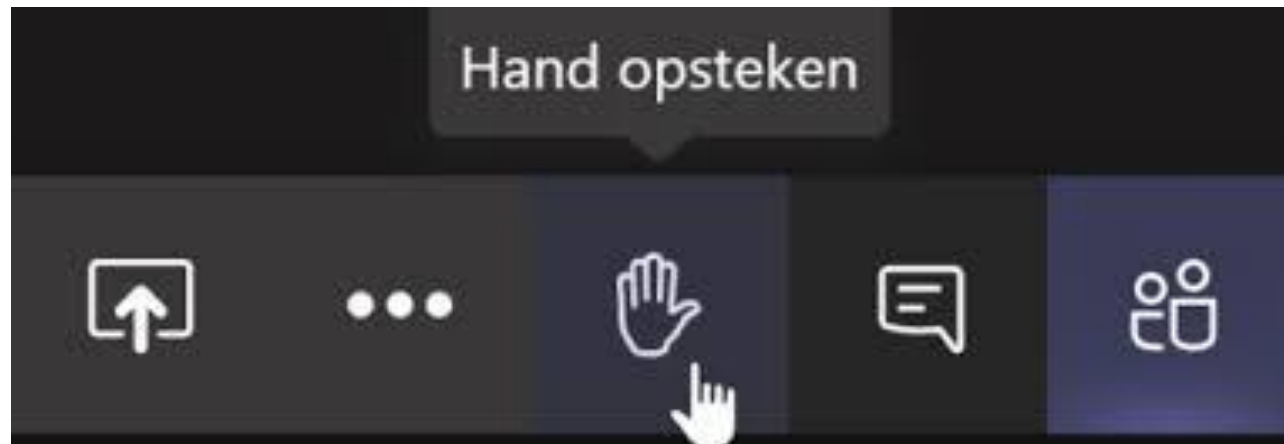



Concept aanbestedingsplanning

- Publicatie aankondiging van een opdracht: 4 februari 2026
- Indienen aanmeldingen: 9 maart 2026
- Beoordelen op geschiktheid en Nadere selectie o.b.v. selectiecriteria tot maximaal 3 gegadigden die een uitnodiging tot de dialoofase ontvangen, selectiebeslissing: 17 maart 2026
- Eventuele loting bij gelijk scorende gegadigden om de tot de dialoog uit te nodigen gegadigden te bepalen: 25 maart 2026
- Start dialoofase: 25 maart 2026 (geen loting), 31 maart 2026 (loting)
- Indienen inschrijvingen: 25 september 2026
- Gunningsbeslissing: 23 november 2026
- Opdrachtverlening: 14 januari 2027

De aanbestedingsplanning kan aan verandering onderhevig zijn.



Afsluiting

- Vragen via TN tot uiterlijk 14-01-2026
- Publicatie verslag op TN uiterlijk 23-01-2026



Bedankt

Dank voor jullie deelname.
