

Bijlage 7 Casus sub-gunningscriterium K2

Situatieschets

Elke 3 jaar worden alle bomen geïnspecteerd op basis van Handboek Bomen door een externe boomveiligheidsdeskundige. Op basis van deze boominspectie wordt de vervangingsopgave opgesteld. Daarbij worden zowel bomen verwijderd vanuit veiligheid voor de omgeving als vanuit beheeroogpunt. De aanplant van nieuwe bomen gebeurt daarbij bij voorkeur in de vollegrond en zoveel mogelijk geclusterd. Elk jaar wordt tenminste 1 deelopdracht opgesteld. De opdracht wordt verwerkt in de module kap & aanplant van het programma GRIB.

In deze casus is de opdrachtgever voornemens om in 1 perceel de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- 250 bomen kappen en opruimen
- 250 stronken verwijderen en grond uitwisselen
- 200 groeiplaatsen inrichten voor nieuwe bomen (waarvan 10% in verharding)
- 200 nieuwe bomen aan planten (waarvan 10% in verharding)


De aan te planten bomen komen deels ter vervanging van bestaande bomen en deels op een nieuwe locatie. De werkzaamheden vinden plaats verdeeld over 4 woonwijken op circa 50 unieke plantlocaties (straten). Deze locaties liggen veelal in bestaand stedelijk gebied. De opdrachtgever verzorgt vooraf de communicatie naar inwoners (d.m.v. brieven/aankondiging).

De opdrachtgever maakt voor de deelopdracht een nieuw project in GRIB Uitvoerig en een inschrijfstaat vanuit de raamovereenkomst. De aannemer krijgt vervolgens twee weken de tijd voor het beoordelen van de conceptopdracht op uitvoerbaarheid. Na overeenstemming van de deelopdracht verwacht de opdrachtgever binnen twee weken een plan van aanpak met werkwijze, route en gedetailleerde planning. Pas na goedkeuring van het plan van aanpak mag de opdrachtnemer starten met de uitvoering.


Tijdens de uitvoering verwacht de opdrachtgever dat de opdrachtnemer de voortgang van de werkzaamheden bijhoudt in GRIB en de besteksadministratie in Ibis. In GRIB is het mogelijk om ook wijzigingen en/of afwijkingen door te geven.

Na uitvoering én goedkeuring van alle werkzaamheden zet de opdrachtgever de nieuw aangeplante bomen over naar de beheermodule (kaart) voor de nazorg. De kaart is een totaaloverzicht van alle geplante bomen in het perceel. Hierin zijn alle geplante bomen per plantseizoen inzichtelijk voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Aanbesteding: Cyclisch boombeheer: snoei en vervanging van bomen
Referentienummer: 633340

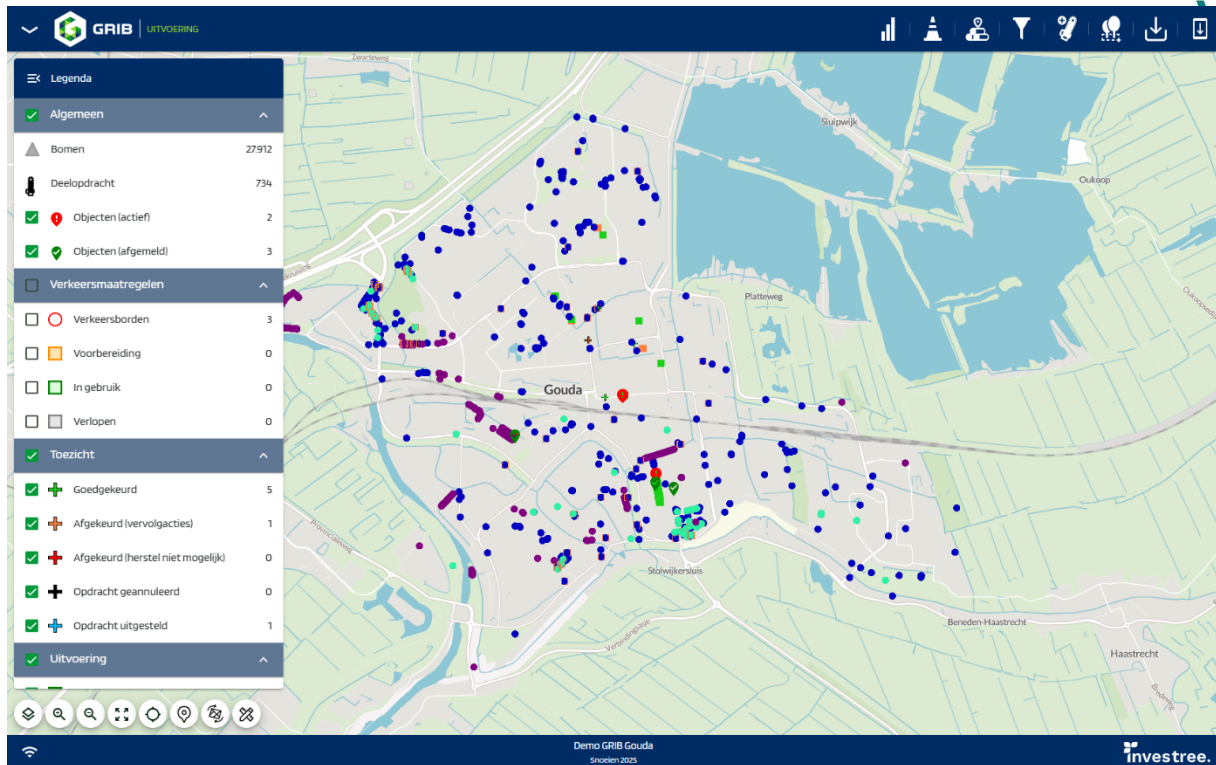

Figuur 1: Voorbeeld van GRIB uitvoering

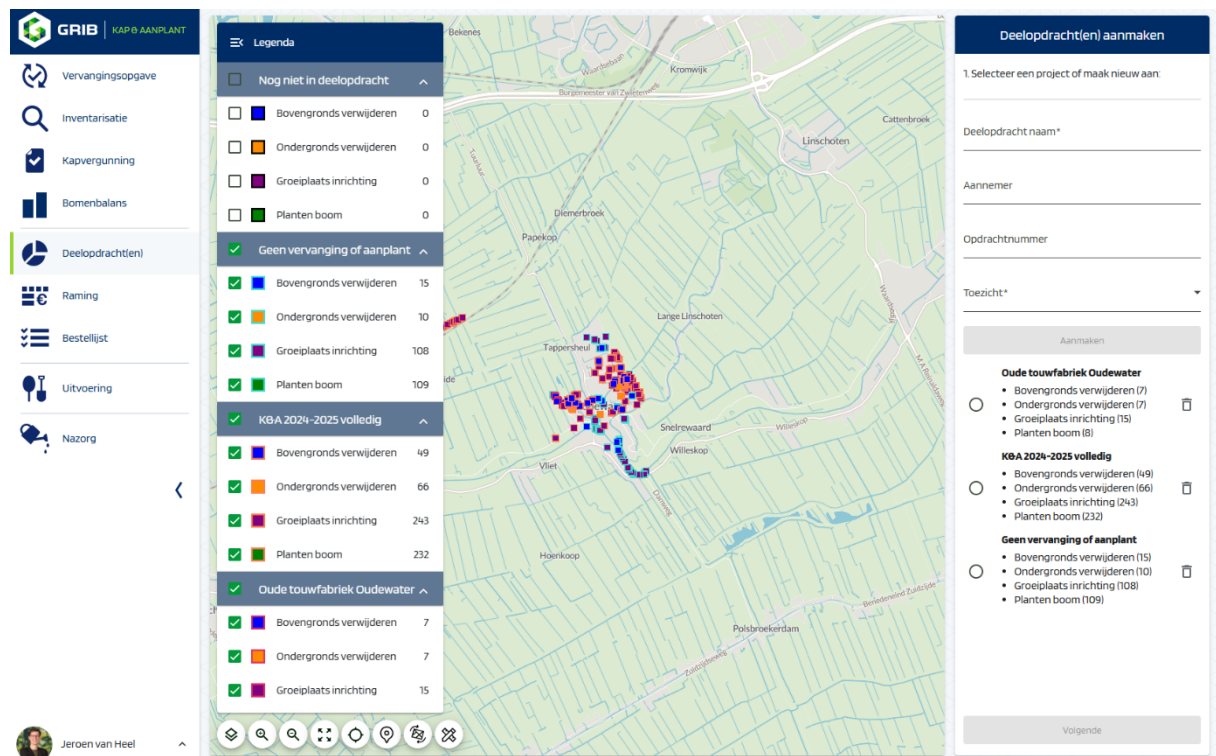

Figuur 2: Voorbeeld van GRIB uitvoering

Vragen (30 punten)

Beschrijf hoe u de conceptdeelopdracht toetst op uitvoerbaarheid en werk vervolgens concreet en stapsgewijs uit hoe u de kap- en aanplantwerkzaamheden vervolgens voorbereid, organiseert en uitvoert.

Ga daarbij expliciet in op de volgende onderwerpen:

- Onderwerp 1. Organisatie en planning; (maximaal 5 punten)
- De wijze waarop u de uitvoerbaarheid van de deelopdracht vooraf toetst (technisch, organisatorisch, juridisch en omgevingsgericht);
 - Op welke wijze organiseert u de werkzaamheden efficiënt, realistisch en beheersbaar, met een strakke planning en minimale hinder voor de omgeving?
 - Hoe is uw organisatie ingericht om deze werkwijze structureel te borgen, zodat de uitvoering niet afhankelijk is van individuen maar verankerd is in processen, systemen en personele inzet?
- Onderwerp 2. Flexibiliteit en risicobeheersing; (maximaal 5 punten)
- Hoe signaleert u tijdig uitvoeringsrisico's en onvoorziene omstandigheden (zoals weersinvloeden, kabels en leidingen, verkeerssituaties, flora en fauna en klachten van omwonenden) en hoe beheerst u deze effectief?
 - Hoe borgt u gedurende de uitvoering de kwaliteit van de werkzaamheden?
 - Hoe waarborgt u de continuïteit van de uitvoering, bijvoorbeeld bij uitval van personeel, piekbelasting of gelijktijdige opdrachten?
- Onderwerp 3. Kwaliteitsborging en administratie; (maximaal 10 punten)
- Hoe borgt u aantoonbaar en transparant de kwaliteit van voorbereiding, uitvoering en nazorg?
 - Hoe organiseert en registreert u de administratieve vastlegging en rapportage van de werkzaamheden en hoe maakt u deze inzichtelijk voor de opdrachtgever?
 - Op welke wijze maakt u de voortgang en kwaliteit meetbaar en transparant (bijvoorbeeld via KPI's, controles, registraties en voortgangsrapportages)?
 - Hoe optimaliseert u de toekomstbestendigheid en vitaliteit van de nieuwe aanplant?
 - Hoe geeft u invulling aan de nazorgperiode na aanplant, inclusief monitoring, watergift, inboet en borging van het aanslagpercentage?
- Onderwerp 4. Boomtechnische kennis en vakmanschap; (maximaal 5 punten)
- Hoe zet u uw kennis en ervaring in op het gebied van boomaanplant, groeiplaatsen, boomgroei, nazorg en het Handboek Bomen?
- Onderwerp 5. Proactieve samenwerking en ontzorging; (maximaal 5 punten)
- Hoe denkt u proactief mee met de opdrachtgever en welke verbeteringen en adviezen draagt u aan tijdens de uitvoering?
 - Welke maatregelen neemt u om de overlast voor de omgeving te beperken?
