



# Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Buitenruimte

## Verkeersplan

**Bezoekadres:** Galvanistraat 15

**Postadres:** Postbus 6633

3002 AP Rotterdam

**Website:** [www.gw.rotterdam.nl](http://www.gw.rotterdam.nl)

**Van:** A.L. Nederstigt

**Telefoon:** 010 - 489 45 78

**Fax:** (010) 4255676

**E-mail:** [AL.Nederstigt@gw.rotterdam.nl](mailto:AL.Nederstigt@gw.rotterdam.nl)

**Project** : Stadionviaduct  
5691

**Contactpersoon** : R. Zwinkels / J. v.d. Laarse

Bedrijf : BR-CK / IGWR

Telefoon :

e-mail :

**Werf / DG** : IJsselmonde

**Datum** : 19-10-2010

**Versie** : a ~~22-11-2010~~ Concept

b 15-03-2012 [Aanpassing n.a.v. randvoorwaarden CoCoWOS](#)

### UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN EN TECHNISCHE ASPECTEN:

Vervangen van voegen, reparaties aan de slijtlaag op het kunstwerk en asfaltwerkzaamheden nabij het Breeplein;

### GEPLANDE UITVOERINGSPERIODE:

- [September 2012](#)

### WERKEN IN DE OMGEVING:

Werkzaamheden:

- [Maastunnel, afgesloten voor verkeer richting Zuid van 29 mei t/m 22 augustus 2012;](#)
- [Hillelaan \(5754\) diverse afsluitingen in oktober en november 2012;](#)
- [Persleiding Spinozaweg: Spinozaweg tussen Slinge en Victor Hugoweg afgesloten voor verkeer richting Victor Hugoweg in september en oktober 2012;](#)
- [Weekeindafsluitingen van hoofd- en parallelrijbanen Van Brienenoordbrug tussen vrijdag 1 juni en maandag 9 juli 2012;](#)

Evenementen (alleen met verwachte gevolgen Stadionviaduct):


- [Interland Nederland – Andorra in de Kuip op 12 oktober 2012;](#)
- [World Port Classic: diverse kortdurende afsluitingen in de omgeving van het stadionviaduct op 31 augustus en 1 september 2012;](#)

### OPMERKINGEN / RANDVOORWAARDEN CoCoWOS:

- [Afsluiting kan niet tegelijk met een evenement in de Kuip, maar nog geen agenda van de Kuip bekend;](#)
- [Kan niet tegelijk met de Maastunnel;](#)
- [Kan niet tegelijk met de Van Brienenoordbrug;](#)
- [Kan niet tegelijk met afsluitingen op de Spinozaweg;](#)
- [Kan niet tegelijk met afsluiting Hillelaan;](#)

#### VERKEERSHINDER:

- Gedurende de werkzaamheden wordt het viaduct continue afgesloten voor autoverkeer;
- Verkeersintensiteiten op het viaduct zijn:
  - In de ochtendspits c.a. 800 mvt/uur per richting en
  - in de avondspits c.a. 1050 mvt/uur per richting;
- Fiets- en voetgangersverkeer blijft mogelijk via de hellingbaan en het voetpad aan één van de zijden van de brug;
- Omleidingen voor het autoverkeer:

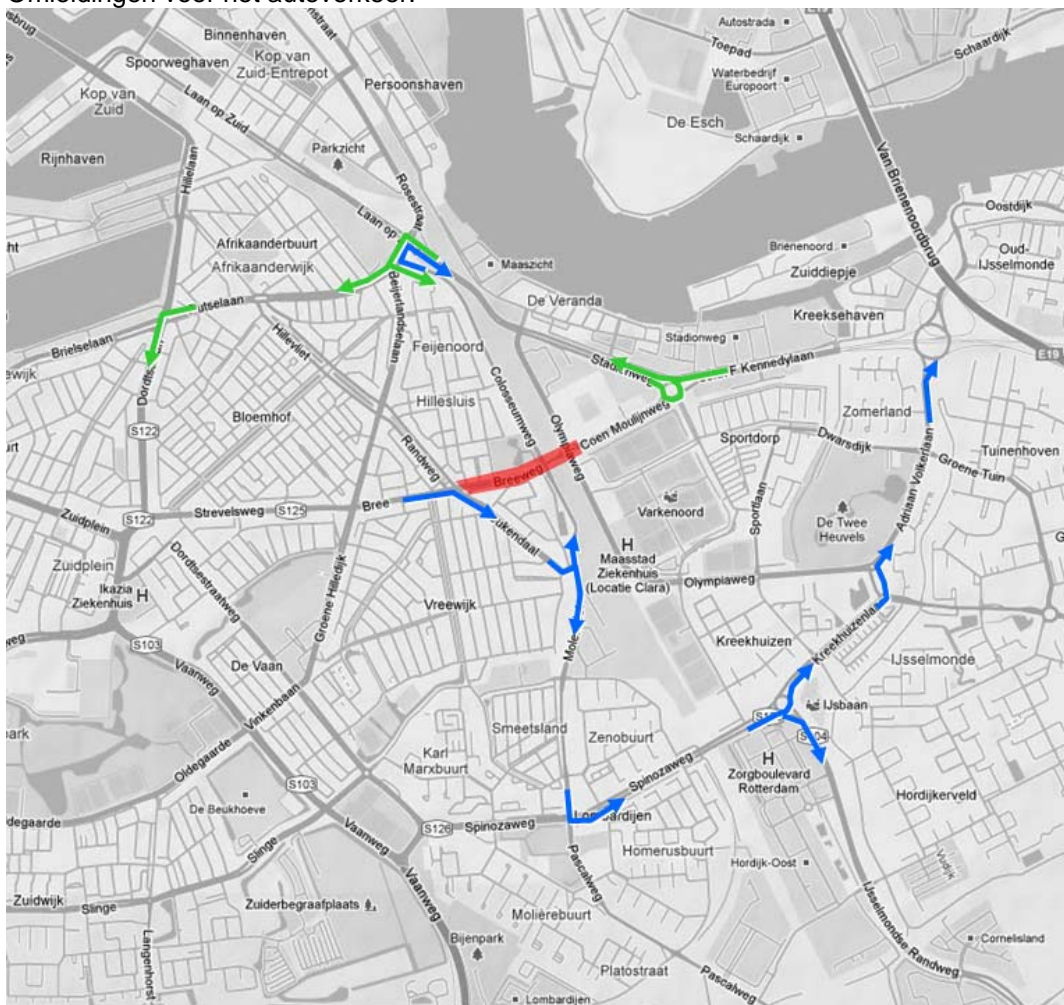

- Verkeer richting Stadionweg (blauwe pijlen) wordt omgeleid via...
  - Beukendaal – Colosseumweg – 2<sup>e</sup> Rosestraat - Varkenoordse viaduct (bestemming "Centrum" / "Ring A16") of
  - Beukendaal – Colosseumweg – Molenvliet – Spinozaweg (bestemming "Ring A15" / "Ring A16").
- Verkeer richting Vreewijk, Charlois en Zuidplein (groene pijlen) wordt omgeleid via Varkenoordseviaduct – 2<sup>e</sup> Rosestraat – Putselaan – Dordtselaan.



**VOORAANKONDIGINGEN:**

- Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden gele borden plaatsen met de vooraankondiging;
- Tevens de DRIP op de Stadionweg gebruiken voor de vooraankondiging van de afsluiting;

**GEVOLGEN / ACTIES VRI'S EN VERKEERSMANAGEMENT**

- Aanpassingen aan de VRI's zijn alleen nodig bij de weekeindafsluiting.
- Aan te passen VRI's:
  - Rtonde Stadionweg;
  - Kruising 2<sup>e</sup> Rosestraat – Laan op Zuid;
  - kruising 2<sup>e</sup> Rosestraat – Colosseumweg;
  - Breeplein;
- DRIP op de Stadionweg gebruiken voor de aankondiging van de afsluiting;
