

A light gray background map of Amsterdam, showing the city's characteristic canal network and street layout. A solid blue vertical line runs along the left edge of the slide.

○ Startbijeenkomst aanbesteding elektrische IJveren

Agenda

Introductie GVB

Projectteam

Aanbestedingsprocedure
elektrische IJveren

Planning aanbesteding


Vragen



Over GVB

Ruim 3.239 fte

15 tramlijnen, 25 buslijnen, 5 metrolijnen en 10 veerverbindingen

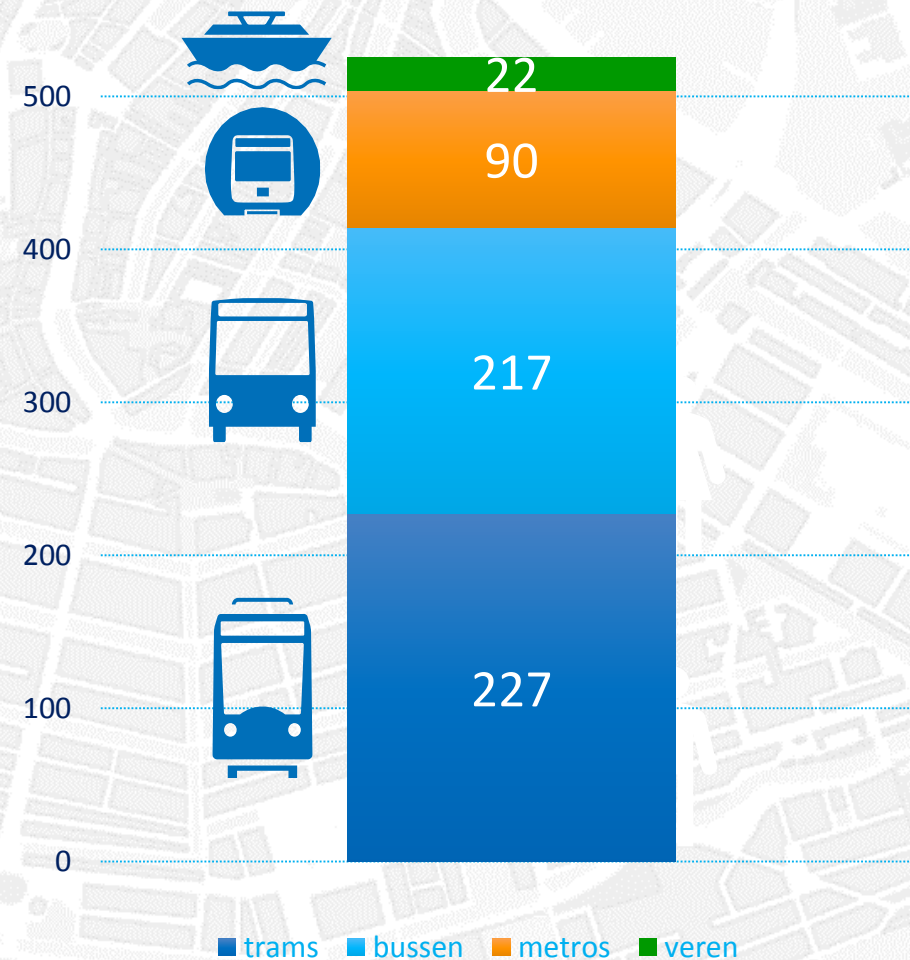

Amsterdam bereikbaar voor iedereen

90% Reizigers waardeert ons met 7 of hoger

90% Reizigers komt op tijd op bestemming

Marktconform in kosten en opbrengsten

De stad leefbaar, bereikbaar en verbonden met de regio houden

We groeien toe naar uitstootvrij, onze leveranciers waar mogelijk ook

We zijn dé werkgever die voor iedereen in Amsterdam bereikbaar is



Veerverbindingen

Oostveer

IJpleinveer

Buiksloterwegveer

NDSM-veer

Distelwegveer

Houthavenveer

Nachtelijk Westveer

Hempont

Buitenhuizerpont

Velserpont

Zamenhofstraat - Azartplein

IJplein - CS

Buiksloterweg - CS

NDSM-werf - CS

Distelweg - Pontsteiger

NDSM - Pontsteiger

NDSM – Pontsteiger - CS

Zaandam - Amsterdam

Assendelft - Spaarndam

Velsen-Noord – Velsen-zuid



Scheepstype	Aantal
IJveer 30 schepen	2 stuks
IJveer 50 schepen	7 stuks
IJveer 60 schepen	7 stuks
Elektrische NZK ponten	5 stuks

Projectteam

Programma Elektrificatie veerdienst

- Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Dienst verkeer en openbare ruimte
- Programma manager Casper van der Werf

Deelproject Elektrische IJveren

- Projectleider Casper van der Werf
- Inkopers Leo Snel/Tom Teijsse
- Interne medewerkers (o.a. technische dienst en bemanning via klankbordgroep)
- Externe adviseurs

Deelproject Laadinfrastructuur

- Projectleider Casper van der Werf
- Inkopers Leo Snel/Naomi van der Meij



Mededingingsprocedure met onderhandeling

Selectiefase

Inschrijven in twee stappen:

- Inschrijven in 2 fases: eerste inschrijving en vervolgens definitieve verbeterde inschrijving
- Voor eerste inschrijving consultatieronde: GVB zal toelichten wat zij verwacht, inschrijvers kunnen hun suggesties en ideeën toetsen bij GVB. Mogelijkheid tot stellen vragen via nota van inlichtingen. Let op het is mogelijk vragen vertrouwelijk te behandelen!
- Inschrijver dient zijn eerste inschrijving in
- GVB beoordeelt de inschrijvingen aan het beoordelingskader zoals dat in de gunningsleidraad is opgenomen.
- Op basis van de beoordeling worden de drie beste inschrijvers toegelaten tot de definitieve inschrijffase

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Definitieve inschrijffase

- Bij start van deze definitieve inschrijffase is er wederom een consultatieronde: GVB zal per inschrijver toelichten wat goed was en wat beter kan aan de 1^e inschrijving. Ook zal GVB zaken aangeven die zij mist of niet goed vindt aansluiten bij haar wensen. Inschrijvers kunnen hun suggesties en ideeën om hun inschrijving te verbeteren toetsen bij GVB. Er is opnieuw een mogelijkheid tot stellen vragen die het algemeen belang dienen via nota van inlichtingen. Let op het is mogelijk vragen vertrouwelijk te behandelen!
- Inschrijvers gaan hun inschrijving aanpassen en verbeteren en dienen deze in.
- Let op: definitieve inschrijving mag niet slechter/duurder zijn dan de eerste inschrijving anders is deze ongeldig!
- GVB beoordeelt de definitieve inschrijvingen aan het zelfde beoordelingskader zoals dat in de gunningsleidraad is opgenomen en bepaald wat de beste inschrijving is.
- GVB gunt de opdracht voorlopig, inschrijvers kunnen bezwaar maken en aansluitend wordt definitief gegund

Planning

Selectiefase

Uiterste datum voor de ontvangst van de Aanmeldingen

6 september 2022 14:00 uur

Opening ontvangen Aanmeldingen

6 september 2022 14:05 uur

Bekendmaking selectiebeslissing en afwijzingen

9 september 2022

Bezwaarperiode selectiefase

10 t/m 20 september 2022

De daaropvolgende consultatie en onderhandelingsfases verlopen op hoofdlijnen volgens onderstaande planning:

Eerste inschrijvingsfase

Publicatie uitnodiging tot inschrijving (gunningsleidraad)

23 september 2022

Schouw/startbijeenkomst

4 oktober 2022

Consultatiegesprekken

5 en 6 oktober 2022

Uiterste datum voor het stellen van vragen

eerste Nota van Inlichtingen

11 oktober 2022

Publicatie eerste Nota van Inlichtingen

18 oktober 2022

Uiterste datum voor het stellen van vragen

tweede Nota van Inlichtingen

28 oktober 2022

Publicatie tweede Nota van Inlichtingen

4 november 2022

Planning

Uiterste datum voor ontvangst van de eerste inschrijvingen

28 november 2022 13:00 uur

Beoordeling eerste inschrijvingen

29 november t/m 9 december 2022

Bekendmaking uitkomst Eerste Inschrijvingen en afwijzingen

12 december 2022

Bezwaarperiode eerste inschrijvingsfase (Alcatel)

13 t/m 23 december 2022

Definitieve inschrijvingsfase

Onderhandelingsronde (bespreken beoordelingen

Eerste Inschrijving en verbeteringen Gegadigden)

10 en 11 januari 2023

Uiterste datum voor het stellen van vragen

derde en laatste Nota van Inlichtingen

17 januari 2023

Publiceren derde en laatste Nota van Inlichtingen

24 januari 2023

Indienen Definitieve Inschrijving

20 februari 2023

Gunningsfase

Beoordelen en aanwijzing Geselecteerde inschrijver

21 t/m 27 februari 2023

Bezwaartermijn (Alcatel)

28 februari t/m 17 maart 2023

Verificatie en contract finalisering

28 februari t/m 22 maart 2023

Contractondertekening

Omstreeks 24 maart 2023

○ Vragen?

