

Algemene Inlichtingen N639

Groot Onderhoud kom Chaam

Provincie Noord-Brabant



05 oktober 2023

Agenda

Introductie Algemene Toelichting

Frank

– Voorstelronde

Frank

– Projectbeschrijving

Erik

– Toelichting ontwerp(opgave) en contract

Ward

– Toelichting EMVI

Ward

– (Aanbestedings)planning

Ward

Vragen

Frank


Projectbeschrijving kom Chaam

- Projectdoelstellingen:
 - *Veilig in stand houden N639*
 - *Technisch optimaal laten functioneren weggedeelte (10 jr)*
 - *Verbeteren oversteekbaarheid kom Chaam*
- Historie project
- Samenwerking gemeente en omgeving
- Meerjaren Uitvoeringsprogramma Chaam 2040
- Andere project Brabant Water en glasvezel





Toelichting ontwerp(opgave) en contract

- van gevel tot gevel
- centrum-gedeelte / buiten centrum-gedeelte
- trace grotendeels handhaven m.u.v. aansluiting Gilzerweg

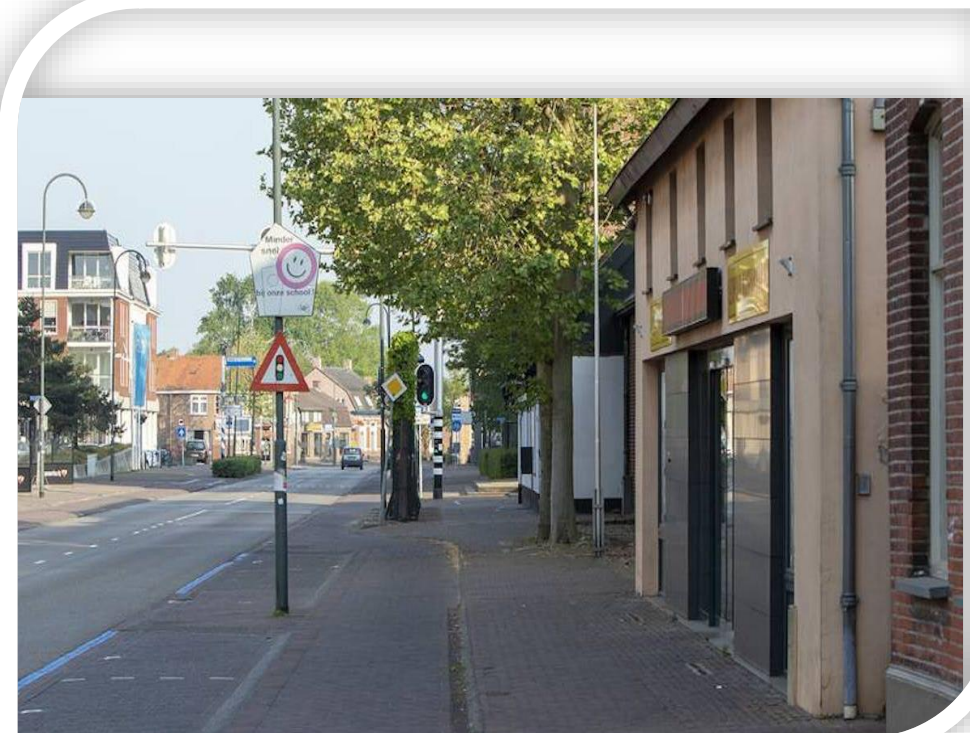

Toelichting ontwerp(opgave) en contract

- status referentieontwerp
- voorgeschreven keuze's
- Ontwerpopgave o.a.:
 - Detaillering (van referentieontwerp naar uitvoeringsontwerp)
 - Maatvoering (inpassing in situatie)
 - Optimalisatie zichtbaarheid oversteekplaatsen

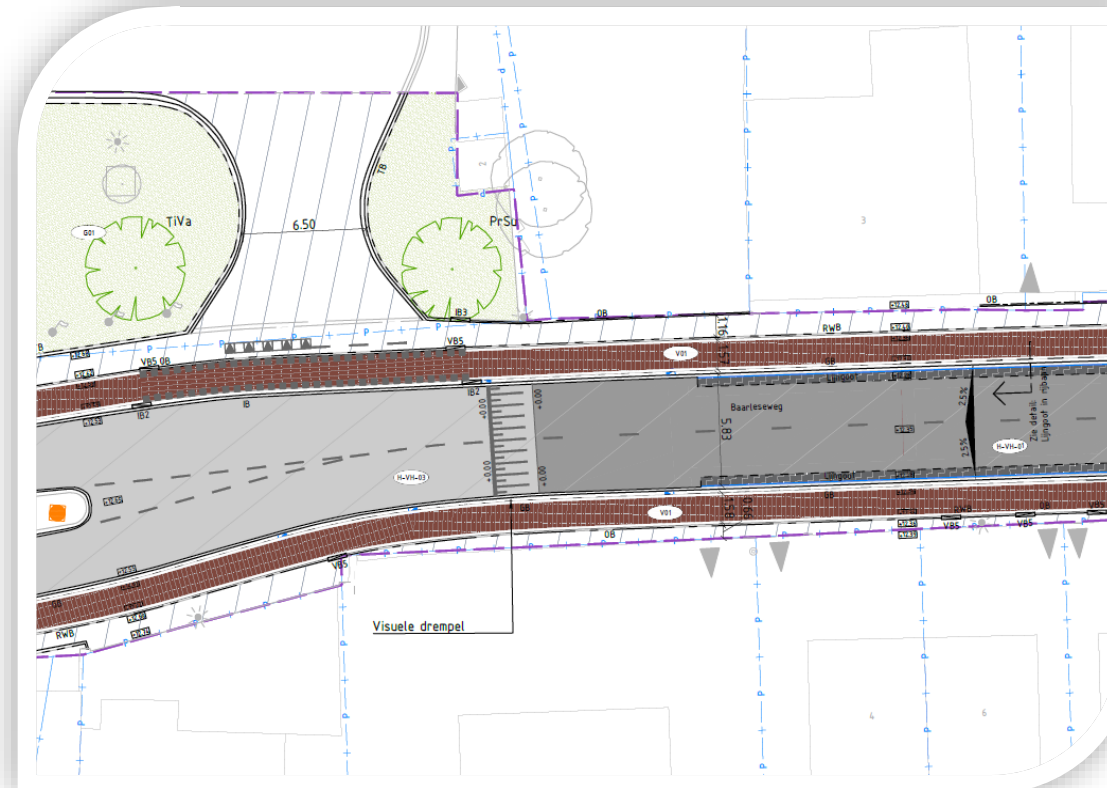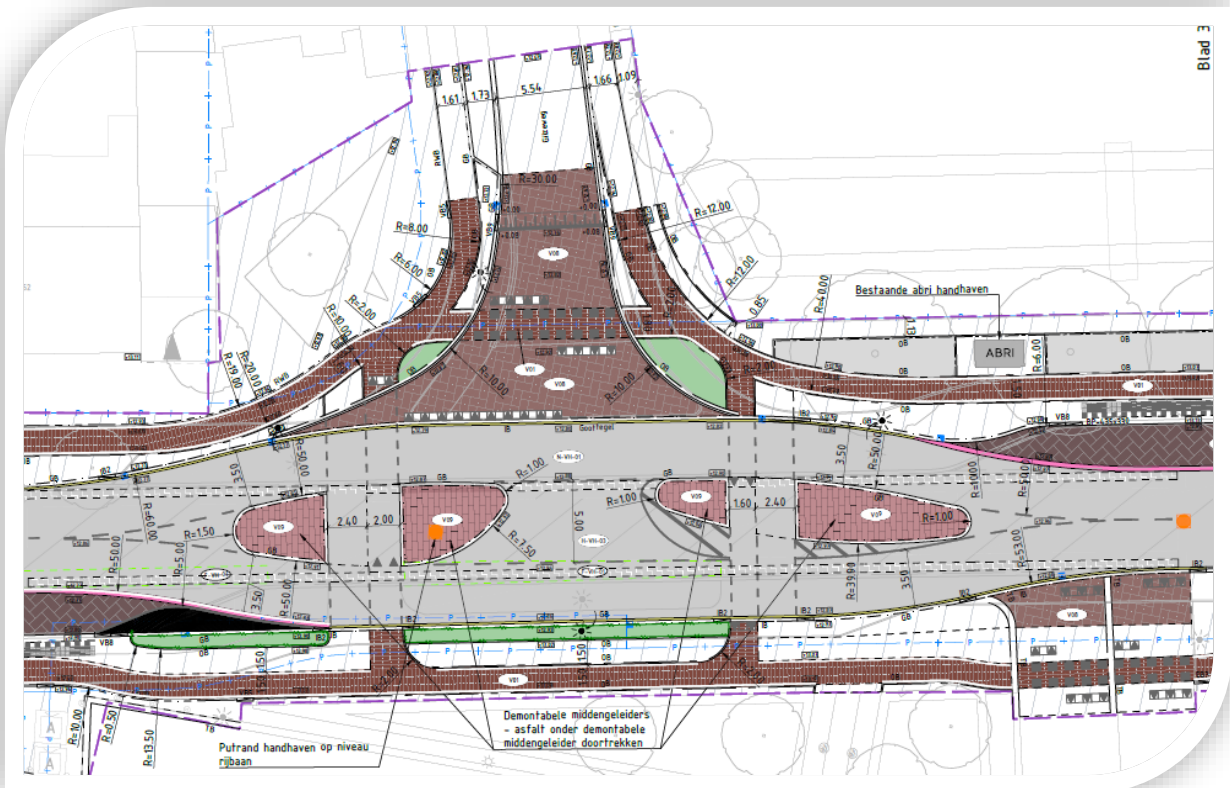

Toelichting ontwerp(opgave) en contract

– UAV-gc:

- Definitief Ontwerp naar Uitvoeringsontwerp
- Uitvoeren van conditioneringsonderzoeken om werk te realiseren
- Verzorgen van benodigde vergunningen en toestemmingen
- Realiseren van de werkzaamheden
- Afstemmen stakeholders om werk (technisch) te realiseren (o.a. Enexis)

SYS-0389	Putafdekkingen
Omschrijving	De nieuw toe te passen putafdekkingen dienen ronde boorputafdekkingen type 3223 RM VEPROMAX CROSS GRIP D400, of gelijkwaardig, te zijn welke na de asfalteringswerkzaamheden ingeboord dienen te worden.
Initiator	TAUW
Bovenliggende eis	<i>Geen</i>
Onderliggende eis	<i>Geen</i>

SYS-0070	Project Groot onderhoud N639 kom Chaam , Tijdelijk beheer tijdens uitvoering Werk
Omschrijving	De Opdrachtnemer dient gedurende de realisatie van het Werk het dagelijks beheer en onderhoud van de onderdelen die deel uitmaken van Project Groot onderhoud N639 kom Chaam en die binnen de werkgrens zijn gelegen te verzorgen, uitgezonderd calamiteiten, gladheidsbestrijding en bestrijding van ziekten en plagen.
Initiator	CMTO
Bovenliggende eis	SYS-0047
Onderliggende eis	<i>Geen</i>

Toelichting EMVI

Plan van Aanpak

K.1a Verkeersmanagement & communicatie (o.a. bijlage 02.08)

450.000EU

K.1b Planning

450.000EU

K.2 Omvang Milieukosten (MKI)

600.000EU

BPK-scoringstabel t.b.v. beoordeling Omvang Milieukosten	% van de maximale kwaliteitswaarde (KW)
MKI-waarde en/of gevraagde bijlagen zijn niet aanwezig	Uitsluiting
MKI-waarde tussen 100% en 75% van referentie MKI-waarde	0%
MKI-waarde tussen 75% en 25% van referentie MKI-waarde	Uitkomst formule
MKI-waarde tussen 25% en 0% van referentie MKI-waarde	100%

Scoringstabel	% van maximale score
Onvoldoende: Uw Inschrijving voldoet niet of voldoet op onderdelen niet aan de (sub)criteria.	Uitsluiting
Voldoende: In uw Inschrijving worden de (sub)criteria minimaal uitgewerkt en beantwoord. Er is geen meerwaarde aanwezig.	0
Ruim voldoende: In uw Inschrijving worden de (sub)criteria kwalitatief voldoende tot goed uitgewerkt en beantwoord en er is beperkte meerwaarde aanwezig.	60
Goed: In uw Inschrijving worden de (sub)criteria kwalitatief goed uitgewerkt en beantwoord en er is meerwaarde is aanwezig.	85
Zeer Goed: In uw Inschrijving worden alle (sub)criteria zeer goed en volledig uitgewerkt en beantwoord en er is veel meerwaarde aanwezig.	100




Toelichting EMVI

Plan van Aanpak

K.1a Verkeersmanagement & communicatie

K.1b Planning

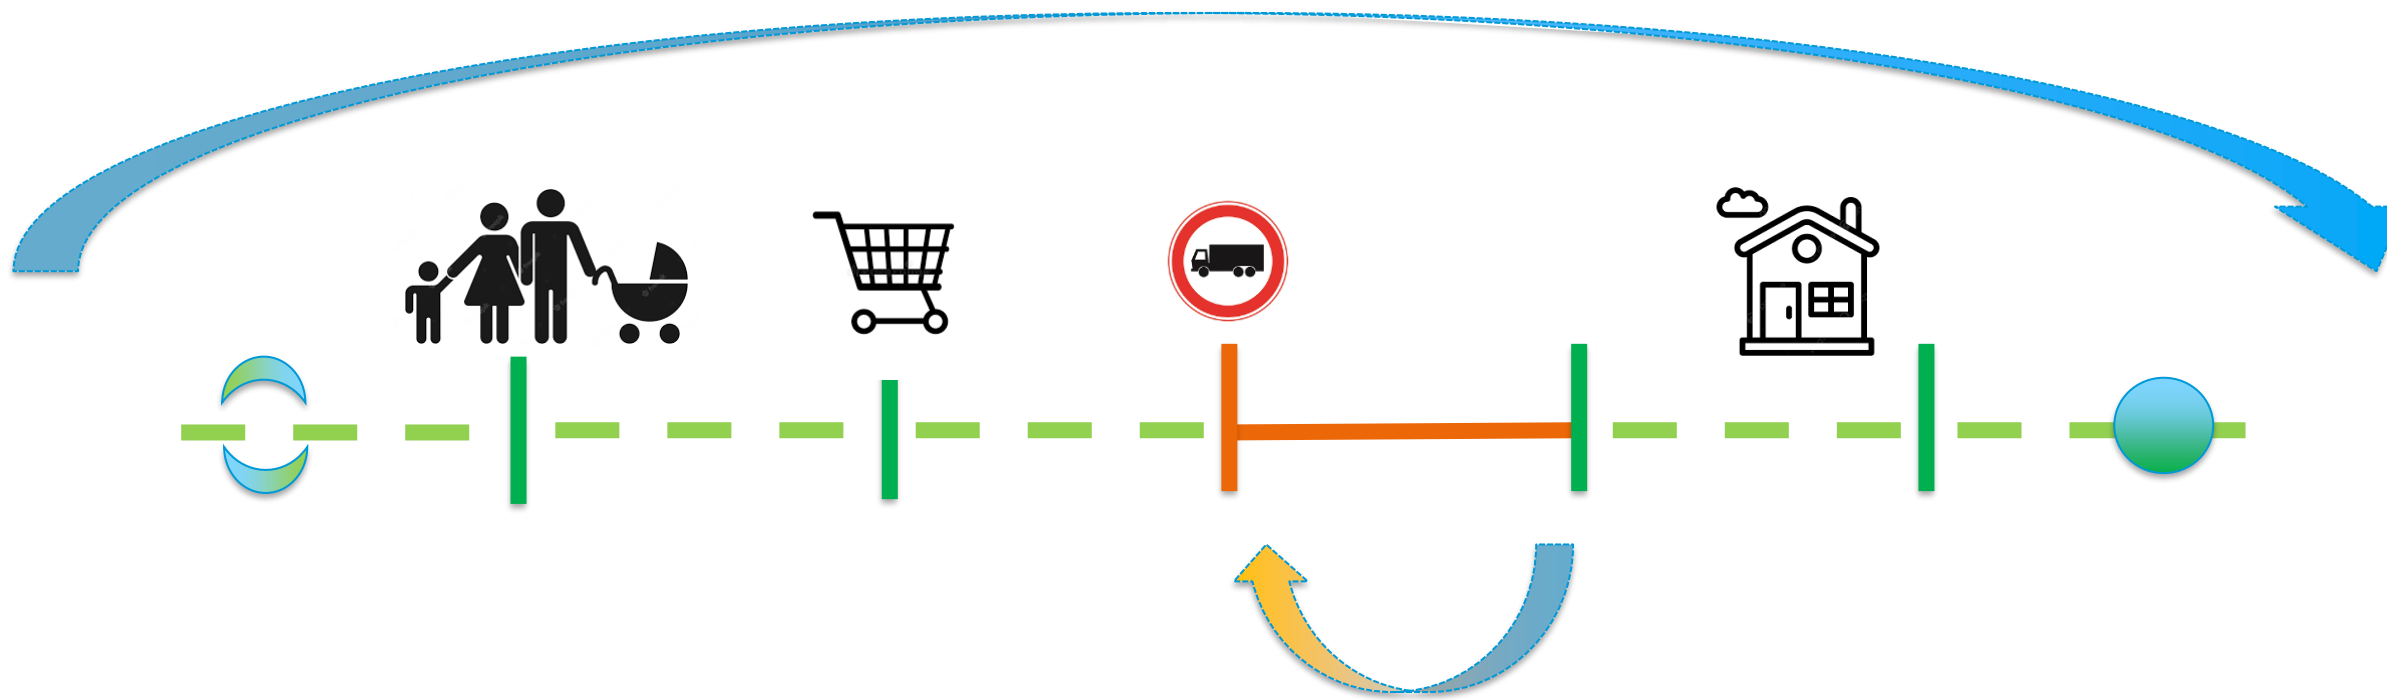

(Aanbestedings)planning

- | | |
|---------------|---------------------|
| – 23 oktober | 1 ^e NvI |
| – 20 november | 2 ^e NvI |
| – 12 januari | Indienen aanbieding |
| – 5 februari | Voorlopige gunning |
| – 27 februari | Definitieve gunning |

Uitvoeringsplanning:

- Acceptatietermijnen Annex III & IV
- Eisen faseringsnotitie bijlage 02.08
- Contracteisen
- Afstemming stakeholders



Vragen



**Bedankt voor uw aandacht
en
succes met de inschrijving**
