



Agenda

- Projectteam
- Doel van deze inkoop
- Tijdlijn aanbesteding
- Tijdlijn Project
- Totstandkoming Project
- Locaties
- Inschrijving
- Afronding



Projectteam

Naam	Rol
Guus Haarsma	(Vervangend) Contractmanager
Paul Jansen	Contractmanager
Manon van den Berg	Contract adviseur
Jens op het Veld	Technisch Manager
Paul van Langen	Adviseur Techniek
Marlies Vos	Senior inkoop
Jesse Eurlings	Adviseur inkoop



Doel van deze inkoop:

- Het doel van deze inkoop is om de fabricage en levering van 14 Stoney-schuiven (plus bijhorende rollenwagens) aan te besteden, als onderdeel van het overkoepelende project GRoot ONderhoud STuwen (GRONST). De nieuwe schuiven dienen toekomstbestendig te zijn waarmee de levensduur van de stuwen tot 2068 kan worden gegarandeerd. Hierdoor draagt deze inkoop bij aan het verzorgen van de water- en nautische veiligheid in Zuid-Nederland. Daarnaast zal deze inkoop de optie bevatten tot de fabricage en levering van 7 klepschuiven* die buiten het project GRONST vallen maar mogelijk onderdeel worden van GRONST II. Deze optie wordt opgenomen om zo bij aanstaande vervangingen (indien deze versneld uitgevoerd moeten worden) tijd en kosten te besparen door efficiëntere productie.
- *De stuw Borgharen functioneert door middel een scheepvaartschuif en klepschuiven en de stuw Lith functioneert door middel van klepschuiven. Deze stuwen zullen in de toekomst worden gerenoveerd. De opdracht daarvoor wordt door Rijkswaterstaat voorbereid en zal vervolgens worden aanbesteed.



Tijdlijn Aanbesteding

Activiteit	Datum
Inschrijvingsfase	
Eerste Inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere inlichtingen (Algemene inlichtingen)	08-05-2024
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	21-05-2024
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	04-06-2024
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	25-06-2024
Beoordelingsfase	
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	26-06-2024
Verzenden gunningsbeslissing	25-07-2024
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	09-09-2024
Verzenden opdracht	20-09-2024



Tijdljn Project

- Levering op 15 mei 2025 van:
2 Stoney-schuiven voor stuw Linne (midden);
2 Stoney-schuiven voor stuw Belfeld (landhoofd-zijde).
- Levering op 15 mei 2026 van:
2 Stoney-schuiven voor stuw Linne (Poiree-zijde);
2 Stoney-schuiven voor stuw Sambeek (Poiree-zijde).
- Levering op 15 mei 2027 van:
2 Stoney-schuiven voor stuw Roermond (Poiree-zijde);
2 Stoney-schuiven voor stuw Belfeld (Poiree-zijde).
- Levering op 15 mei 2028 van:
2 Stoney-schuiven voor stuw Roermond (landhoofd-zijde).



Terugblik/voorblik

Terugblik GRONST

- De stuwcomplexen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek naderen het einde van hun levensduur. Er bestaan risico's ten aanzien van veiligheid en beschikbaarheid (betrouwbaarheid) die niet middels regulier onderhoud te beheersen zijn.
- Hiervoor is het project GRONST in het leven geroepen. Dit is in april 2022 opdracht geven.
- Levensduur verlengend onderhoud om de levensduur van de objecten te verlengen tot en met 2035 als overbruggingsperiode tot Vervanging en/of Renovatie.

Vooruitblik 14+7


- Na uitnamen van schuiven bij stuw Roermond bleek de status van de huidige schuiven niet te voldoen om deze te conserveren waarmee een levensverlengend doel tot 2035 kan worden bereikt. Hierom is gekozen de bestaande schuiven te vernieuwen waardoor de levensduur wordt verlengt naar 2068.



Locaties

Stoney's 14 schuiven

Optioneel maximaal 7 stuks

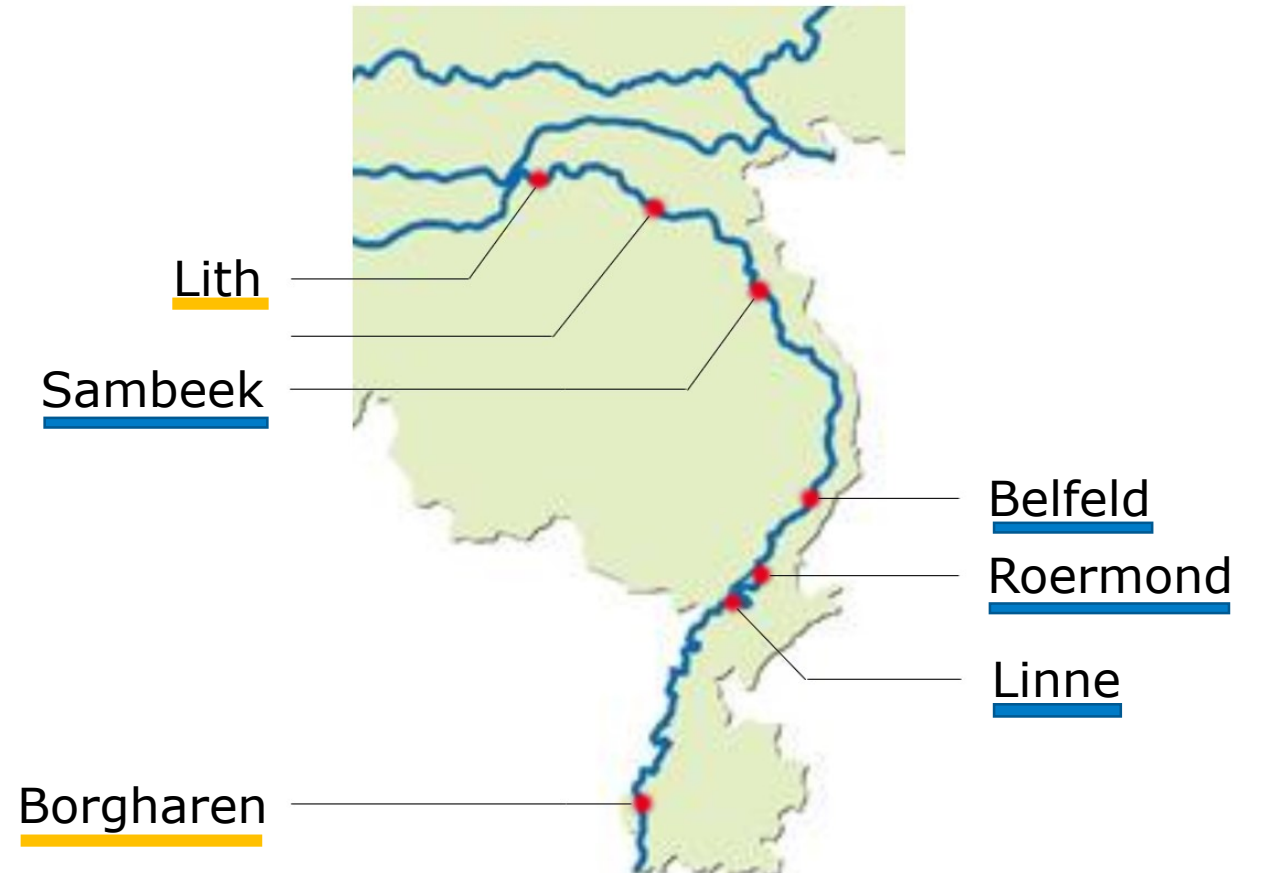



objecten:

- 1 set schuiven Linne (midden)
- 1 set schuiven Belfeld (landzijde)
- 1 set schuiven Linne (Poireezijde)
- 1 set schuiven Sambeek (Poireezijde)
- 2 sets schuiven Roermond (Poiree- en landzijde)
- 1 set schuiven Belfeld (Poireezijde)


Totaal 14

- En de optie tot levering van maximaal 7 stuks klepschuiven (Borgharen en Lith) waarvan één scheepsvaart opening.




Stoney stuw

BOVENSTROOMSCH AANZICHT.

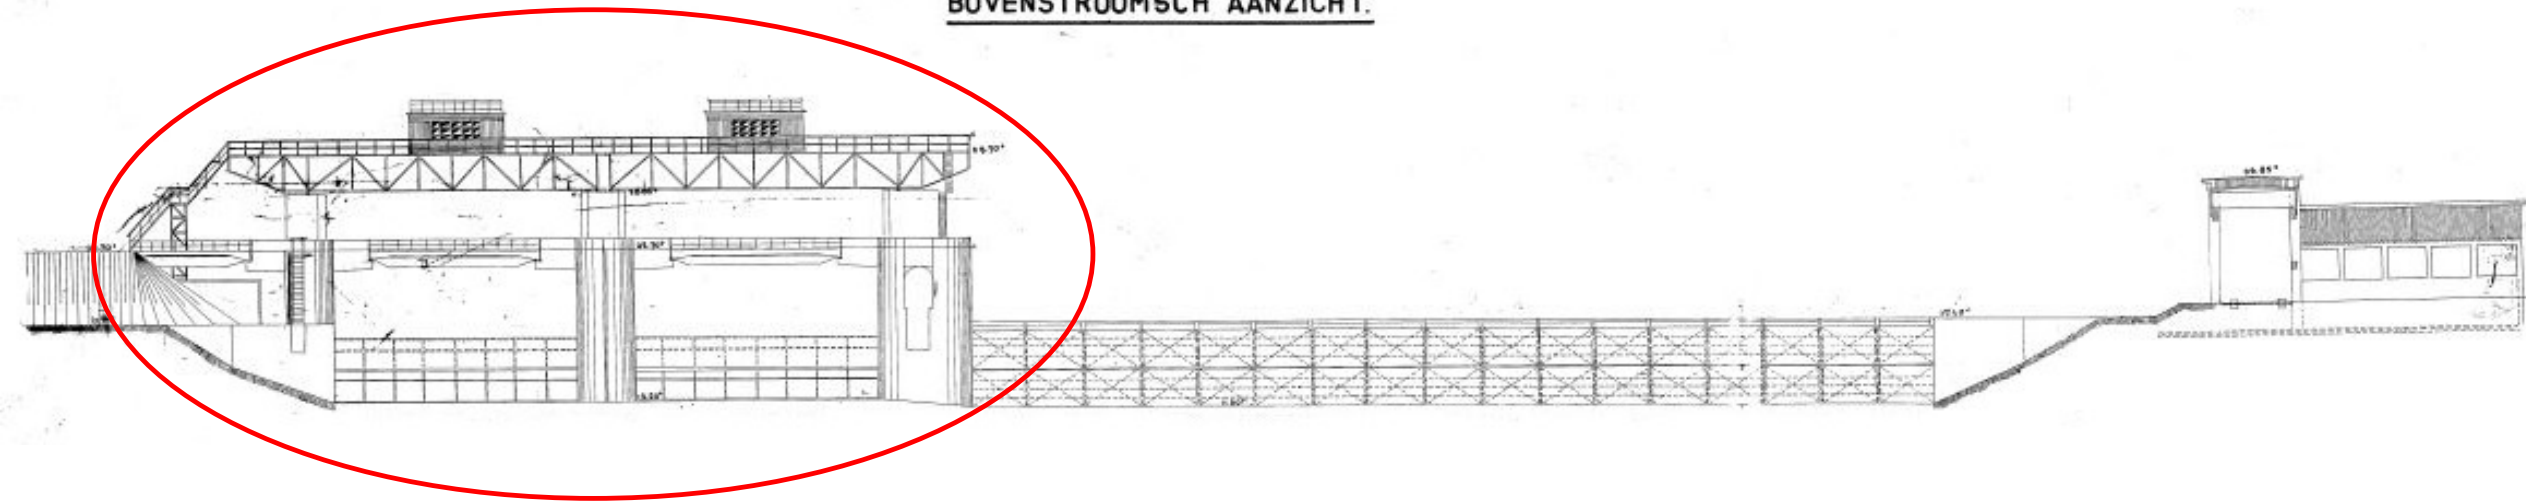



Stoney schuiven

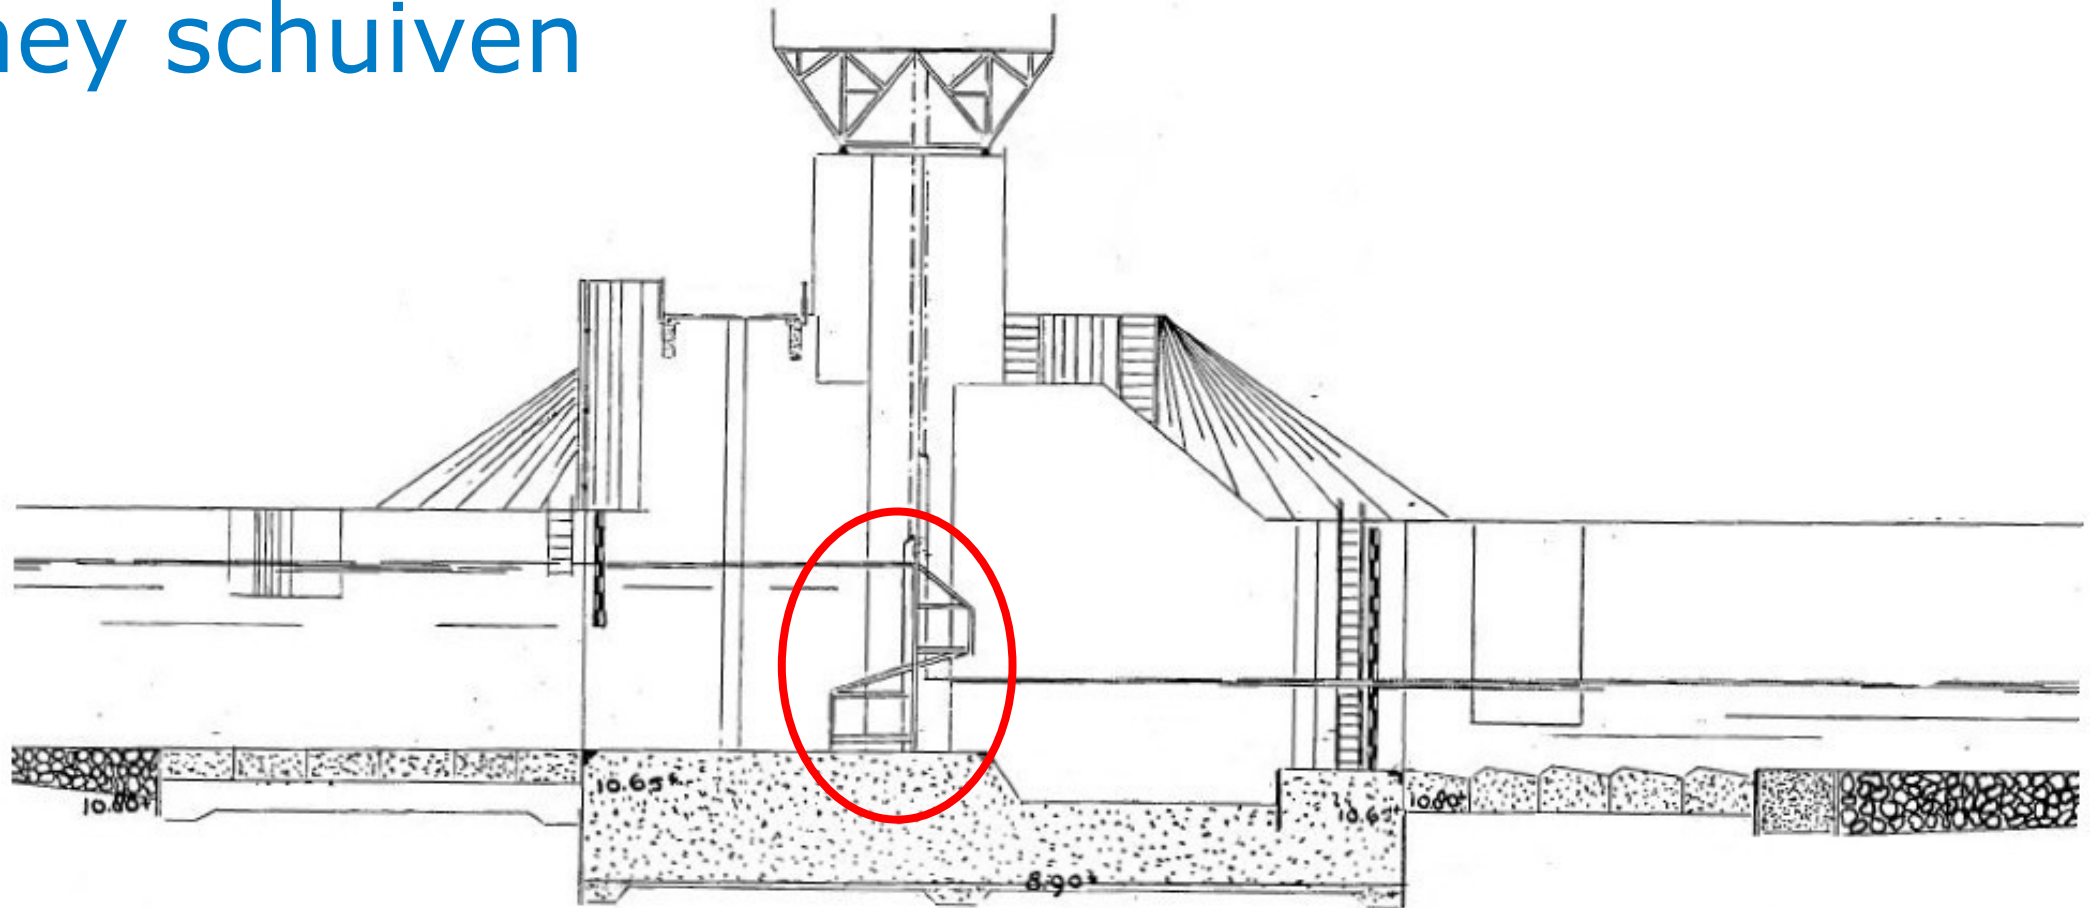



Algemeen Stoney afbeelding



Linne 1921



Roermond 1921



Belfeld 1924







Sambeek 1925



Detail Linne

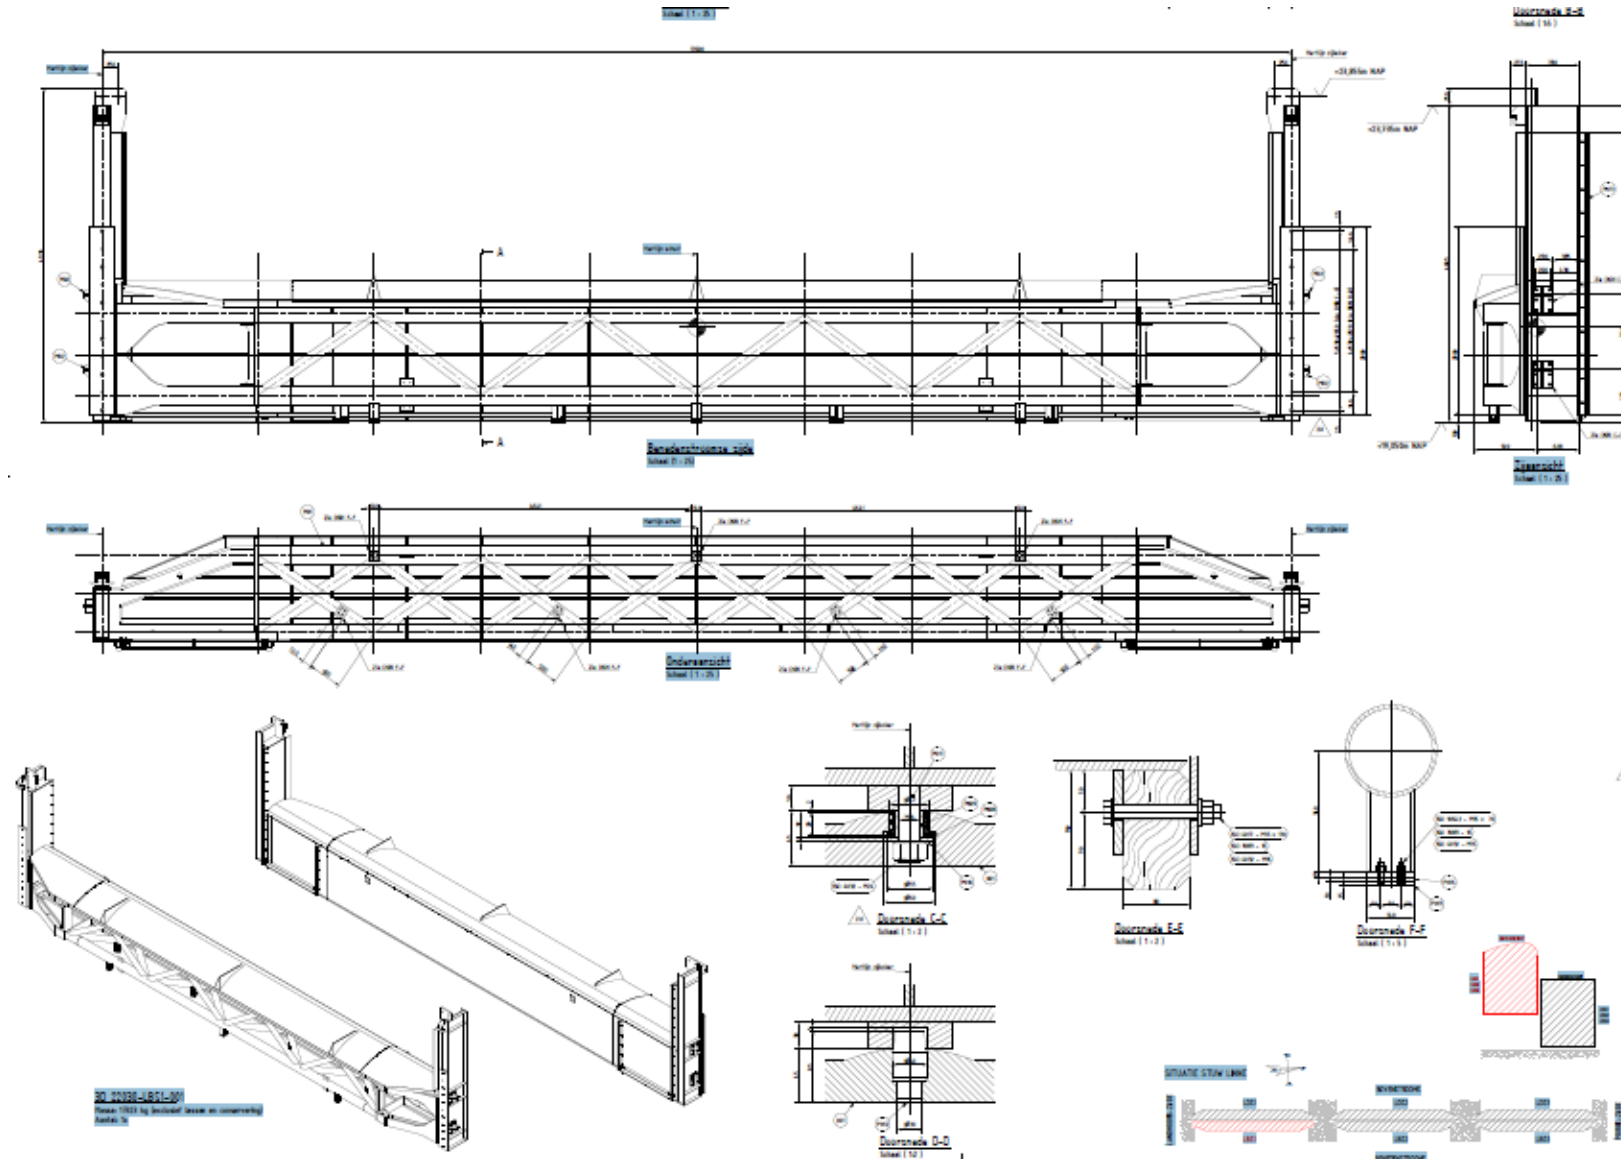

3D plaatje

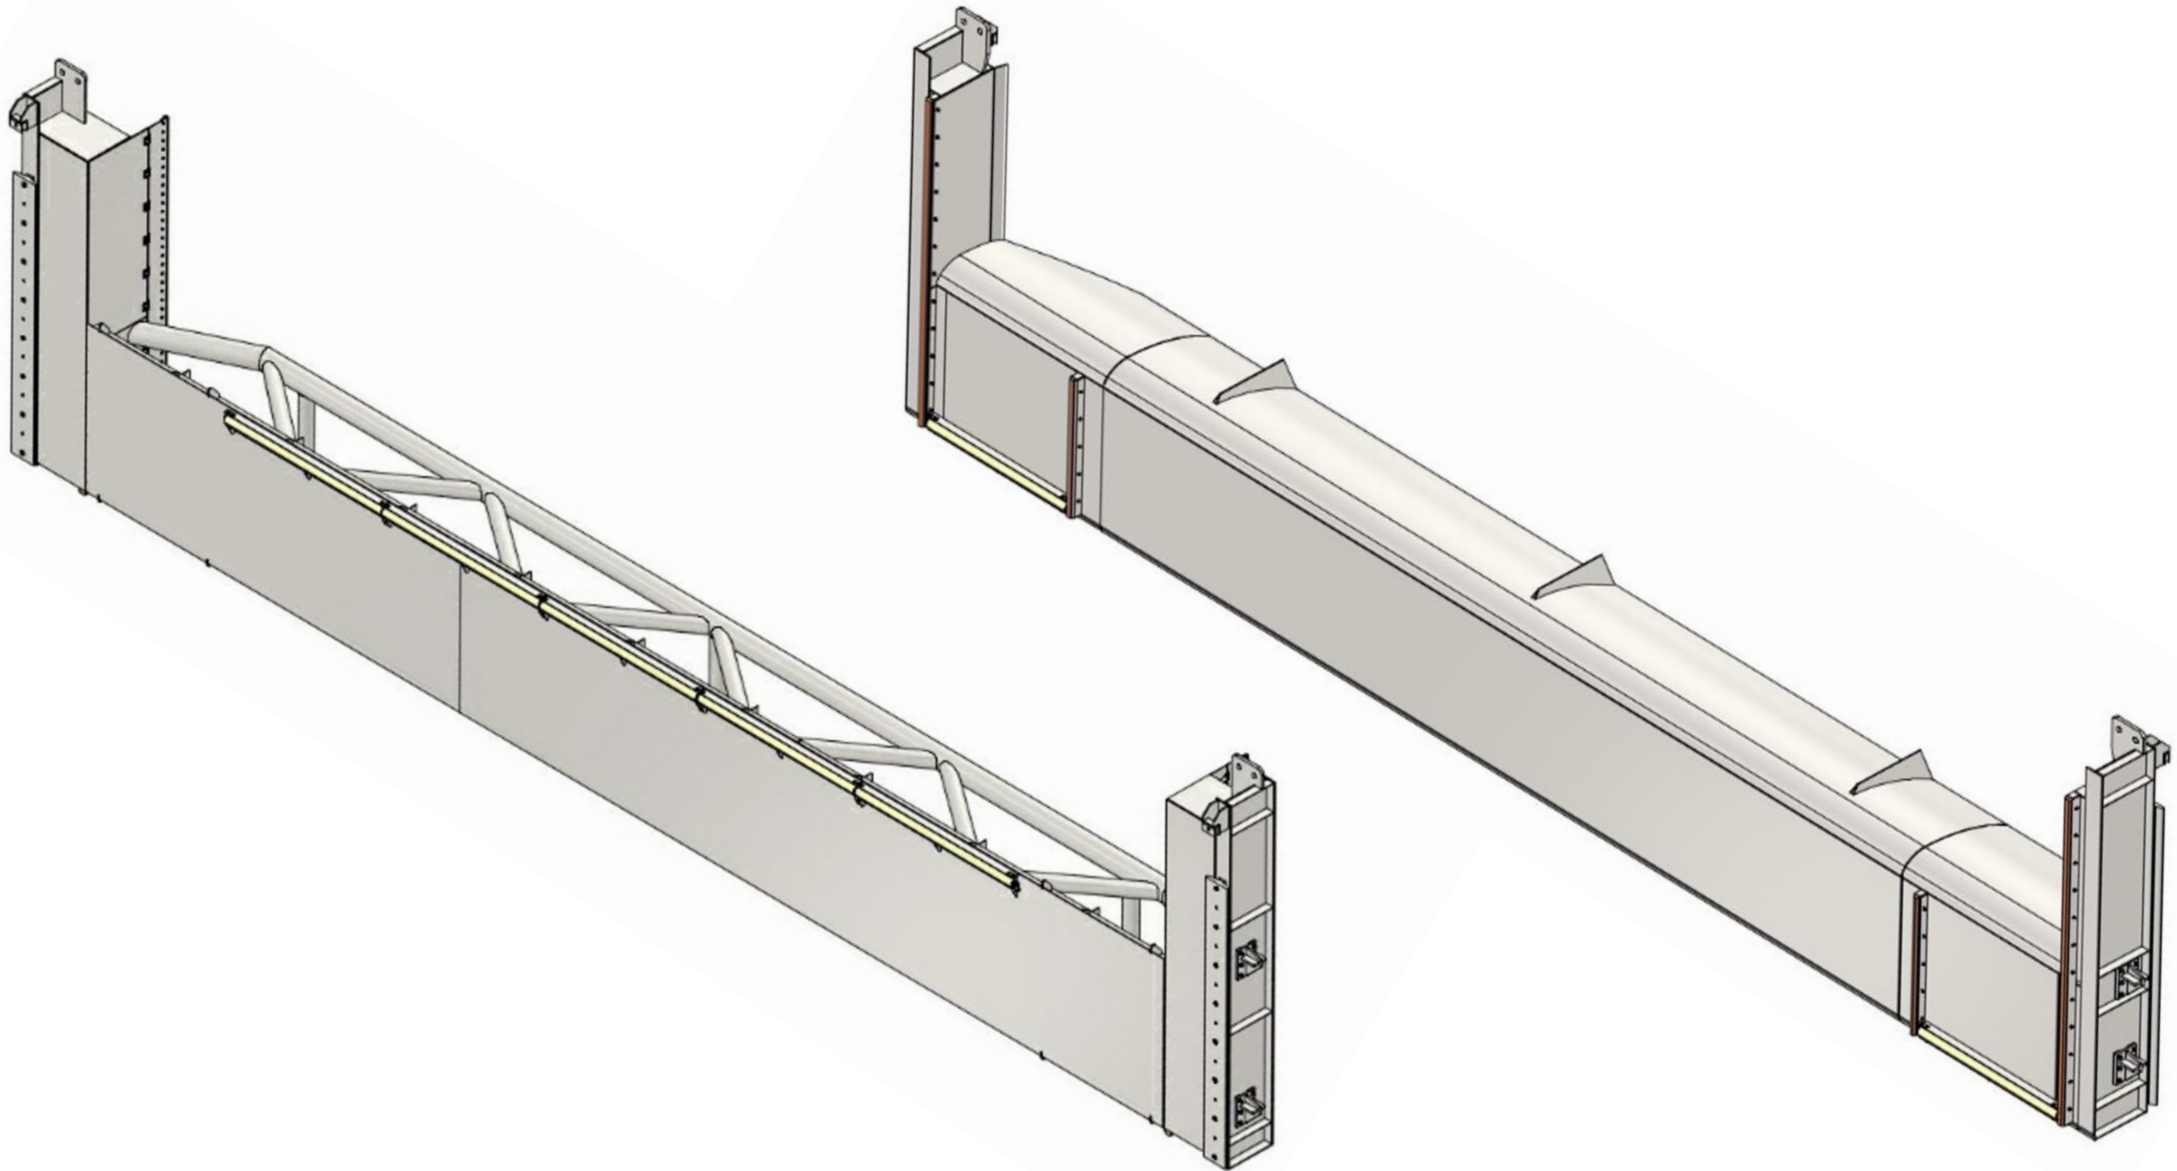



Optioneel locaties Borgharen en Lith

- Hiervoor zal het ontwerp parallel aan deze opdracht worden voorbereid

Borgharen 1928






Lith 1936



Klepstuw

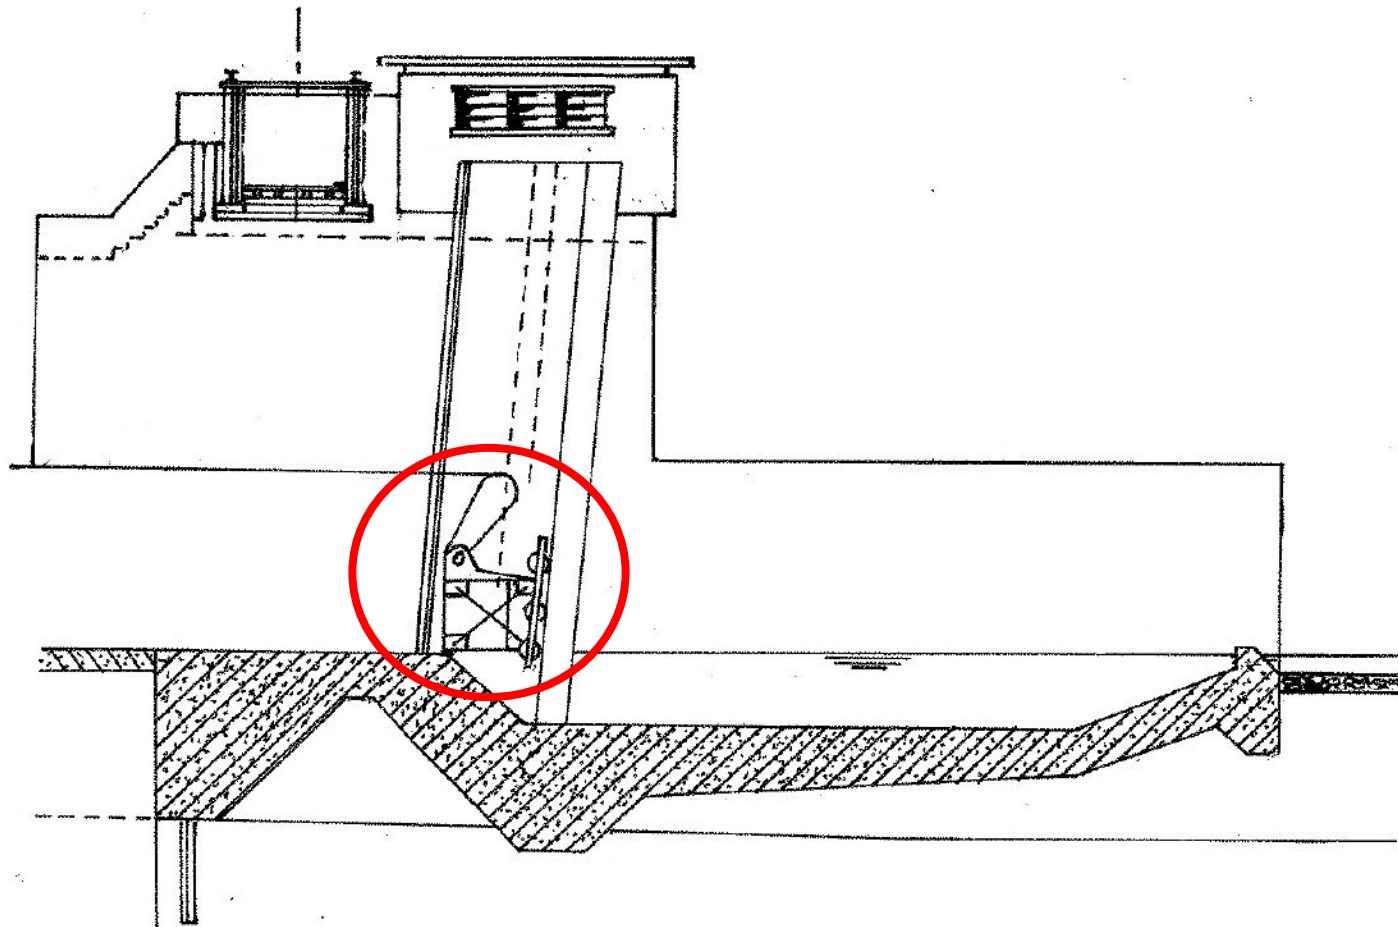



Inschrijvingen

Aan te leveren ter beoordeling:

1. Geschiktheidseisen (Conform bijlage D Aanbestedingsleidraad)
2. Plan van aanpak (BPKV)
SMART geformuleerde maatregelen
Beoordeling volgens M.A.R.K. methode
3. Concept staat van ontleding (Conform bijlage I)
4. MKI-W

Fictieve inschrijfsom



Beoordeling M.A.R.K.



[Inkoopbeleid Beste Prijs Kwaliteit Verhouding \(rijkswaterstaat.nl\)](http://rijkswaterstaat.nl)



Afronding

Vragen?
