

UITVOERINGSProtocol TELECOM (13 NOV 2012)

DE ONDERGETEKENDEN:

1. Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ing. C. Brandsen, hierna te noemen "Rijkswaterstaat" of "Projectuitvoerder"

en

ProRail B.V. ("ProRail"), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Moreelsepark 3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ir. P.E.M. Buck, hierna te noemen "ProRail" of "Projectuitvoerder";

hierna tezamen te noemen "Projectuitvoerders".

2. KPN B.V., statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te Den Haag aan het Maanplein 55 TP5/6.25 (2516 CK), rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. A.S. Veld;

en

De telecomaانبieders zoals opgenomen in bijlage 1, verenigd in de Groep Graafrechten, vertegenwoordigd door de heer F.P. Sickinghe, voorzitter;

en

De telecomaانبieders zoals opgenomen in bijlage 2, verenigd in de vereniging Nlkabel, gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door de heer R.P. van Esch, directeur;

hierna tezamen te noemen "Netbeheerders" en een ieder de "Netbeheerder".

Hierna tezamen te noemen "Partijen" en ieder een "Partij".

OVERWEGINGEN:

- a. De Projectuitvoerders verrichten regelmatig infrastructurele werkzaamheden aan hoofdwegen, waterwegen, waterkeringen en/of het spoor als gevolg waarvan maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels moeten worden genomen. Partijen treden in de praktijk in overleg om overeenstemming te bereiken over de te nemen maatregelen, de planning, de hoogte van de kosten en de kostenverdeling. Partijen streven ernaar het bereiken van onderlinge overeenstemming over de te nemen maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels en de kostenverdeling efficiënter en effectiever te laten plaatsvinden.
- b. Partijen beogen deze doelstelling te bereiken door in dit Uitvoeringsprotocol Telecom te komen tot heldere procesafspraken en menen dat een vaste werkwijze daaraan bijdraagt.
- c. Partijen streven ernaar elkaar te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van de te nemen maatregelen ten aanzien van de telecommunicatiekabels om de doorlooptijd van de te nemen maatregelen te versnellen.
- d. Partijen streven ernaar kostenbeperkend op te treden ten aanzien van de te nemen maatregelen.
- e. Partijen beogen afspraken te maken voor zowel de situatie dat overeenstemming bestaat over de vraag wie de kosten van maatregelen ten aanzien van de telecommunicatiekabels moet dragen als voor de situatie dat daarover (nog) geen overeenstemming bestaat.
- f. Partijen beogen een nadere uitwerking van hoofdstuk 5, meer in het bijzonder artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet overeen te komen. Dit Uitvoeringsprotocol Telecom laat de werking van Hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet en de daarin neergelegde rechten en verplichtingen dan ook onverlet.
- g. Partijen onderkennen dat de Projectuitvoerders bij de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten veelvuldig gebruik maken van innovatieve contracten, zoals Design en Construct ("D&C") en Design, Build, Finance and Maintain ("DBFM") contracten. Bij werken onder die contracten wordt het overgrote deel van de werkzaamheden overgelaten aan de aannemers die in opdracht van de Projectuitvoerders werken en komt aan de aannemers ten aanzien van het ontwerp van het werk de nodige vrijheid toe. Deze werkwijze leidt ertoe dat de Netbeheerders ten aanzien van de maatregelen veel te maken zullen hebben met opdrachtnemers van Projectuitvoerders. Dit geldt niet alleen voor het afstemmen van de technische werkzaamheden, maar ook voor de feitelijke uitvoering van de processtappen zoals omschreven in dit Uitvoeringsprotocol Telecom. Partijen onderkennen dat deze rolverdeling een nieuwe dynamiek met zich meebrengt die soms tot onduidelijkheid kan leiden, maar dat voorop staat dat Projectuitvoerders ook in die nieuwe rolverdeling de gedoogplichtige en de verzoeker als bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet zijn en verantwoordelijk blijven jegens de Netbeheerder.

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. DEFINITIES

- 1.1. **Definitief Ontwerp (“DO”)**: plan van de Netbeheerder waarin de definitieve Maatregel is omschreven en/of ingetekend.
- 1.2. **Informatiebrief**: brief van de Projectuitvoerder aan de Netbeheerder waarin het te realiseren Project en het Verzoek tot Maatregelen wordt aangekondigd, waarvan het model is opgenomen in bijlage 3.
- 1.3. **Kabel**: een kabel als bedoeld in artikel 1.1, onder z van de Telecommunicatiewet.
- 1.4. **Kosten**: de daadwerkelijk gemaakte kosten van de Netbeheerder en – in de situatie als bedoeld in artikel 4.2 onder a – van de Projectuitvoerder, die direct zijn gerelateerd aan de Maatregel.
- 1.5. **Maatregel**: het aanpassen, verplaatsen, verwijderen en/of beschermen van de Kabel en daarbij behorende werken als bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet.
- 1.6. **Netbeheerder**: een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 5.1 jo. artikel 1.1, onder i van de Telecommunicatiewet.
- 1.7. **Project**: samenstel van werkzaamheden dat verband houdt met de oprichting van gebouwen en/of de uitvoering van werken als bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet.
- 1.8. **Projectgebied**: gebied dat de percelen omvat waarbinnen de Projectuitvoerder gebouwen opricht of werken uitvoert als bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet.
- 1.9. **Projectovereenstemming Geschillen**: de overeenkomst voor de situatie dat de Projectuitvoerder en de Netbeheerder van mening verschillen over één of meer van de volgende aspecten: het DO, de Maatregel, de planning, de rechtspositie, de kostenverdeling, of de kostenraming waarvan het model is opgenomen in bijlage 8.
- 1.10. **Projectovereenstemming Nacalculatie**: de overeenkomst met een omschrijving van de Maatregel, de planning, het DO, de kostenraming en de kostenverdeling, waarvan het model is opgenomen in bijlage 5.
- 1.11. **Projectovereenstemming Vaste Prijs**: de overeenkomst met een omschrijving van de Maatregel, de planning, het DO, de vaste prijs en de kostenverdeling, waarvan het model is opgenomen in bijlage 6.
- 1.12. **Projectovereenstemming Vereenvoudigd**: de overeenkomst met een omschrijving van de Maatregel, de planning en het DO, waarvan het model is opgenomen in bijlage 7.
- 1.13. **Projectuitvoerder**: Rijkswaterstaat of ProRail.
- 1.14. **Verzoek tot Maatregelen (“VTM”)**: een verzoek tot het nemen van (een) Maatregel(en) als bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet, waarvan het model is opgenomen in bijlage 4.

- 1.15. **Voorlopig Ontwerp (“VO”)**: ontwerpplan van de Projectuitvoerder waarin de Maatregel in concept is omschreven en/of ingetekend.

2. REIKWIJDTE

- 2.1. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder stellen de Maatregel, de Kosten en de kostenverdeling vast aan de hand van het bepaalde in hoofdstuk 5, meer in het bijzonder artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet.
- 2.2. Dit Uitvoeringsprotocol Telecom is van toepassing op Projecten waarin ten tijde van de inwerkingtreding van het Uitvoeringsprotocol Telecom nog geen VTM aan de Netbeheerder is verstuurd. De in het Uitvoeringsprotocol Telecom neergelegde afspraken gelden ook voor de situatie dat de Projectuitvoerder de Netbeheerder een VTM stuurt en niet als gedoogplichtige wordt aangemerkt.
- 2.3. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder kunnen dit Uitvoeringsprotocol Telecom in onderlinge overeenstemming van toepassing verklaren op Projecten waarin ten tijde van de inwerkingtreding van het Uitvoeringsprotocol Telecom reeds een VTM is verstuurd.
- 2.4. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder kunnen dit Uitvoeringsprotocol Telecom in onderlinge overeenstemming van toepassing verklaren op Projecten die in samenwerking met andere (regionale) overheden worden gerealiseerd, mits de (regionale) overheden hiermee eveneens hebben ingestemd.
- 2.5. Het staat de Projectuitvoerder vrij een derde te machtigen de afspraken in dit Uitvoeringsprotocol Telecom namens de Projectuitvoerder uit te voeren. De Projectuitvoerder verstrekt de Netbeheerder een afschrift van de machtiging, opdat inzicht in de reikwijdte van de volmacht bestaat. De Projectovereenstemming wordt steeds door de Projectuitvoerder zelf ondertekend.
- 2.6. De Projectuitvoerders verplichten zich om via het contract de opdrachtnemers van Projectuitvoerders te laten werken conform dit Uitvoeringsprotocol Telecom.

3. VOOROVERLEG, VOORLOPIG ONTWERP EN VERZOEK TOT MAATREGELEN

- 3.1. De Projectuitvoerder neemt het initiatief tot een vooroverleg waarin de Projectuitvoerder en de Netbeheerder(s) gezamenlijk de bestaande situatie inventariseren en oplossingsrichtingen voor de Maatregel verkennen met het doel om tot een VO te komen. De Projectuitvoerder geeft voorzover mogelijk voorafgaand aan het vooroverleg schriftelijk inzicht in het Project, de planning en de ligging van de Kabel volgens het Kadaster (Klic).
- 3.2. Aanvullend op de wettelijke verplichtingen volgend uit de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten), meldt de Netbeheerder, als hij er wetenschap van heeft dat de informatie in het Kadaster (Klic) niet of niet volledig correct is, dit onverwijld aan de Projectuitvoerder en geeft de juiste ligging van de Kabel door aan de Projectuitvoerder.

- 3.3. De Projectuitvoerder stelt na het vooroverleg een VO op. Mocht de Projectuitvoerder hiertoe op basis van het vooroverleg nog niet in staat zijn, dan kan de Projectuitvoerder nadere informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het opstellen van een VO bij de Netbeheerder opvragen. De Netbeheerder verstrekt de nadere informatie.
- 3.4. De Netbeheerder is verantwoordelijk om zo nodig een gewijzigd tracé ten opzichte van het VO voor de Kabel te vinden. Voor zover mogelijk geeft de Projectuitvoerder een voorstel voor de plaats waar de Kabel naar kan worden verplaatst. De Projectuitvoerder zal zich, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden en bevoegdheden ligt, op verzoek van de Netbeheerder bij dreigende knelpunten ten aanzien van het verkrijgen van benodigde rechten en vergunningen, inspannen om een bijdrage te leveren aan het oplossen ervan.
- 3.5. De Projectuitvoerder zendt de Netbeheerder een VTM. Het VTM omvat in ieder geval een beschrijving van het Project, de planning van het Project, een omschrijving van de noodzaak van de Maatregel, de aard van het recht waarop de Projectuitvoerder zich beroept, ondersteund door bewijsstukken op grond waarvan hij als gedoogplichtige in de zin van artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet kan worden beschouwd, voor zover eigendom niet uit de kadastrale gegevens blijkt, een VO en een voorstel voor de kostenverdeling.
- 3.6. In het voorstel voor de kostenverdeling brengt de Projectuitvoerder, mede gelet op het bepaalde in artikel 2.2 laatste zin, tot uitdrukking voor welke percelen binnen het Projectgebied niet aan het bepaalde in artikel 5.8 Telecommunicatiewet is voldaan en hij de Kosten van de Maatregel draagt.
- 3.7. Wanneer de Projectuitvoerder nog geen gedoogplichtige is van (een deel van) het Projectgebied verstuurt de Projectuitvoerder voorafgaand aan het VTM de Informatiebrief. De Informatiebrief omvat een aankondiging van het te realiseren Project en een aankondiging van het VTM. De Informatiebrief bevat een weergave van de afspraken die in het vooroverleg zijn gemaakt op basis van het VO. De Informatiebrief omvat geen verplichting voor de Netbeheerder tot het nemen van Maatregelen.

4. DEFINITIEF ONTWERP EN KOSTENRAMING

- 4.1. Na ontvangst van het VO stelt de Netbeheerder tijdig een DO op, opdat de planning van het Project in de Informatiebrief en/of het VTM kan worden gerealiseerd en legt het DO voor aan de Projectuitvoerder.
- 4.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.1 kan in het DO worden opgenomen:
 - a) welke Maatregel of onderdeel van de Maatregel door de Projectuitvoerder wordt genomen in verband met de praktische uitvoerbaarheid of kostenefficiëntie. In de Projectovereenstemming wordt overeengekomen op welke wijze de Kosten worden verrekend;
 - b) welke werkzaamheden aanvullend door de Netbeheerder voor eigen rekening worden uitgevoerd en buiten de eventuele kostenvergoeding vallen, zoals capaciteitsvergroting.
- 4.3. Het DO maakt, na instemming van de Projectuitvoerder, onderdeel uit van de Projectovereenstemming.

- 4.4. Afwijkingen van de Maatregel in het DO na de vaststelling van de Projectovereenstemming die leiden tot een afwijking in de geraamde kosten zullen door de Netbeheerder en de Projectuitvoerder schriftelijk en gemotiveerd aan elkaar worden gemeld. De afwijking van de Maatregel zal worden toegevoegd aan het DO tenzij de Netbeheerder en de Projectuitvoerder anders overeenkomen. De verdeling van de Kosten die met de afwijking van de Maatregel is gemoeid, is neergelegd in artikel 7.4 en 7.5 van het Uitvoeringsprotocol Telecom.
- 4.5. De Netbeheerder stelt – uitgaande van het DO – conform bijlage 9 een kostenraming op, indien (een deel van) de Kosten voor rekening van de Projectuitvoerder komen of indien sprake is van een geschil over de kostenverdeling. De kostenraming en het DO worden aan de Projectuitvoerder voorgelegd.

5. PROJECTOVEREENSTEMMING EN KOSTENVERDELING

- 5.1. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder sluiten een Projectovereenstemming Nacalculatie, tenzij
- a) een Projectovereenstemming Vaste Prijs wordt overeengekomen;
 - b) een Projectovereenstemming Vereenvoudigd wordt overeengekomen;
 - c) een Projectovereenstemming Geschillen wordt overeengekomen;
 - d) geen overeenstemming wordt bereikt en artikel 9 inzake Geschillen wordt gevolgd.
- 5.2. De Projectovereenstemming wordt door de Projectuitvoerder en de Netbeheerder in beginsel voorafgaand aan de uitvoering van de Maatregel ondertekend, tenzij de Projectovereenstemming niet tijdig tot stand komt of een geschil bestaat.
- 5.3. In de Projectovereenstemming Nacalculatie of Vaste Prijs wordt door middel van de ondertekening vastgelegd dat in ieder geval overeenstemming bestaat over het DO, de Maatregel, de planning, de kostenraming of de vaste prijs en over het overzicht van de rechtsposities per perceel binnen het Projectgebied. Op basis hiervan wordt vastgesteld welk deel van de kosten, uitgedrukt in percentages, door de Projectuitvoerder wordt vergoed.
- 5.4. In de Projectovereenstemming Vereenvoudigd wordt door middel van ondertekening vastgelegd dat in ieder geval overeenstemming bestaat over het DO, de Maatregel, de planning en over het overzicht van de rechtsposities per perceel binnen het Projectgebied. Op basis hiervan wordt vastgesteld dat de Kosten volledig ten laste komen van de Netbeheerder.
- 5.5. In de Projectovereenstemming Geschillen wordt door middel van ondertekening vastgelegd over welke aspecten - DO, de Maatregel, de planning, de kostenraming, rechtspositie, kostenverdeling - overeenstemming bestaat en over welke van deze aspecten de Projectuitvoerder en de Netbeheerder van mening verschillen. De Projectovereenstemming Geschillen bevat tevens de (voorlopige) oplossing die de Projectuitvoerder en de Netbeheerder zijn overeengekomen.
- 5.6. De peildatum voor de vaststelling van de rechtsposities wordt gevormd door het moment waarop de Projectuitvoerder het VTM doet aan de Netbeheerder.

- 5.7. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder zijn verplicht wijzigingen of afwijkingen ten aanzien van de Projectovereenstemming onverwijld schriftelijk aan elkaar te melden.
- 5.8. Indien sprake is van een bundel Kabels, die aanwezig zijn op verschillende rechtsposities, kunnen de Projectuitvoerder en de Netbeheerder overeenkomen dat voor alle Kabels één kostenvergoedingpercentage wordt gehanteerd, waardoor gecombineerde behandeling mogelijk is.
- 5.9. Mocht geen Projectovereenstemming tot stand komen dan geldt de verplichting van de Netbeheerder om tijdig binnen de wettelijke termijn van artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet de in het VTM opgenomen Maatregel te nemen.

6. MAATREGEL EN PLANNING

- 6.1. De Netbeheerder voert de Maatregel uit met inachtneming van artikel 5.8, lid 6 van de Telecommunicatiewet of – indien een andere termijn overeengekomen is – de termijn in het VTM of de Projectovereenstemming.
- 6.2. De Netbeheerder stelt de Projectuitvoerder door middel van een schriftelijke startmelding uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden op de hoogte van het feit dat met de uitvoering van de Maatregel gestart zal worden.
- 6.3. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder zullen elkaar over en weer onverwijld schriftelijk informeren indien afwijkingen van de planning, zoals overeengekomen in de Projectovereenstemming, zijn te verwachten. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder zullen in overleg treden om de gevolgen hiervan voor de Projectuitvoerder en de Netbeheerder zoveel mogelijk te beperken.
- 6.4. De Netbeheerder stelt de Projectuitvoerder onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de Maatregel is afgerond, door middel van een schriftelijke gereedmelding op de hoogte van het feit dat de Maatregel is genomen.
- 6.5. De Projectuitvoerder is gerechtigd om tijdens en na afloop van de Maatregel de (voortgang van de) Maatregel te bezichtigen. De Netbeheerder verleent hieraan zijn medewerking.

7. KOSTEN

- 7.1. Indien de Netbeheerder en de Projectuitvoerder een Projectovereenstemming Nacalculatie of een Projectovereenstemming Geschillen zijn overeengekomen, wordt de definitieve kostenvergoeding op basis van de Kosten vastgesteld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
- 7.2. Indien de Netbeheerder en de Projectuitvoerder een Projectovereenstemming Vaste Prijs hebben gesloten, wordt de definitieve kostenvergoeding door de Netbeheerder en de Projectuitvoerder vooraf vastgelegd in bijlage 1 bij de Projectovereenstemming Vaste Prijs. De kostenvergoeding wordt bepaald op basis van het DO, de daarbij behorende begroting op basis van een vaste prijs en de vastgestelde percentages als bedoeld in artikel 5.3. Bij een kostenvergoeding op basis van een vaste prijs zijn de artikelen 7.4, 7.5 en 8 niet van toepassing.

- 7.3. Tot de Kosten behoren de interne personeelskosten van de Netbeheerder, direct verband houdend met de Maatregel, gerekend vanaf het VTM dan wel de Informatiebrief. De interne personeelskosten kunnen aan de hand van de in bijlage 10 opgenomen staffel worden vastgesteld. Indien er geen staffel is, worden de Kosten op basis van de werkelijke gemaakte kosten vastgesteld.
- 7.4. Afwijkingen van minder dan 10% van de geraamde kosten, met een maximum van EUR 15.000 per Projectovereenstemming, maken deel uit van de Kosten, tenzij de Projectuitvoerder en de Netbeheerder anders overeenkomen.
- 7.5. Over afwijkingen van meer dan 10% van de geraamde kosten of meer dan EUR 15.000 per Projectovereenstemming treden de Netbeheerder en de Projectuitvoerder in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg. Afwijkingen van meer dan 10% van de geraamde kosten of meer dan EUR 15.000 per Projectovereenstemming maken, uitsluitend na goedkeuring van de Projectuitvoerder en de Netbeheerder, deel uit van de Kosten.
- 7.6. De Netbeheerder zal de Projectuitvoerder onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van tariefwijzigingen van de kosten als bedoeld in artikel 7.3. Deze tariefwijzigingen (inclusief eventuele prijsindexering) kunnen worden meegenomen in Projecten, mits de Projectuitvoerder het nieuwe tarief heeft goedgekeurd. De Netbeheerder zal de Projectuitvoerder onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de geraamde kosten van ontwerp en begeleiding en uitvoerings- en materiaalkosten wijzigen als gevolg van tariefwijzigingen (inclusief eventuele prijsindexering) bij de (onder)aannemer van de Netbeheerder. Wijzigingen kunnen worden meegenomen in Projecten, mits de Projectuitvoerder de nieuwe geraamde kosten heeft goedgekeurd.
- 7.7. De extra kosten voortvloeiend uit wijzigingen na het VO, op verzoek van c.q. initiatief van de Projectuitvoerder komen voor rekening van de Projectuitvoerder, ongeacht de rechtspositie. De extra kosten voortvloeiend uit wijzigingen na het VO, op verzoek c.q. initiatief van de Netbeheerder komen voor rekening van de Netbeheerder, ongeacht de rechtspositie. Onder de in dit lid genoemde extra kosten wordt expliciet niet verstaan de mogelijke meerkosten van de Maatregel zelf ten opzichte van het (oorspronkelijke) VO.
- 7.8. De door de Projectuitvoerder te betalen vergoeding voor de Maatregel wordt beschouwd als een schadevergoeding. BTW komt niet voor vergoeding in aanmerking.
- 7.9. Een Kabel en de kabelmaterialen die bij de Maatregel vrijkomen zijn en blijven in eigendom van de Netbeheerder.

8. EINDSPECIFICATIE

- 8.1. De Netbeheerder overlegt met het oog op de vaststelling van de definitieve kostenvergoeding als bedoeld in artikel 8.7 binnen 12 maanden na afloop van de melding als bedoeld in artikel 6.4 een eindspecificatie aan de Projectuitvoerder. De Projectuitvoerder verstuurt aan de Netbeheerder een schriftelijk rappel indien de Netbeheerder niet binnen deze termijn een eindspecificatie heeft ingediend of de ingediende eindspecificatie onvoldoende is onderbouwd of gespecificeerd. Daarbij wordt de Netbeheerder een nieuwe termijn gesteld waarbinnen de eindspecificatie dan wel de nadere onderbouwing ingediend moet worden. Indien de Netbeheerder, ook na het verstrijken van de rappeltermijn, geen eindspecificatie heeft ingediend of de eindspecificatie niet of niet voldoende specificeert of onderbouwt, is de Projectuitvoerder bevoegd om de definitieve kostenvergoeding vast te stellen op 70% van de schadevergoeding op basis van de door de Projectuitvoerder geraamde kosten.
- 8.2. De eindspecificatie wordt conform bijlage 4 bij de Projectovereenstemming Nacalculatie resp. de Projectovereenstemming Geschillen opgesteld. In de eindspecificatie dienen de Kosten door de Netbeheerder inzichtelijk gemaakt te worden aan de hand van de documentenlijst als bedoeld in bijlage 5 bij de Projectovereenstemming Nacalculatie resp. de Projectovereenstemming Geschillen.
- 8.3. De Projectuitvoerder beoordeelt of de eindspecificatie voldoet aan de eisen van indiening, zoals vastgelegd in de Projectovereenstemming Nacalculatie of de Projectovereenstemming Geschillen. Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoekt de Projectuitvoerder de Netbeheerder alsnog de benodigde informatie te verstrekken.
- 8.4. De Projectuitvoerder stuurt na ontvangst van een volledige eindspecificatie binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging.
- 8.5. De Projectuitvoerder beoordeelt vervolgens, gelet op het bepaalde in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet en dit Uitvoeringsprotocol Telecom, of de eindspecificatie akkoord is.
- 8.6. In aanvulling op de gegevens zoals verstrekt op basis van artikel 8.3, verstrekt de Netbeheerder de Projectuitvoerder op diens verzoek informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de beoordeling van de Kosten of de eindspecificatie. Daaronder wordt mede begrepen informatie over het door de Netbeheerder gehanteerde stelsel van bedrijfsregels en management control systems. Een verzoek om aanvullende informatie schort de termijn van artikel 8.9 op tot de dag dat de Projectuitvoerder de aanvullende informatie heeft ontvangen.
- 8.7. Indien de Projectuitvoerder de eindspecificatie akkoord heeft bevonden, stelt de Projectuitvoerder de definitieve kostenvergoeding vast. De Projectuitvoerder doet hierover binnen drie maanden na ontvangst van een volledige eindspecificatie schriftelijk mededeling aan de Netbeheerder. Bij akkoord verzoekt de Projectuitvoerder de Netbeheerder om een credit- c.q. een eindfactuur.

- 8.8. Indien de Netbeheerder en de Projectuitvoerder binnen zes maanden na ontvangst van een volledige eindspecificatie geen overeenstemming over de eindspecificatie hebben bereikt, is artikel 9 van toepassing. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder kunnen aanspraak maken op de betaling van wettelijke rente, te rekenen vanaf zes maanden na indiening van de eindspecificatie, over het te veel respectievelijk te weinig betaalde.
- 8.9. Indien de Projectuitvoerder nalaat binnen drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 8.4 te reageren zal de eindspecificatie als goedgekeurd beschouwd worden. Artikel 8.7 is dan niet van toepassing. De Netbeheerder stuurt op basis van de overlegde eindspecificatie een credit- cq. eindfactuur aan de Projectuitvoerder.
- 8.10. De Netbeheerder overlegt op verzoek van de Projectuitvoerder bij de eindspecificatie een accountantsverklaring ingeval de Kosten een bedrag van EUR 50.000 overschrijden bij de Projectovereenstemming. De kosten voor deze accountantsverklaring komen voor vergoeding in aanmerking.

9. GESCHILLEN

- 9.1. Indien tussen Partijen een geschil ontstaat over de interpretatie, de uitvoering van dit Uitvoeringsprotocol Telecom, de op basis van dit Uitvoeringsprotocol Telecom vastgestelde documenten en Projectovereenstemmingen en/of indien in het geheel geen Projectovereenstemming tot stand komt, geldt de volgende procedure:
- a) Degene die meent dat een geschil bestaat, meldt dit onverwijld schriftelijk aan de andere Partij;
 - b) Partijen treden dan per omgaande in overleg en spannen zich in om te komen tot een minnelijke oplossing van het betreffende geschil;
 - c) indien Partijen binnen zes weken geen minnelijke oplossing hebben bereikt, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde instanties, te weten het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en/of de burgerlijke rechter.
 - d) Wanneer naar het oordeel van een Partij spoed is geboden, geldt de in sub c genoemde termijn van zes weken niet.

10. OVERIGE BEPALINGEN

- 10.1. Indien één of meer van de artikelen in dit Uitvoeringsprotocol Telecom nietig is of in strijd blijkt te zijn met de Telecommunicatiewet of jurisprudentie waarin deze artikelen worden uitgelegd, zullen Partijen met elkaar in overleg treden en bevorderen dat de betreffende artikelen vervangen wordt(en) door artikelen die daarmee niet in strijd zijn. De overige artikelen van dit Uitvoeringsprotocol Telecom blijven in een dergelijke situatie onverkort van kracht.

- 10.2. Partijen zullen informatie die zij van elkaar verkrijgen in het kader van de uitvoering van dit Uitvoeringsprotocol Telecom en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden niet aan derden openbaren, zulks onverminderd het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur of andere verplichtingen tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
- 10.3. Dit Uitvoeringsprotocol Telecom treedt in werking op de dag van ondertekening door Partijen en heeft een looptijd van twee jaar. Partijen hebben de intentie om het Uitvoeringsprotocol Telecom nadien te verlengen.
- 10.4. Partijen zullen dit Uitvoeringsprotocol Telecom evalueren en controleren op overeenstemming met hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet na verloop van 18 maanden na ondertekening van dit Uitvoeringsprotocol Telecom of zoveel eerder als daartoe aanleiding is op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak op grond van de Telecommunicatiewet, of een wijziging van de Telecommunicatiewet.
- 10.5. De evaluatie resulteert in een conclusie over de ervaringen met de gemaakte werkafspraken, mogelijke knelpunten en verbeterpunten. De verbeterpunten of gesignaleerde tegenstrijdigheden met hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet kunnen, na onderlinge overeenstemming tussen Partijen, tot wijziging van de bepalingen in dit Uitvoeringsprotocol Telecom leiden. Na de evaluatie als bedoeld in artikel 10.4 onder b van dit Uitvoeringsprotocol Telecom beslissen Partijen eenstemmig of de looptijd van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt verlengd voor een nader te bepalen periode.
- 10.6. Indien Partijen niet tot verlenging besluiten danwel geen overeenstemming bereiken over verlenging worden Projecten waarin gedurende de looptijd van de overeenkomst reeds een VTM is verzonden, conform de afspraken in het Uitvoeringsprotocol Telecom afgewikkeld.
- 10.7. Een Netbeheerder of Projectuitvoerder is bevoegd het Uitvoeringsprotocol Telecom eenzijdig op te zeggen. Voor eenzijdige opzegging dient de desbetreffende Netbeheerder of Projectuitvoerder de overige Netbeheerder(s) en Projectuitvoerder(s) hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met in achtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Bij beëindiging behoudt het Uitvoeringsprotocol Telecom zijn werking voor Projecten waarvoor reeds een VTM is verstuurd. Indien een Netbeheerder of Projectuitvoerder opzegt, blijft het Uitvoeringsprotocol Telecom van toepassing ten aanzien van de overige Netbeheerder(s) en/of Projectuitvoerder(s).
- 10.8. Op het Uitvoeringsprotocol Telecom en de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van een Projectovereenstemming is Nederlands recht van toepassing.
- 10.9. De bijlagen maken onderdeel uit van het Uitvoeringsprotocol Telecom. Bij tegenstrijdigheid tussen de bijlagen en de artikelen van dit Uitvoeringsprotocol Telecom treden Partijen in overleg, gericht op de wijziging van de tekst van het Uitvoeringsprotocol Telecom en/of de bijlagen. In de tussentijd prevaleert de tekst van het Uitvoeringsprotocol Telecom.

Aldus overeengekomen te Utrecht en getekend op 13 november 2012,

De Staat der Nederlanden
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
DG Rijkswaterstaat
De heer ing. C. Brandsen

ProRail B.V.
De heer ir. P.E.M. Buck

KPN B.V.
Mevrouw drs. A.S. Veld

Voorzitter Groep Graafrechten
De heer F.P. Sickinghe

Directeur Nlkabel
De heer R.P. van Esch

Bijlagen

1. Lijst Telecomaanbieders verenigd in de Groep Graafrechten
2. Lijst Telecomaanbieders verenigd in Nlkabel
3. Model Informatiebrief
4. Model Verzoek tot Maatregelen
5. Model Projectovereenstemming Nacalculatie
6. Model Projectovereenstemming Vaste Prijs
7. Model Projectovereenstemming Vereenvoudigd
8. Model Projectovereenstemming Geschillen
9. Model kostenraming
10. Staffel interne personeelskosten Telecomaanbieders

BIJLAGE 1, LEDEN VAN DE GROEP GRAAFRECHTEN

1. UPC Nederland B.V.
2. Ziggo B.V.
3. Level 3 Communications B.V.
4. i21 Netherlands B.V. (Interoute)
5. BT Nederland B.V.
6. Tele2 Nederland B.V.
7. Reggefiber B.V.
8. Verizon Nederland B.V.
9. CIF Operator B.V.
10. Eurofiber B.V.
11. euNetworks B.V.

BIJLAGE 2, LEDEN VAN NLKABEL

1. Compenz Media Services B.V.
2. Stichting Centrale Antenne-Inrichting Bleiswijk
3. Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo
4. Stichting C.A.I. Harderwijk
5. Stichting Centrale Antenne Inrichting Hendrik-Ido-Ambacht
6. CAIW Holding B.V.
7. Stichting Centraal Antenne Systeem Hilvarenbeek
8. Cogas Kabel N.V.
9. Delta Kabelcomfort Netten B.V.
10. Gemeente Edam-Volendam
11. N.V. Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland
12. Kabeltex B.V.
13. Kabeltelevisie Waalre B.V.
14. Stichting Kabeltelevisie Pijnacker
15. Stichting Kabelnet Veendam
16. UPC Nederland B.V.
17. Ziggo N.V.

BIJLAGE 3, MODEL INFORMATIEBRIEF

als bedoeld in artikel 1.2 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Datum		Behandeld door
Ons kenmerk		Telefoonnummer
Onderwerp	Informatie inzake het nemen van maatregelen ten behoeve van objectcode	Faxnummer
		E-mail

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van de **xxxxx** is het noodzakelijk gebleken dat er nabij xxxxxxx (tussen **km xxx en km xxxx van de xxx**) ten aanzien van een telecommunicatiekabel van **uw bedrijf** maatregelen moeten worden genomen. Het betreft de kabel(s) met de objectcode(s) **XXXXXX**.

Bovengenoemde kabel is gelegen binnen de projectgrenzen **[of: Tracégrenzen]** van de **xxxx (project/weg noemen)**. Voorzover de kabel is gelegen binnen de project **[of tracé]**grenzen is het noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden zodat de werkzaamheden van Rijkswaterstaat /Prorail niet gehinderd worden door (de ligging van) uw kabel(s).

[EN OPTIONEEL]

Voorzover de kabel is gelegen buiten de project **[of: tracé]**grenzen, is er geen noodzaak tot het nemen van maatregelen vanwege de aanleg van de (water)weg/ het spoor. Wel kan het voor u technisch gezien noodzakelijk zijn dat ook verlegging buiten deze grenzen plaatsvindt.

Tijdens het vooroverleg d.d. xx-xx-xxxx heb ik u reeds geïnformeerd over het Project. Het Voorlopig Ontwerp (VO) d.d. xx-xx-xxxx (versie xx)¹ bevat een ontwerpplan waarin de Maatregel in concept is omschreven.

Bij deze wil ik u informeren over de stappen die nog gezet moeten worden vóór de uitvoering van de maatregelen gereed is. Daarbij stel ik de volgende taakverdeling voor.

Activiteiten	Uitvoering	Goedkeuring
Opstellen definitief ontwerp gebaseerd op voornoemd Voorlopig Ontwerp	naam netbeheerder	Rijkswaterstaat/ ProRail
Opstellen planning	naam netbeheerder/ Rijkswaterstaat/ ProRail	n.v.t.
Opstellen kostenraming per objectcode conform bijlage 1 bij model-projectovereenstemming	naam netbeheerder	Rijkswaterstaat/ ProRail

¹ Voor zover nodig wordt het AVO nader gespecificeerd

Versturen formeel verzoek tot het nemen van maatregelen (VTM)	Rijkswaterstaat/ ProRail	n.v.t.
Aanvragen benodigde vergunningen/ onthefingen/toestemmingen en dergelijke	naam netbeheerder	n.v.t.
Opstellen projectovereenstemming, inclusief gegevens rechtspositie en berekening kostenvergoeding conform bijlage 2 van de model- projectovereenstemming	Rijkswaterstaat/ ProRail	naam netbeheerder
Nemen van maatregelen, inclusief startmelding en gereedmelding	naam netbeheerder en/of opdrachtnemer Rijkswaterstaat/ ProRail	Rijkswaterstaat/ ProRail
(voorzover van toepassing) Werkelijk gemaakte kosten aantonen	naam netbeheerder en/of opdrachtnemer Rijkswaterstaat/ ProRail	Rijkswaterstaat/ ProRail

Met het oog op de uitvoering van het Project dient de Maatregel uiterlijk xx-xx-20xx gereed te zijn. Met inachtneming van de termijn zoals genoemd in artikel 5.8, lid 6 van de Telecommunicatiewet zal ik u tijdig het formele verzoek tot het nemen van maatregelen doen toekomen.

Vergunningen

Optie 1 Rijkswaterstaat

Voor **de nieuw te leggen / het nemen van maatregelen aan de** telecommunicatiekabels binnen beheergebied van de Minister van Infrastructuur en Milieu dient een vergunning op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en/of Waterwet aangevraagd te worden. Deze vergunning dient voor aanvang van de werkzaamheden verleend te zijn. Uw aanvraag hiertoe kunt u richten aan: **XXX**

En/of

Deze vergunning kunt u aanvragen via het digitale loket op de Internetsite van Rijkswaterstaat (<https://vergunningen.rws.nl/vergunningen>).

Optie 2 ProRail

Voor **de nieuw te leggen / het nemen van maatregelen aan de** telecommunicatiekabels binnen beheergebied van **ProRail** dient een vergunning ex **artikel 19 Spoorwegwet** aangevraagd te worden. Deze vergunning dient voor de aanvang van de werkzaamheden verleend te zijn. Uw aanvraag hiertoe kunt u richten aan: **XXX**

Bijgaand treft u hiervoor de "Handleiding vergunningaanvragen" aan. Wij verzoeken u in de vergunningaanvraag de objectcode(s) te vermelden. Bij het verlenen van de nieuwe vergunning zal de eventuele bestaande vergunning worden ingetrokken middels een intrekkingbesluit.

Afsluiting

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen van technische aard dan kunt u contact opnemen met xxxx. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met xxxx.

[ondertekening]

Bijlagen: - Voorlopig Ontwerp

BIJLAGE 4, MODEL VTM TELECOM

als bedoeld in artikel 1.14 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Datum		Behandeld door
Ons kenmerk		Telefoonnummer
Onderwerp	Verzoek tot het nemen van maatregelen	Faxnummer
		E-mail

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van de **xxxxxx** is het noodzakelijk gebleken dat er **xxxxx** (tussen **km xxx en km xxxx van de xxxx**)² ten aanzien van een telecommunicatiekabel van **uw bedrijf** maatregelen moeten worden genomen. Het betreft de kabel(s) met de objectcode(s) **xxxxxx**.

Ik heb u hierover reeds geïnformeerd tijdens het vooroverleg d.d. xx-xx-xxxx (en in mijn Informatiebrief d.d. **xx-xx-xxxx** (kenmerk **xxxxx**)).³ Conform artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet en onder verwijzing naar het Uitvoeringsprotocol Telecom doe ik u hierbij het formele verzoek tot het nemen van maatregelen ten aanzien van bovengenoemde kabel(s) van uw bedrijf toekomen. De Maatregel is uitgewerkt in het Voorlopig Ontwerp (VO) d.d. xx-xx-xxxx (als bijlage bij deze brief gevoegd).

Planning

Optie A

Met het oog op de uitvoering van het Project dient de Maatregel uiterlijk xx-xx-xxxx gereed te zijn. Ik informeerde u hierover reeds in tijdens het vooroverleg en in mijn Informatiebrief.⁴

Optie B

De Netbeheerder voert de Maatregel uit met inachtneming van artikel 5.8, lid 6 van de Telecommunicatiewet of – indien een andere termijn overeengekomen is – de termijn die in de nog af te sluiten Projectovereenstemming zal worden opgenomen.

² Voor zover nodig, wordt de locatie van de werkzaamheden nader gespecificeerd

³ Indien geen Informatiebrief is verstuurd, wordt alleen verwezen naar het vooroverleg.

⁴ Indien geen Informatiebrief is verstuurd, wordt alleen verwezen naar het vooroverleg.

Kosten

Bij deze brief treft u een voorstel aan voor de kostenverdeling van de Maatregel en een overzicht van de rechtsposities per perceel binnen het Projectgebied. Hieruit blijkt naar het oordeel van Rijkswaterstaat/ProRail, dat

Optie 1

Rijkswaterstaat/ProRail 100% gedoogplichtige is van de percelen waarin de Kabel van uw bedrijf is gelegen. (Voor de onderbouwing daarvan verwijs ik naar de bijlagen.⁵) Gelet hierop kan een kostenraming als bedoeld in artikel 4.5 van het Uitvoeringsprotocol achterwege blijven en stel ik voor een Projectovereenstemming Vereenvoudigd te sluiten, tenzij u van mening bent dat een deel van de Kosten voor rekening van Rijkswaterstaat/ProRail komen. Of;

Optie 2

Rijkswaterstaat/ProRail geen gedoogplichtige is en dat alle kosten voor rekening van Rijkswaterstaat/ProRail komen. Of;

Optie 3

Rijkswaterstaat/ProRail voor een percentage van xx% gedoogplichtige is van de percelen waarin de Kabel van uw bedrijf is gelegen. (Voor de onderbouwing daarvan verwijs ik naar de bijlagen.)⁶

Verdere afspraken

Met het oog op het bereiken van overeenstemming over de Maatregel en de kostenverdeling ontvang ik graag, overeenkomstig artikel 4 van het Uitvoeringsprotocol, een Definitief Ontwerp en (voor zover van toepassing) een kostenraming.

Verder verzoek ik u vriendelijk mij, binnen twee weken, een schriftelijke bevestiging te sturen van de ontvangst van deze brief, met de mededeling dat u zult aanvangen met het opstellen van het Definitief Ontwerp, (voor zover van toepassing) een kostenraming en de (voorbereidingen voor) de uitvoering van de Maatregel.

Na ontvangst van het Definitief Ontwerp en de kostenraming wordt, conform artikel 5 van het Uitvoeringsprotocol, een Projectovereenstemming gesloten. Partijen treden daarover nader in overleg.

⁵ Bijlagen worden alleen bijgevoegd, indien de Projectuitvoerder van opvatting is gedoogplichtige te zijn in de zin van artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet, maar geen eigenaar is van (een deel van) de percelen. Daarbij kan worden gedacht aan een kopie van de huurovereenkomst, onderbouwing van beheer idzv de Wbr/Spw ect.

⁶ Bijlagen worden alleen bijgevoegd, indien de Projectuitvoerder van opvatting is gedoogplichtige te zijn in de zin van artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet, maar geen eigenaar is van (een deel van) de percelen. Daarbij kan worden gedacht aan een onderbouwing van beheer idzv de Wbr/Waterwet/Spw en zakelijke rechten.

Vergunningen⁷

Optie 1 Rijkswaterstaat

Voor **de nieuw te leggen / het nemen van maatregelen aan de** telecommunicatiekabels binnen beheergebied van de Minister van Infrastructuur en Milieu dient een vergunning op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en/of Waterwet aangevraagd te worden. Deze vergunning dient voor aanvang van de werkzaamheden verleend te zijn. Uw aanvraag hiertoe kunt u richten aan: **XXX En/of**

Deze vergunning kunt u aanvragen via het digitale loket op de Internetsite van Rijkswaterstaat (<https://vergunningen.rws.nl/vergunningen>).

Optie 2 ProRail

Voor **de nieuw te leggen / het nemen van maatregelen aan de** telecommunicatiekabels binnen beheergebied van **ProRail** dient een vergunning ex **artikel 19 Spoorwegwet** aangevraagd te worden. Deze vergunning dient voor de aanvang van de werkzaamheden verleend te zijn. Uw aanvraag hiertoe kunt u richten aan: **XXX**

Bijgaand treft u hiervoor de “Handleiding vergunningaanvragen” aan. Wij verzoeken u in de vergunningaanvraag de objectcode(s) te vermelden. Bij het verlenen van de nieuwe vergunning zal de eventuele bestaande vergunning worden ingetrokken middels een intrekkingbesluit.

Afsluiting

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met xxxxxxxx.

[ondertekening]

Bijlagen: - Voorlopig Ontwerp
- Kostenverdelingsvoorstel(len)
- Onderbouwing rechtspositie

⁷ Tekst inzake vergunningen alleen opnemen indien geen infobrief is verzonden waarin dit reeds is opgenomen

BIJLAGE 5, **MODEL**-PROJECTOVEREENSTEMMING

Projectovereenstemming Nacalculatie

als bedoeld in artikel 1.10 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Aanduiding Project:

Contract betreffende:

Opdrachtnummer:

Crediteurennummer:

De ondergetekenden:

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van Rijkswaterstaat [relevante regio] , hierna verder te noemen: **"Projectuitvoerder"**.

OF

ProRail B.V. ("ProRail"), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Moreelsepark 3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [heer/mevrouw], hierna te noemen **"Projectuitvoerder"**;

en

[naam netbeheerder], gevestigd te....., kantoorhoudende op het adres:.....te, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam].....[functie], hierna te noemen **"Netbeheerder"**,

Hierna tezamen te noemen "Partijen" en ieder een "Partij".

Overwegingen:

- De Netbeheerder en de Projectuitvoerder zijn een Uitvoeringsprotocol Telecom overeengekomen, waarin procesafspraken zijn neergelegd om tot overeenstemming te komen over de te nemen maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels met het oog op de uitvoering van een Project van Projectuitvoerder.
- De Projectuitvoerder heeft de Netbeheerder op (kenmerk) onder verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet en het Uitvoeringsprotocol Telecom een VTM gestuurd met het verzoek de Maatregel te treffen. De maatregel betreft: het verwijderen/ het verplaatsen/ het treffen van beschermende maatregelen ten aanzien van de kabels.
- De Maatregel is nodig voor de uitvoering van het Project.
- Partijen beogen in deze Projectovereenstemming nadere afspraken te maken over het Definitief Ontwerp, de Maatregel, de planning, de kostenraming en de vaststelling van de rechtsposities per perceel.
- De Kosten van de Maatregel worden op basis van Nacalculatie vastgesteld.

Partijen zijn het volgende overeen gekomen:

Artikel 1 Werking

Deze Projectovereenstemming, met bijbehorende bijlagen, wordt beheerst door het Uitvoeringsprotocol Telecom en hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 2 Maatregel en Planning

- Lid 1 De Netbeheerder neemt de Maatregel (zoals bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet)⁸ ten aanzien van de Kabel(s) met objectcode(s), gelegen nabij de⁹, conform het Definitief Ontwerp van (versie)¹⁰ en tekening van¹¹. Het Definitief Ontwerp met de tekening(en) is opgenomen in bijlage 3 van deze Projectovereenstemming.
- Lid 2 De Netbeheerder voert de Maatregel uiterlijk vóór uit.
- Lid 3 De Netbeheerder doet de startmelding als bedoeld in artikel 6.2 van het Uitvoeringsprotocol Telecom uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden.
- Lid 4 De schriftelijke startmelding en gereedmelding als bedoeld in artikel 6 van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt door de Netbeheerder gericht aan:
Organisatie:
Ter attentie van:
Adres:
Postcode:
Plaats:
- Lid 5 Binnen 30 werkdagen na gereedmelding overlegt de Netbeheerder aan de Projectuitvoerder de as built-gegevens tenzij Partijen onderling anders overeenkomen.

Artikel 3 Kostenraming op basis van nacalculatie

- Lid 1 De Kosten van de Maatregel zijn door de Netbeheerder geraamd op €, (exclusief BTW). De kostenraming d.d. is als bijlage 1 bij deze Projectovereenstemming gevoegd.
- Lid 2 De Netbeheerder is verplicht de Maatregel uit te (laten) voeren tegen marktconforme kosten. Onder marktconforme kosten wordt verstaan: kosten zoals deze door een onderneming onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt.

⁸ Verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet wordt uitsluitend opgenomen, indien de Projectuitvoerder (deels) gedoogplichtige is.

⁹ Aanduiding van de locatie van de Maatregel.

¹⁰ Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

¹¹ Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

- Lid 3 Over afwijkingen van meer dan 10% van de totale geraamde kosten of meer dan € 15.000 per Projectovereenstemming treden de Netbeheerder en de Projectuitvoerder in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg. Afwijkingen van meer dan 10% van de geraamde kosten of meer dan € 15.000 per Projectovereenstemming maken, uitsluitend na goedkeuring van de Projectuitvoerder en de Netbeheerder, deel uit van de Kosten.

Artikel 4 Kostenverdeling

- Lid 1 Partijen stellen, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet, vast welke Kosten van de Maatregel voor rekening van de Netbeheerder blijven en welke Kosten voor rekening van de Projectuitvoerder worden gebracht.
- Lid 2 Op basis van het overzicht van de rechtsposities per perceel (bijlage 2) komen Partijen overeen dat % van de Kosten voor rekening van de Netbeheerder komt en % van de Kosten voor rekening van de Projectuitvoerder.
- Lid 3 Op grond van de kostenraming van de Netbeheerder zou deze kostenverdeling neerkomen op een kostenvergoeding door de Projectuitvoerder aan de Netbeheerder van €
- Lid 4 De definitieve kostenvergoeding wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 en artikel 8 van het Uitvoeringsprotocol Telecom, na gereedmelding van de Maatregel vastgesteld.

Artikel 5 Eindspecificatie

- Lid 1 De Netbeheerder verstrekt onderliggende gegevens, zoals in de in bijlage 5 opgenomen documentenlijst, en een nadere onderbouwing van de gemaakte kosten voor toetsing en controle van de voorgestelde definitieve kostenvergoeding.
- Lid 2 De Netbeheerder overlegt op verzoek van Projectuitvoerder bij de eindspecificatie een accountantsverklaring.¹²
- Lid 3 De Projectuitvoerder verstuurt aan de Netbeheerder een schriftelijk rappel indien de Netbeheerder niet binnen de termijn van artikel 8.1 van het Uitvoeringsprotocol Telecom een eindspecificatie heeft ingediend of de ingediende eindspecificatie onvoldoende is onderbouwd of gespecificeerd. Daarbij wordt de Netbeheerder een nieuwe termijn gesteld waarbinnen de eindspecificatie dan wel de nadere onderbouwing ingediend moet worden. Indien de Netbeheerder, ook na het verstrijken van de rappeltermijn geen eindspecificatie heeft ingediend of de eindspecificatie niet of niet voldoende specificeert of onderbouwt, is de Projectuitvoerder bevoegd om de definitieve kostenvergoeding vast te stellen op 70% van de schadevergoeding op basis van het door de Projectuitvoerder geraamde schadebedrag.

Artikel 6 Facturering en betaling

- Lid 1 De credit- c.q. eindfactuur als bedoeld in artikel 8.7 van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt door de Netbeheerder, onder vermelding van het crediteurennummer en opdrachtnummer¹³, gezonden aan:

ProRail B.V.
T.a.v. Crediteurenadministratie FDC
Postbus 2212
3500 GE UTRECHT

¹² Opneming van dit artikellid in de Projectovereenstemming is optioneel: zie het bepaalde in artikel 8.10 van het Uitvoeringsprotocol Telecom.

¹³ Zie voor het crediteurennummer en het opdrachtnummer het voorblad van de Projectovereenstemming.

Of:

Rijkswaterstaat [relevante regio]
t.a.v. de crediteurenadministratie
o.v.v. [SAP-nummer]
Postbus 8185
3503 RD UTRECHT

- Lid 2 Betaling vindt plaats binnen 30 werkdagen nadat de factuur in goede orde door de Projectuitvoerder is ontvangen.
- Lid 3 Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet wordt door de Projectuitvoerder niet in behandeling genomen en zal na ontvangst worden geretourneerd aan de Netbeheerder.

Artikel 7 Contactpersonen

Alle correspondentie met uitzondering van de factuur dient onder vermelding van het contractnummer te worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.

Contactpersoon Projectuitvoerder
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Contactpersoon Netbeheerder:
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Artikel 8 Overige bepalingen

- Lid 1 De Netbeheerder vrijwaart de Projectuitvoerder voor schade en/of claims van derden, ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Maatregel als bedoeld in deze Projectovereenstemming.
- Lid 2 Partijen kunnen elkaar om aanvullende informatie vragen welke verband houdt met (de uitvoering van) deze Projectovereenstemming
- Lid 3 Partijen zullen informatie die zij van elkaar verkrijgen in het kader van de uitvoering van deze Projectovereenstemming en het onderliggende Uitvoeringsprotocol Telecom en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden niet aan derden openbaren, zulks onverminderd het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur of andere verplichtingen tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
- Lid 4 Wijzigingen in deze Projectovereenstemming zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Lid 5 Indien één of meer bepalingen in deze Projectovereenstemming nietig is of in strijd blijkt te zijn met de Telecommunicatiewet of jurisprudentie waarin deze artikelen worden uitgelegd, zullen Partijen met elkaar in overleg treden en bevorderen dat de betreffende bepaling(en) vervangen wordt(en) door een bepaling die daarmee niet in strijd is. De overige bepalingen van deze Projectovereenstemming blijven in een dergelijke situatie onverkort van kracht.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Projectuitvoerder,

Namens de Netbeheerder,

plaats, datum

plaats, datum

Bijlagen:

1. Kostenraming d.d met kenmerk
2. De gegevens omtrent de rechtspositie;
3. Documenten genoemd in artikel 2;
4. Format eindspecificatie;
5. Documentenlijst ten behoeve van onderbouwing eindspecificatie.

Bijlage 1: Kostenraming op basis van nacalculatie:

Netbeheerder				
Contractnummer (projectovereenstemming)				
Kabel/leiding (kenmerk):				
Materiaal, medium, leeftijd diameter				
Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):				
Onnauwkeurigheidsmarge (%):				
Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid	Aantal	Geraamd / begroot bedrag
1. Kosten van ontwerp en begeleiding				
conform staffel				
offerte aannemer				
Subtotaal				-
				-
Totaal ontwerp en begeleiding				
2. Uitvoerings- en materiaalkosten				
offerte aannemer				
materialen				
Subtotaal				
Totaal uitvoerings- en materiaalkosten				
Totaal raming				

- ☐ Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient de Netbeheerder zijn deel van de geraamde kosten weer te geven in de kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen de Netbeheerders en het totaal geraamd bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden) van het geraamde bedrag dient bijgevoegd te worden bij de kostenraming.
- ☐ Indien de Projectuitvoerder op verzoek van de Netbeheerder werkzaamheden verricht in het kader van de Maatregel, waarvan de kosten voor rekening van de Netbeheerder zijn (bv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming.

Berekening voorlopige kostenvergoeding **per kabel/per bundel kabels:**

Omschrijving	Geraamd bedrag	Percentuele kostenverdeling	Voorlopige kostenvergoeding
Kosten 'ontwerp en begeleiding'			
Uitvoerings- en materiaalkosten			
Totaal			

Bijlage 2: Gegevens rechtsposities:

Percelen waarin een Kabel ligt ten aanzien waarvan de Projectuitvoerder heeft verzocht een Maatregel te treffen

Nr.	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceel nummer	Eigenaar kadastraal perceel	Rechtspositie Projectuitvoerder: eigendom, beheerder Wbr/Spw/Ww, zakelijk recht, huur of anderszins in gebruik, geen gedoogplicht	Gedoogplicht Project- uitvoerder	Afstand kabel binnen perceel	Percentage
1						J/N	m	%
2							m	%
3							m	%
Totaal							m	Totaal %

1.	Gedoogplicht	%
2.	Geen gedoogplicht	%

*)
 % onder 1 = kosten voor rekening van de Netbeheerder
 % onder 2 = kosten voor rekening van de Projectuitvoerder

Voorstel

- De kabel wordt gebruikt voor openbare telecommunicatiediensten.
- De kabel met objectcode xxxxx ligt voor xx% in grond waarop de gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing is artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit deel van de kosten komt voor rekening van de Netbeheerder.
- De kabel met objectcode xxxxx ligt voor xx% in grond waarop geen gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing biedt Projectuitvoerder aan volledig de kosten te dragen. Dit betekent dat xx% van de totale kosten voor rekening van Projectuitvoerder komt.

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

KOSTENSOORT	PROJECTUITVOERDER	NETBEHEERDER
Ontwerp & begeleiding	%	%
Uitvoerings- en materiaalkosten	%	%

Met betrekking tot bovenstaande kostenverdeling geldt dat verrekening op basis van de werkelijk gemaakte kosten plaatsvindt waarbij rekening gehouden moet worden met een eventuele voordeeltorekening op basis van artikel 4.2 lid b van het Uitvoeringsprotocol Telecom.

Bijlage 3: Voorlopig ontwerp / Definitief Ontwerp en tekeningen

Bijlage 4: Eindspecificatie:

Netbeheerder:	
Contractnummer projectovereenstemming:	
Kabel(s)/leidingen:	
Materiaal, medium, leeftijd diameter	
Verplichtingensnummer:	
Datum:	

Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid	Aantal	bedrag (werkelijke kosten) (excl. Nieuw voor Oud)
1. Kosten van ontwerp en begeleiding				
Subtotaal				
2. Voordeeltorekening				
Subtotaal				
Totaal ontwerp en begeleiding				(1-2)
1. Uitvoerings- en materiaalkosten				
Subtotaal				
2. Voordeeltorekening				
Subtotaal				
Totaal uitvoeringskosten				(1-2)
Totaal werkelijke kosten				

Bijlage 5: Documentenlijst:

Met het oog op de vaststelling van de definitieve kostenvergoeding overlegt de Netbeheerder naast de eindspecificatie op grond van artikel 8.2 van het Uitvoeringsprotocol Telecom de volgende documenten:

1. Offerteuitvraag van de Netbeheerder aan aannemer;
2. Offerte van de aannemer aan de Netbeheerder;
3. Opdrachtverstrekking van de Netbeheerder aan de aannemer;
4. Werktekeningen (tekening met daarop bijgewerkt de uitvoeringsgegevens van de Netbeheerder, inclusief verwerkte lengte kabel, lassen etc.);
5. Revisietekeningen;
6. Meer-/minderwerkmeldingen;
7. Afleverbonnen materiaal en/of goederen ontvangstbon materiaal;
8. Facturen van de aannemer aan de Netbeheerder;
9. Betalingsbewijzen;
10. Uurtarievenlijst per functie (inclusief goedgekeurde accountantsverklaring)
11. Een overzicht van de ingeplande uren en de daadwerkelijk bestede uren.
12. Indien de Projectuitvoerder hierom heeft verzocht; een accountantsverklaring en een factuur van het accountantskantoor.

BIJLAGE 6, MODEL-PROJECTOVEREENSTEMMING

Projectovereenstemming Vaste Prijs

als bedoeld in artikel 1.11 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Aanduiding Project:

Contract betreffende:

Opdrachtnummer:

Crediteurennummer:

De ondergetekenden:

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van Rijkswaterstaat [relevante regio] , , hierna verder te noemen: **"Projectuitvoerder"**.

OF

ProRail B.V. ("ProRail"), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Moreelsepark 3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [heer/mevrouw], hierna te noemen **"Projectuitvoerder"**;

en

[naam netbeheerder], gevestigd te....., kantoorhoudende op het adres:.....te, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam].....functie], , hierna te noemen **"Netbeheerder"**,

Hierna tezamen te noemen "Partijen" en ieder een "Partij".

Overwegingen:

- De Netbeheerder en de Projectuitvoerder zijn een Uitvoeringsprotocol Telecom overeengekomen, waarin procesafspraken zijn neergelegd om tot overeenstemming te komen over de te nemen maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels met het oog op de uitvoering van een Project van Projectuitvoerder.
- De Projectuitvoerder heeft de Netbeheerder op (kenmerk) onder verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet en het Uitvoeringsprotocol Telecom een VTM gestuurd met het verzoek de Maatregel te treffen. De maatregel betreft: het verwijderen/ het verplaatsen/ het treffen van beschermende maatregelen ten aanzien van de kabels.
- De Maatregel is nodig voor de uitvoering van het Project.
- Partijen beogen in deze Projectovereenstemming nadere afspraken te maken over het Definitief Ontwerp, de Maatregel, de planning, de kostenraming en de vaststelling van de rechtsposities per perceel.
- De Kosten van de Maatregel worden op basis van Vaste prijs afgerekend.

Partijen zijn het volgende overeen gekomen:

Artikel 1 Werking

Deze Projectovereenstemming, met bijbehorende bijlagen, wordt beheerst door het Uitvoeringsprotocol Telecom en hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 2 Maatregel en Planning

- Lid 1 De Netbeheerder neemt de Maatregel (zoals bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet)¹⁴ ten aanzien van de Kabel(s) met objectcode(s), gelegen nabij de¹⁵, conform het Definitief Ontwerp van (versie)¹⁶ en tekening van¹⁷. Het Definitief Ontwerp met de tekening(en) is opgenomen in bijlage 3 van deze Projectovereenstemming.
- Lid 2 De Netbeheerder voert de Maatregel uiterlijk vóór uit.
- Lid 3 De Netbeheerder doet de startmelding als bedoeld in artikel 6.2 van het Uitvoeringsprotocol Telecom uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden.
- Lid 4 De schriftelijke startmelding en gereedmelding als bedoeld in artikel 6 van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt door de Netbeheerder gericht aan:
Organisatie:
Ter attentie van:
Adres:
Postcode:
Plaats:
- Lid 5 Binnen 30 werkdagen na gereedmelding overlegt de Netbeheerder aan Projectuitvoerder de as built-gegevens tenzij Partijen onderling anders overeenkomen.

Artikel 3 Kostenraming op basis van vaste prijs

De Kosten van de Maatregel zijn door de Netbeheerder geraamd op €, (exclusief BTW). De kostenraming d.d. is als bijlage 1 bij deze Projectovereenstemming gevoegd. De raming is door Partijen vastgesteld als vaste prijs voor het nemen van de Maatregel.

Artikel 4 Kostenverdeling

- Lid 1 Partijen stellen, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet, vast welke Kosten van de Maatregel voor rekening van de Netbeheerder blijven en welke Kosten voor rekening van de Projectuitvoerder worden gebracht.

¹⁴ Verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet wordt uitsluitend opgenomen, indien de Projectuitvoerder (deels) gedoogplichtige is.

¹⁵ Aanduiding van de locatie van de Maatregel.

¹⁶ Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

¹⁷ Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

- Lid 2 Op basis van het overzicht van de rechtsposities per perceel (bijlage 2) komen Partijen overeen dat % van de Kosten voor rekening van de Netbeheerder komt en % van de Kosten voor rekening van de Projectuitvoerder komt.
- Lid 3 Op grond van de kostenraming van de Netbeheerder resulteert deze kostenverdeling in een kostenvergoeding door de Projectuitvoerder aan de Netbeheerder van €

Artikel 5 Facturering en betaling

- Lid 1 De credit- c.q. eindfactuur als bedoeld in artikel 8.7 van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt door de Netbeheerder, onder vermelding van het crediteurennummer en opdrachtnummer¹⁸, gezonden aan:

ProRail B.V.
T.a.v. Crediteurenadministratie FDC
Postbus 2212
3500 GE UTRECHT

Of:

Rijkswaterstaat [relevante regio]
t.a.v. de crediteurenadministratie
o.v.v. SAP-nummer
Postbus 8185
3503 RD UTRECHT

- Lid 2 Betaling vindt plaats binnen 30 werkdagen nadat de factuur in goede orde door de Projectuitvoerder is ontvangen.
- Lid 3 Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet wordt door de Projectuitvoerder niet in behandeling genomen en zal na ontvangst worden geretourneerd aan de Netbeheerder.

Artikel 6 Contactpersonen

Alle correspondentie met uitzondering van facturen dient onder vermelding van het contractnummer te worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.

Contactpersoon Projectuitvoerder:

Contactpersoon Netbeheerder:

Naam:
Adres:
Plaats:
Tel-nummer:
E-mailadres:

Naam:
Adres:
Plaats:
Tel-nummer:
E-mailadres:

Artikel 7 Overige bepalingen

- Lid 1 De Netbeheerder vrijwaart de Projectuitvoerder voor schade en/of claims van derden, ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Maatregel als bedoeld in deze Projectovereenstemming.

¹⁸ Zie voor het crediteurennummer en het opdrachtnummer het voorblad van de Projectovereenstemming.

- Lid 2 Partijen kunnen elkaar om aanvullende informatie vragen welke verband houdt met (de uitvoering van) deze Projectovereenstemming.
- Lid 3 Partijen zullen informatie die zij van elkaar verkrijgen in het kader van de uitvoering van deze Projectovereenstemming en het onderliggende Uitvoeringsprotocol Telecom en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden niet aan derden openbaren, zults onverminderd het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur of andere verplichtingen tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
- Lid 4 Wijzigingen in deze Projectovereenstemming zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
- Lid 5 Indien één of meer bepalingen in deze Projectovereenstemming nietig is of in strijd blijkt te zijn met de Telecommunicatiewet of jurisprudentie waarin deze artikelen worden uitgelegd, zullen Partijen met elkaar in overleg treden en bevorderen dat de betreffende bepaling(en) vervangen wordt(en) door een bepaling die daarmee niet in strijd is. De overige bepalingen van deze Projectovereenstemming blijven in een dergelijke situatie onverkort van kracht.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Projectuitvoerder,

Namens de Netbeheerder,

plaats, datum

plaats, datum

Bijlagen:

1. Kostenraming d.d met kenmerk
2. De gegevens omtrent de rechtspositie;
3. Documenten genoemd in artikel 2.

Bijlage 1: Berekening kostenvergoeding op basis van vaste prijs:

Netbeheerder:				
Contractnummer (projectovereenstemming)				
Kabel/leiding (kenmerk):				
Materiaal, medium, leeftijd diameter				
Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):				
Onnauwkeurigheidsmarge (%):				
Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid	Aantal	Begroot bedrag
1. Kosten van ontwerp en begeleiding				
conform staffel				
offerte aannemer				
Subtotaal				
Totaal ontwerp en begeleiding				(1-2)
2. Uitvoeringskosten				
offerte aannemer				
materialen				
Subtotaal				
Totaal uitvoeringskosten				(1-2)
Totaal begroting				

- Indien er werkzaamheden voor meerdere kabels van Netbeheerder worden verricht, moet aangegeven worden welke verdeelsleutel voor de verdeling van kosten naar kostensoorten per kabel wordt gehanteerd.
- Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient Netbeheerder zijn deel van de begrote kosten weer te geven in de kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen kabelbeheerders en het totaal geraamde bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden) van het geraamde bedrag dient bijgevoegd te worden bij de kostenraming.
- Indien Projectuitvoerder op verzoek van Netbeheerder werkzaamheden verricht in het kader van de Maatregel, waarvan de kosten voor rekening van Netbeheerder zijn (bv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming.

Berekening definitieve kostenvergoeding per kabel bij het werken op basis van vast prijs

Omschrijving	Begroot bedrag	Percentuele kostenverdeling	Definitieve kostenvergoeding
Kosten 'ontwerp en begeleiding'			
Uitvoeringskosten			
Totaal			

Bijlage 2: Gegevens rechtsposities:

Percelen waarin kabel ligt ten aanzien waarvan Projectuitvoerder heeft verzocht maatregelen te treffen

Nr.	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceel nummer	Eigenaar kadastraal perceel	Rechtspositie Projectuitvoerder : eigendom, beheerder Wbr/Spw/Ww, zakelijk recht, huur of anderszins in gebruik, geen gedoogplicht	Gedoogplicht Project- uitvoerder	Afstand kabel binnen perceel	Percentage
1						J/N	m	%
2							m	%
3							m	%
Totaal							m	Totaal %

1.	Gedoogplicht	%
2.	Geen gedoogplicht	%

*)
% onder 1 = kosten Netbeheerder
% onder 2 = kosten Projectuitvoerder

Voorstel

- De kabel wordt gebruikt voor openbare telecommunicatiediensten.
- De kabel met objectcode **xxxxx** ligt voor **xx%** in grond waarop de gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing is artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit deel van de kosten komt voor rekening van de Netbeheerder.
- De kabel met objectcode **xxxxx** ligt voor **xx%** in grond waarop geen gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing biedt Projectuitvoerder aan volledig de kosten te dragen. Dit betekent dat **xx%** van de totale kosten voor rekening van Projectuitvoerder komt.

Resumerend kan de definitieve kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

KOSTENSOORT	PROJECTUITVOERDER	NETBEHEERDER
Ontwerp & begeleiding	%	%
Uitvoeringskosten	%	%

Met betrekking tot bovenstaande kostenverdeling geldt dat nog rekening gehouden moet worden met een eventuele voordeeltorekening op basis van artikel 4.2 lid b van het Uitvoeringsprotocol Telecom.

Bijlage 3: Voorlopig ontwerp / Definitief ontwerp en tekeningen

BIJLAGE 7, **MODEL**-PROJECTOVEREENSTEMMING

Projectovereenstemming Vereenvoudigd

als bedoeld in artikel 1.12 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Aanduiding Project:

Contract betreffende:

Opdrachtnummer:

Crediteurennummer:

De ondergetekenden:

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van Rijkswaterstaat [relevante regio] , , hierna verder te noemen: **"Projectuitvoerder"**.

OF

ProRail B.V. ("ProRail"), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Moreelsepark 3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [heer/mevrouw], hierna te noemen **"Projectuitvoerder"**;

en

[naam netbeheerder], gevestigd te....., kantoorhoudende op het adres:.....te, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam].....functie], , hierna te noemen **"Netbeheerder"**,

Hierna tezamen te noemen "Partijen" en ieder een "Partij".

Overwegingen:

- De Netbeheerder en de Projectuitvoerder zijn een Uitvoeringsprotocol Telecom overeengekomen, waarin procesafspraken zijn neergelegd om tot overeenstemming te komen over de te nemen maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels met het oog op de uitvoering van een Project van Projectuitvoerder.
- De Projectuitvoerder heeft de Netbeheerder op (kenmerk) onder verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet en het Uitvoeringsprotocol Telecom een VTM gestuurd met het verzoek de Maatregel te treffen. De maatregel betreft: het verwijderen/ het verplaatsen/ het treffen van beschermende maatregelen ten aanzien van de kabels.
- De Maatregel is nodig voor de uitvoering van het Project.
- Partijen wensen hun rechtsverhouding ten aanzien van de uit te voeren maatregelen in deze Projectovereenstemming vast te leggen.

Partijen zijn het volgende overeen gekomen:

Artikel 1 Werking

Deze Projectovereenstemming, met bijbehorende bijlagen, wordt beheerst door het Uitvoeringsprotocol Telecom en hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 2 Maatregel en Planning

- Lid 1 De Netbeheerder neemt de Maatregel (zoals bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet)¹⁹ ten aanzien van de Kabel(s) met objectcode(s), gelegen nabij de²⁰, conform het Definitief Ontwerp van (versie)²¹ en tekening van²². Het Definitief Ontwerp met de tekening(en) is opgenomen in bijlage 2 van deze Projectovereenstemming.
- Lid 2 De Netbeheerder voert de Maatregel uiterlijk vóór uit.
- Lid 3 De Netbeheerder doet de startmelding als bedoeld in artikel 6.2 van het Uitvoeringsprotocol Telecom uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden.
- Lid 4 De schriftelijke startmelding en gereedmelding als bedoeld in artikel 6 van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt door de Netbeheerder gericht aan:
Organisatie:
Ter attentie van:
Adres:
Postcode:
Plaats:
- Lid 5 Binnen 30 werkdagen na gereedmelding overlegt de Netbeheerder aan de Projectuitvoerder de as built-gegevens tenzij Partijen onderling anders overeenkomen.

Artikel 3 Contactpersonen

Alle correspondentie met uitzondering van de factuur dient onder vermelding van het contractnummer te worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.

Contactpersoon Projectuitvoerder

Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Contactpersoon Netbeheerder:

Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Artikel 4 Overige bepalingen

- Lid 1 De Netbeheerder vrijwaart de Projectuitvoerder voor schade en/of claims van derden, ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Maatregel als bedoeld in deze Projectovereenstemming.
- Lid 2 Partijen kunnen elkaar om aanvullende informatie vragen welke verband houdt met (de uitvoering van) deze Projectovereenstemming

¹⁹ Verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet wordt uitsluitend opgenomen, indien de Projectuitvoerder (deels) gedoogplichtige is.

²⁰ Aanduiding van de locatie van de Maatregel.

²¹ Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

²² Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

- Lid 3 Partijen zullen informatie die zij van elkaar verkrijgen in het kader van de uitvoering van deze Projectovereenstemming en het onderliggende Uitvoeringsprotocol Telecom en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden niet aan derden openbaren, zulks onverminderd het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur of andere verplichtingen tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
- Lid 4 Wijzigingen in deze Projectovereenstemming zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
- Lid 5 Indien één of meer bepalingen in deze Projectovereenstemming nietig is of in strijd blijkt te zijn met de Telecommunicatiewet of jurisprudentie waarin deze artikelen worden uitgelegd, zullen Partijen met elkaar in overleg treden en bevorderen dat de betreffende bepaling(en) vervangen wordt(en) door een bepaling die daarmee niet in strijd is. De overige bepalingen van deze Projectovereenstemming blijven in een dergelijke situatie onverkort van kracht.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Projectuitvoerder,

Namens de Netbeheerder,

plaats, datum

plaats, datum

Bijlagen:

1. De gegevens omtrent de rechtspositie;
2. Documenten genoemd in artikel 2.

Bijlage 1: Gegevens rechtsposities:

Percelen waarin kabel ligt ten aanzien waarvan Projectuitvoerder heeft verzocht maatregelen te treffen

Nr.	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceel nummer	Eigenaar kadastraal perceel	Rechtspositie waaruit gedoogplicht Projectuitvoerder volgt: eigendom, beheerder Wbr/Spw/Ww, zakelijk recht	Gedoogplicht Projectuitvoerder	Afstand kabel binnen perceel	Percentage
1						JA	m	%
2						JA	m	%
3						JA	m	%
Totaal							m	100%

Resume

- De kabel wordt gebruikt voor openbare telecommunicatiediensten.
- De kabel met objectcode **xxxxx** ligt voor 100% in grond waarop de gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing is artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit deel van de kosten komt voor rekening van de Netbeheerder.

De definitieve kostenverdeling in percentages is:

KOSTENSOORT	PROJECTUITVOERDER	NETBEHEERDER
Ontwerp & begeleiding	0%	100%
Uitvoeringskosten	0%	100%

Bijlage 2: Voorlopig ontwerp / Definitief ontwerp en tekeningen

BIJLAGE 8, **MODEL-PROJECTOVEREENSTEMMING**

Projectovereenstemming Geschillen

als bedoeld in artikel 1.9 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Aanduiding project

Contract betreffende:

Opdrachtnummer:

Crediteurennummer:

De ondergetekenden:

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van Rijkswaterstaat [relevante regio] , , hierna verder te noemen: **“Projectuitvoerder”**

OF

ProRail B.V. (“ProRail”), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Moreelsepark 3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [heer/mevrouw], hierna te noemen **“Projectuitvoerder”**;

en

[naam netbeheerder], gevestigd te , kantoorhoudende op het adres: te , rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam] [functie] , , hierna te noemen **“Netbeheerder”**,

Hierna tezamen te noemen “Partijen” en ieder een “Partij”.

Overwegingen:

- De Netbeheerder en de Projectuitvoerder zijn een Uitvoeringsprotocol Telecom overeengekomen, waarin procesafspraken zijn neergelegd om tot overeenstemming te komen over de te nemen maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels met het oog op de uitvoering van een Project van Projectuitvoerder.
- De Projectuitvoerder heeft de Netbeheerder op (kenmerk) onder verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet en het Uitvoeringsprotocol Telecom een VTM gestuurd met het verzoek de Maatregel te treffen. De maatregel betreft: het verwijderen/ het verplaatsen/ het treffen van beschermende maatregelen ten aanzien van de kabels.
- De Maatregel is nodig voor de uitvoering van het Project.²³
- Partijen beogen, voor zover mogelijk, in deze Projectovereenstemming nadere afspraken te maken over het Definitief Ontwerp, de Maatregel, de planning, de kostenraming en de vaststelling van de rechtsposities per perceel.
- Partijen stellen vast dat er geen overeenstemming is bereikt over [nader in te vullen]
- Partijen realiseren zich dat artikel 9 van het Uitvoeringsprotocol Telecom van toepassing is, maar wensen desalniettemin werkaafspraken te maken en hun (voorlopige) rechtsverhouding in deze projectovereenstemming vast te leggen.
- De Kosten van de Maatregel worden op basis van Nacalculatie vastgesteld.

²³ De tekst van deze bullit is optioneel; het geschil zou namelijk juist kunnen gaan over de noodzaak.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 Werking

Deze Projectovereenstemming, met bijbehorende bijlagen, wordt beheerst door het Uitvoeringsprotocol Telecom en hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 2 Maatregel en Planning

Lid 1 **OPTIE 1**

De Netbeheerder neemt de Maatregel (zoals bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet)²⁴ ten aanzien van de Kabel(s) met objectcode(s), gelegen nabij de²⁵, conform het Definitief Ontwerp van (versie)²⁶ en tekening van²⁷. Het Definitief Ontwerp met de tekening(en) is opgenomen in bijlage 3 van deze Projectovereenstemming.

Lid 1 **OPTIE 2²⁸**

Partijen verschillen van mening over de noodzaak van de Maatregel zoals omschreven in het VTM en/of het Voorlopig Ontwerp.

De Netbeheerder neemt de Maatregel (zoals bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet)²⁹ ten aanzien van de Kabel(s) met objectcode(s), gelegen nabij de³⁰, conform het Voorlopig Ontwerp van (versie)³¹ en tekening van³². Het Voorlopig Ontwerp met de tekening(en) is opgenomen in bijlage 3 van deze Projectovereenstemming.

Vervolg

Lid 2 De Netbeheerder voert de Maatregel uiterlijk vóór uit.

Lid 3 De Netbeheerder doet de startmelding als bedoeld in artikel 6.2 van het Uitvoeringsprotocol Telecom uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden.

Lid 4 De schriftelijke startmelding en gereedmelding als bedoeld in artikel 6 van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt door de Netbeheerder gericht aan:

Organisatie:
Ter attentie van:
Adres:
Postcode:
Plaats:

²⁴ Verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet wordt uitsluitend opgenomen, indien de Projectuitvoerder (deels) gedoogplichtige is.

²⁵ Aanduiding van de locatie van de Maatregel.

²⁶ Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

²⁷ Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

²⁸ Deze tekst opnemen indien verschil van mening over de noodzaak van de Maatregel zoals omschreven in het VTM en/of het Voorlopig Ontwerp. Hierdoor kunnen Partijen niet tot overeenstemming komen over een Definitief Ontwerp. In dat geval is de Netbeheerder op grond van artikel 5.8 Tw toch gehouden de Maatregel te treffen. Indien naderhand komt vast te staan dat de Maatregel niet noodzakelijk was voor de werkzaamheden en met minder vergaande maatregelen had kunnen worden volstaan, komt het verschil tussen de kosten van de uitgevoerde Maatregel en de raming van de minder vergaande maatregelen voor rekening van de Projectuitvoerder.

²⁹ Verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet wordt uitsluitend opgenomen, indien de Projectuitvoerder (deels) gedoogplichtige is.

³⁰ Aanduiding van de locatie van de Maatregel.

³¹ Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

³² Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

- Lid 5 Binnen 30 werkdagen na gereedmelding overlegt de Netbeheerder aan de Projectuitvoerder de as built-gegevens tenzij Partijen onderling anders overeenkomen.

Artikel 3 Kostenraming

- Lid 1 De Kosten van de Maatregel zijn door de Netbeheerder geraamd op €, (exclusief BTW). De kostenraming d.d. is als bijlage 1 bij deze Projectovereenstemming gevoegd.
- Lid 2 De Netbeheerder is verplicht de Maatregel uit te (laten) voeren tegen marktconforme kosten. Onder marktconforme kosten wordt verstaan: kosten zoals deze door een onderneming onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt.
- Lid 3 Over afwijkingen van meer dan 10% van de totale geraamde kosten of meer dan € 15.000 per Projectovereenstemming treden de Netbeheerder en de Projectuitvoerder in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg. Afwijkingen van meer dan 10% van de geraamde kosten of meer dan € 15.000 per Projectovereenstemming maken, uitsluitend na goedkeuring van de Projectuitvoerder en de Netbeheerder, deel uit van de Kosten.

Artikel 4 (Voorlopige) Kostenverdeling³³

- Lid 1 Partijen stellen, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet, vast welke Kosten van de Maatregel voor rekening van de Netbeheerder blijven, welke Kosten voor rekening van de Projectuitvoerder worden gebracht en over welke Kosten of welk deel van de Kosten verschil van mening bestaat.
- Lid 2 Op basis van het overzicht van de rechtsposities per perceel (bijlage 2) stellen Partijen vast dat % van de Kosten voor rekening van de Netbeheerder komt, % van de Kosten voor rekening van de Projectuitvoerder komt en over % van de Kosten verschil van mening bestaat.
- Lid 3 Op grond van de kostenraming van de Netbeheerder zou deze kostenverdeling neerkomen op een kostenvergoeding door de Projectuitvoerder aan de Netbeheerder van €
- Lid 4 Partijen komen overeen dat zij voorlopig, onder alle voorbehoud van recht, ieder de helft van de Kosten waarover een verschil van mening bestaat, dragen. Op grond van de kostenraming van de Netbeheerder zou de Projectuitvoerder, in aanvulling op het bedrag €³⁴, voorlopig een extra bedrag van € voor haar rekening nemen, zijnde de helft van %.³⁵
- Lid 5 De definitieve kostenvergoeding wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 en artikel 8 van het Uitvoeringsprotocol Telecom, na gereedmelding van de Maatregel vastgesteld.

³³ De tekst van dit artikel is optioneel; het is in deze zin geredigeerd ervan uitgaande dat er een geschil bestaat over het kostendragerschap van (een deel van) de kosten. Dat hoeft uiteraard niet het geval te zijn.

³⁴ Invullen: Bedrag van lid 3.

³⁵ Invullen: percentage van de Kosten waarover verschil van mening bestaat.

Artikel 5 Eindspecificatie

- Lid 1 De Netbeheerder verstrekt onderliggende gegevens, zoals in de in bijlage 5 opgenomen documentenlijst, en een nadere onderbouwing van de gemaakte kosten voor toetsing en controle van de voorgestelde definitieve kostenvergoeding.
- Lid 2 De Netbeheerder overlegt op verzoek van Projectuitvoerder bij de eindspecificatie een accountantsverklaring.³⁶
- Lid 3 De Projectuitvoerder verstuurt aan de Netbeheerder een schriftelijk rappel indien de Netbeheerder niet binnen de termijn van artikel 8.1 van het Uitvoeringsprotocol Telecom een eindspecificatie heeft ingediend of de ingediende eindspecificatie onvoldoende is onderbouwd of gespecificeerd. Daarbij wordt de Netbeheerder een nieuwe termijn gesteld waarbinnen de eindspecificatie dan wel de nadere onderbouwing ingediend moet worden. Indien de Netbeheerder, ook na het verstrijken van de rappeltermijn geen eindspecificatie heeft ingediend of de eindspecificatie niet of niet voldoende specificeert of onderbouwt, is de Projectuitvoerder bevoegd om de definitieve kostenvergoeding vast te stellen op 70% van de schadevergoeding op basis van het door de Netbeheerder geraamde schadebedrag.

Artikel 6 Facturering en betaling

- Lid 1 De credit- c.q. eindfactuur als bedoeld in artikel 8.7 van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt door de Netbeheerder, onder vermelding van het crediteurennummer en opdrachtnummer³⁷, gezonden aan:

ProRail B.V.
T.a.v. Crediteurenadministratie FDC
Postbus 2212
3500 GE UTRECHT

Of:

Rijkswaterstaat [relevante regio]
t.a.v. de crediteurenadministratie
o.v.v. [SAP-nummer]
Postbus 8185
3503 RD UTRECHT

- Lid 2 Betaling vindt plaats binnen 30 werkdagen nadat de factuur in goede orde door de Projectuitvoerder is ontvangen.
- Lid 3 Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet wordt door de Projectuitvoerder niet in behandeling genomen en zal na ontvangst worden geretourneerd aan de Netbeheerder.

Artikel 7 Geschillenregeling

- Lid 1 De Netbeheerder zal de Maatregel, ondanks het geschil, binnen de planning van artikel 2 realiseren.

³⁶ Opneming van dit artikellid in de Projectovereenstemming is optioneel: zie het bepaalde in artikel 8.10 van het Uitvoeringsprotocol Telecom.

³⁷ Zie voor het crediteurennummer en het opdrachtnummer het voorblad van de Projectovereenstemming.

- Lid 2 De Projectuitvoerder of de Netbeheerder zal het bedrag als bedoeld in artikel 4, lid 4 van deze Projectovereenstemming, niet eerder terugvorderen dan nadat een onherroepelijke uitspraak is gedaan over het geschil.
- Lid 3 Voor zover een Partij het geschil wil voorleggen aan een bevoegde instantie, zal die Partij met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van het Uitvoeringsprotocol Telecom, uiterlijk op een geschil aanhangig maken. Indien geen der Partijen het geschil voor deze datum heeft voorgelegd aan een bevoegde instantie zal de voorlopige oplossing als bedoeld in artikel 4, lid 4 van deze Projectovereenstemming hebben te gelden als minnelijke overeenstemming tussen Partijen.

Artikel 8 Contactpersonen

Alle correspondentie met uitzondering van de factuur dient onder vermelding van het contractnummer te worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.

Contactpersoon Projectuitvoerder:
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Contactpersoon Netbeheerder:
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Artikel 9 Overige bepalingen

- Lid 1 De Netbeheerder vrijwaart de Projectuitvoerder voor schade en/of claims van derden, ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Maatregel als bedoeld in deze Projectovereenstemming.
- Lid 2 Partijen kunnen elkaar om aanvullende informatie vragen welke verband houdt met (de uitvoering van) deze Projectovereenstemming
- Lid 3 Partijen zullen informatie die zij van elkaar verkrijgen in het kader van de uitvoering van deze Projectovereenstemming en het onderliggende Uitvoeringsprotocol Telecom en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden niet aan derden openbaren, zulks onverminderd het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur of andere verplichtingen tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
- Lid 4 Wijzigingen in deze Projectovereenstemming zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
- Lid 5 Indien één of meer bepalingen in deze Projectovereenstemming nietig is of in strijd blijkt te zijn met de Telecommunicatiewet of jurisprudentie waarin deze artikelen worden uitgelegd, zullen Partijen met elkaar in overleg treden en bevorderen dat de betreffende bepaling(en) vervangen wordt(en) door een bepaling die daarmee niet in strijd is. De overige bepalingen van deze Projectovereenstemming blijven in een dergelijke situatie onverkort van kracht.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Projectuitvoerder,

Namens de Netbeheerder,

plaats, datum

plaats, datum

Bijlagen:

1. Kostenraming d.d met kenmerk
2. De gegevens omtrent de rechtspositie en omtrent vaststelling geschil ten aanzien van de rechtsposities;
3. Documenten genoemd in artikel 2;
4. Format eindspecificatie;
5. Documentenlijst ten behoeve van onderbouwing eindspecificatie.

Bijlage 1: Kostenraming op basis van nacalculatie:

Netbeheerder				
Contractnummer (projectovereenstemming)				
Kabel/leiding (kenmerk):				
Materiaal, medium, leeftijd diameter				
Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):				
Onnauwkeurigheidsmarge (%):				
Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid	Aantal	Geraamd / begroot bedrag
1. Kosten van ontwerp en begeleiding				
conform staffel				
offerte aannemer				
Subtotaal				
				-
				-
Totaal ontwerp en begeleiding				
2. Uitvoerings- en materiaalkosten				
Offerte aannemer				
materialen				
Subtotaal				
Totaal uitvoerings- en materiaalkosten				
Totaal raming				

- ☐ Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient de Netbeheerder zijn deel van de geraamde kosten weer te geven in de kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen Netbeheerders en het totaal geraamde bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden) van het geraamde bedrag dient bijgevoegd te worden bij de kostenraming.
- ☐ Indien de Projectuitvoerder op verzoek van de Netbeheerder werkzaamheden verricht in het kader van het nemen van maatregelen, waarvan de kosten voor rekening van de Netbeheerder zijn (bv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming.

Berekening voorlopige kostenvergoeding **per kabel/ per bundel kabels**

Omschrijving	Geraamd bedrag	Percentuele kostenverdeling	Voorlopige kostenvergoeding
Kosten 'ontwerp en begeleiding'			
Uitvoeringskosten			
Totaal			

Bijlage 2: Gegevens rechtsposities:

Percelen waarin kabel ligt ten aanzien waarvan de Projectuitvoerder heeft verzocht maatregelen te treffen

Nr.	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceel nummer	Eigenaar kadastraal perceel	Rechtspositie Projectuitvoerder: eigendom, beheerder Wbr/Spw/Ww, zakelijk recht, huur of anderszins in gebruik, geen gedoogplicht	Gedoogplicht Projectuitvoerder	Netbeheerder WEL/NIET akkoord met gedoogplicht	Afstand kabel binnen perceel	Percentage
1						J/N	WEL/NIET	m	%
2								m	%
3								m	%
tot.								m	Totaal %

1.	Gedoogplicht	%
2.	Geen gedoogplicht	%
3.	Partijen niet eens over gedoogplicht	%

*)

% onder 1 = kosten Netbeheerder

% onder 2 = kosten Projectuitvoerder

% onder 3 = helft van % voorlopig kosten voor de Projectuitvoerder en helft van % voorlopig voor de Netbeheerder

Voorstel

- De kabel wordt gebruikt voor openbare telecommunicatiediensten.
- De kabel met objectcode **xxxxx** ligt voor **xx%** in grond waarop de gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing is artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit deel van de kosten komt voor rekening van de Netbeheerder.
- De kabel met objectcode **xxxxx** ligt voor **xx%** in grond waarop geen gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing biedt Projectuitvoerder aan volledig de kosten te dragen. Dit betekent dat **xx%** van de totale kosten voor rekening van Projectuitvoerder komt.
- De kabel met objectcode **xxxxx** ligt voor **xx%** in grond waarvan Partijen geen overeenstemming hebben over de financiële rechtsgevolgen als gevolg van de rechtspositie. Voorlopig delen Partijen ieder de helft van de kosten ten aanzien van dit %.

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

- Deel van de kosten waarover Partijen overeenstemming hebben over de rechtspositie(s):

KOSTENSOORT	PROJECTUITVOERDER	NETBEHEERDER
Ontwerp & begeleiding	A%	B%
Uitvoerings- en materiaalkosten	A%	B%

- Deel van de kosten waarover Partijen geen overeenstemming hebben over de rechtspositie(s):

KOSTENSOORT	PROJECTUITVOERDER	NETBEHEERDER
Ontwerp & begeleiding	C%	D%
Uitvoerings- en materiaalkosten	C%	D%

Met betrekking tot bovenstaande kostenverdeling geldt dat verrekening op basis van de werkelijk gemaakte kosten plaatsvindt waarbij rekening gehouden moet worden met een eventuele voordeeltorekening op basis van artikel 4.2 lid b van het Uitvoeringsprotocol Telecom.

NB. Percentage $A + B + C + D = 100\%$

Bijlage 3: Voorlopig ontwerp/Definitief Ontwerp en tekeningen

Bijlage 4: Eindspecificatie:

Netbeheerder:	
Contractnummer projectovereenstemming:	
Kabel(s)/leidingen:	
Materiaal, medium, leeftijd diameter	
Verplichtingennummer:	
Datum:	

Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid	Aantal	bedrag (werkelijke kosten) (excl. Nieuw voor Oud)
1. Kosten van ontwerp en begeleiding				
Subtotaal				
2. Voordeeltorekening				
Subtotaal				
Totaal ontwerp en begeleiding				(1-2)
1. Uitvoerings- en materiaalkosten				
Subtotaal				
2. Voordeeltorekening				
Subtotaal				
Totaal uitvoeringskosten				(1-2)
Totaal werkelijke kosten				

Bijlage 5: Documentenlijst:

Met het oog op de vaststelling van de definitieve kostenvergoeding overlegt de Netbeheerder naast de eindspecificatie op grond van artikel 8.2 van het Uitvoeringsprotocol Telecom de volgende documenten:

1. Offerteuitvraag van de Netbeheerder aan aannemer;
2. Offerte van de aannemer aan de Netbeheerder;
3. Opdrachtverstrekking van de Netbeheerder aan de aannemer;
4. Werktekeningen (tekening met daarop bijgewerkt de uitvoeringsgegevens van de Netbeheerder, inclusief verwerkte lengte kabel, lassen etc.);
5. Revisietekeningen;
6. Meer-/minderwerkmeldingen;
7. Afleverbonnen materiaal en/of goederen ontvangstbon materiaal;
8. Facturen van de aannemer aan de Netbeheerder;
9. Betalingsbewijzen;
10. Uurtarievenlijst per functie (inclusief goedgekeurde accountantsverklaring)
11. Een overzicht van de ingeplande uren en de daadwerkelijk bestede uren.
12. Indien de Projectuitvoerder hierom heeft verzocht; een accountantsverklaring en een factuur van het accountantskantoor.

BIJLAGE 9, KOSTENRAMING

als bedoeld in artikel 4.5 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Netbeheerder				
Contractnummer (projectovereenstemming)				
Kabel/leiding (kenmerk):				
Materiaal, medium, leeftijd diameter				
Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):				
Onnauwkeurigheidsmarge (%):				
Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid	Aantal	Geraamd / begroot bedrag
1. Kosten van ontwerp en begeleiding				
conform staffel				
offerte aannemer				
Subtotaal				-
				-
Totaal ontwerp en begeleiding				
2. Uitvoerings- en materiaalkosten				
offerte aannemer				
materialen				
Subtotaal				
Totaal uitvoerings- en materiaalkosten				
Totaal raming				

BIJLAGE 10, STAFFEL INTERNE PERSONEELSKOSTEN TELECOMAANBIEDERS

als bedoeld in artikel 7.3 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Doorberekeningsmatrix EP-kosten wegreconstructie


Uurloon schaal 6 ep-ap-doorbelasting	schaal 6	2005
Uurloon schaal 8 ep-ap-doorbelasting	schaal 8	2005


	€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 40.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 150.000	€ 200.000	€ 350.000	€ 500.000
Medewerker Inkomend Overleg											
<i>Registreren Projecten</i>											
<i>Informatie verzamelen Lok./Int Lok</i>											
<i>Tekeningen bestellen</i>											
<i>Intekenen Bestaande kabels</i>											
<i>Aanmaken/Archiveren projecten</i>											
Totaal uren		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uurloon €											
Totaal bedrag (A)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Adviseur Infrastructuur

<i>Analyseren project</i>											
<i>Raadplegen bezetting gegevens (*1)</i>											
<i>Extra tekeningen bestellen</i>											
<i>Plan bespreken met Kwaliteit</i>											
<i>Tracé bepaling</i>											
<i>Diverse vergaderingen met Opdrachtgever</i>											
<i>Consequenties Bepalen/Bespreken OP</i>											
<i>Beoordelen Juridische Aspecten</i>											
<i>Maken offerte naar Opdrachtgever</i>											
<i>Vrijschakelen kabels door OTS (*2)</i>											
<i>Project overdragen aan VWNB</i>											
<i>Project begeleiding tijdens uitvoering</i>											
<i>Oplevering Project Technisch</i>											
<i>Oplevering Project Financieel</i>											
<i>Maken factuur derden</i>											
<i>Afsluiten Project</i>											
<i>Extra wrkzmheden a.g.v. wijz Objectplan</i>											
Totaal uren		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uurloon €											
Totaal bedrag (B)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal A + B	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

*1 en *2 alleen van toepassing indien er sprake is van onderbreken. Bij verleggen zonder onderbreken deze in mindering brengen.

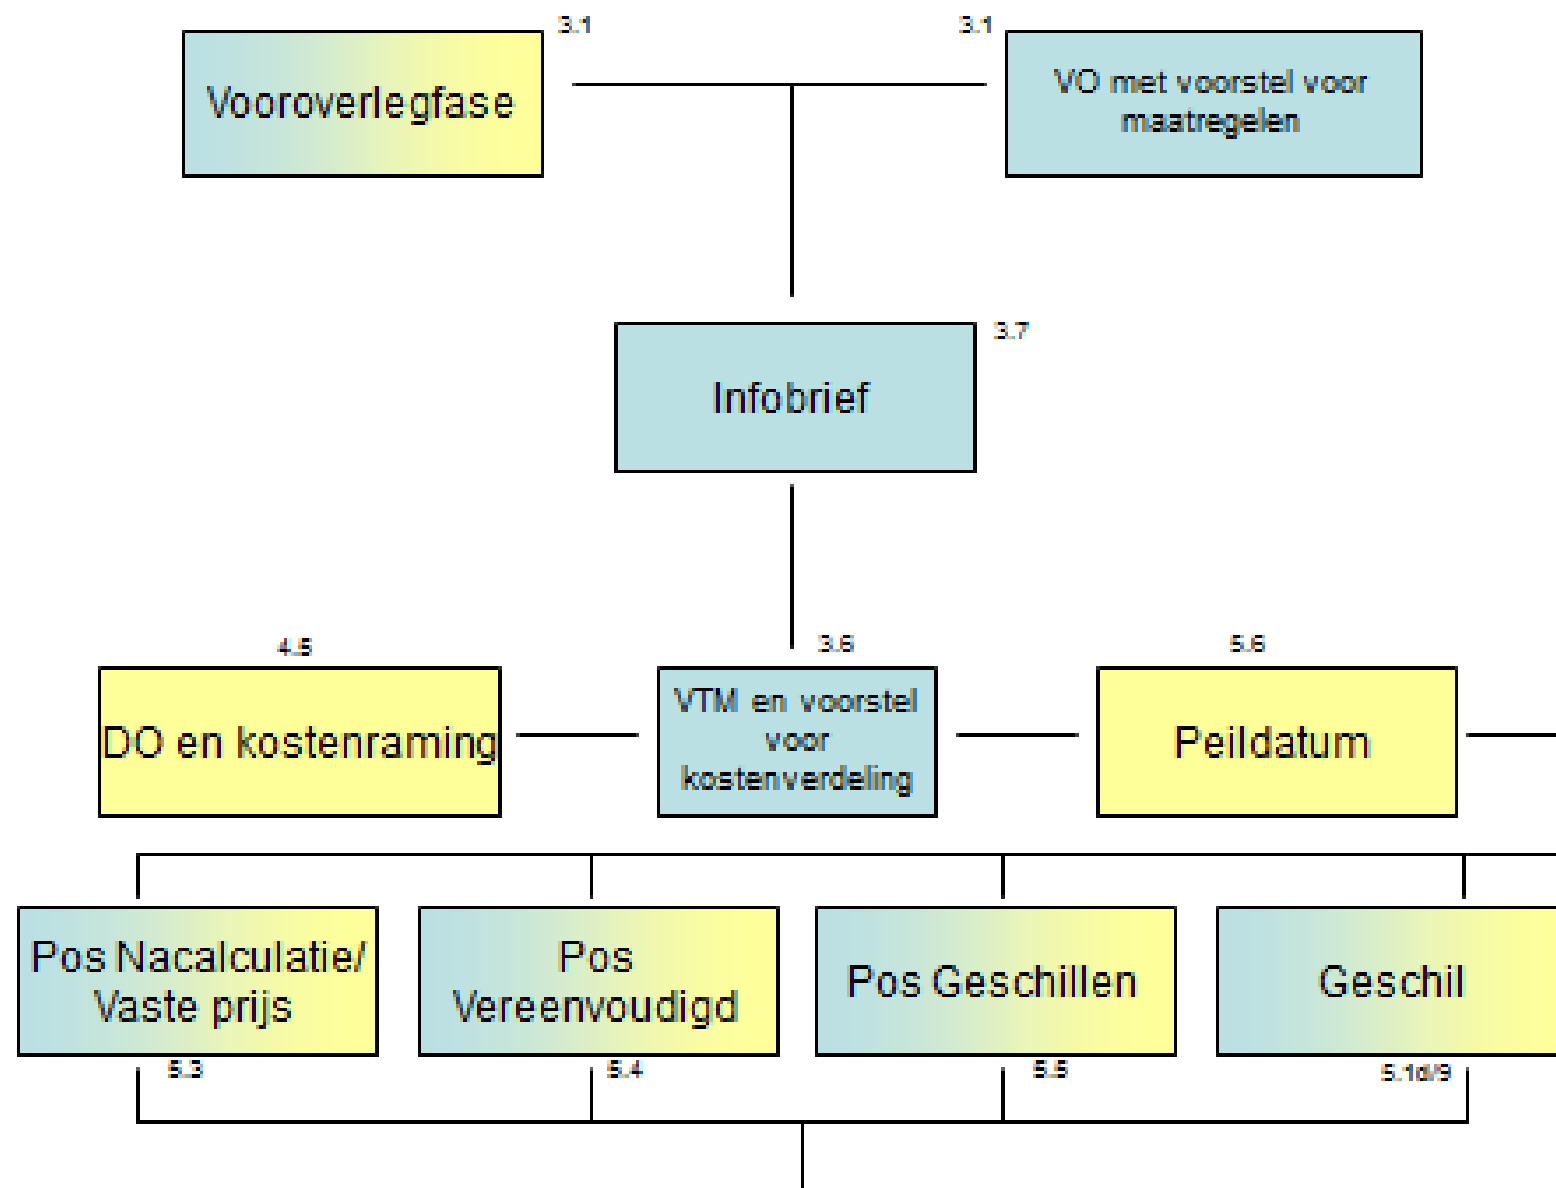

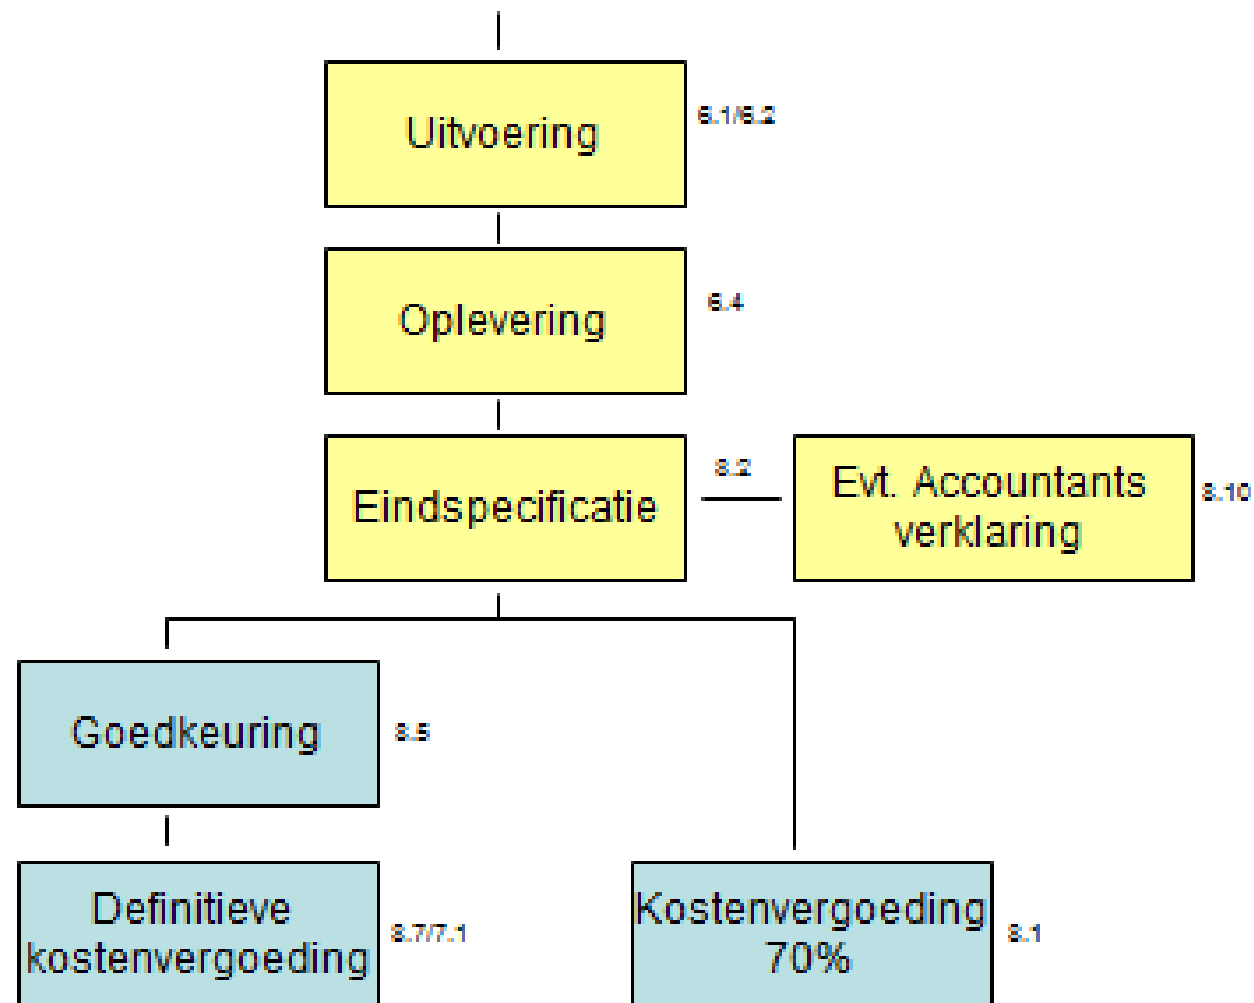

Afkortingen

VO	Voorlopig Ontwerp
VTM	Verzoek Tot het nemen van Maatregelen
DO	Definitief Ontwerp van de maatregelen
POS	Project Overeenstemming

Verantwoordelijke

	Projectuitvoerder
	Netbeheerder
	Projectuitvoerder & Netbeheerder
