



hetWaterschapshuis


De kracht van samen

## Bijlage D2 - (Concept) NOK

*Nadere overeenkomst behorende bij de  
Raamovereenkomst AHN6 en BM6 2025 / 2026 /  
2027*

*Kavel X: naam kavel*

*Kenmerk Z1815- x/H...*

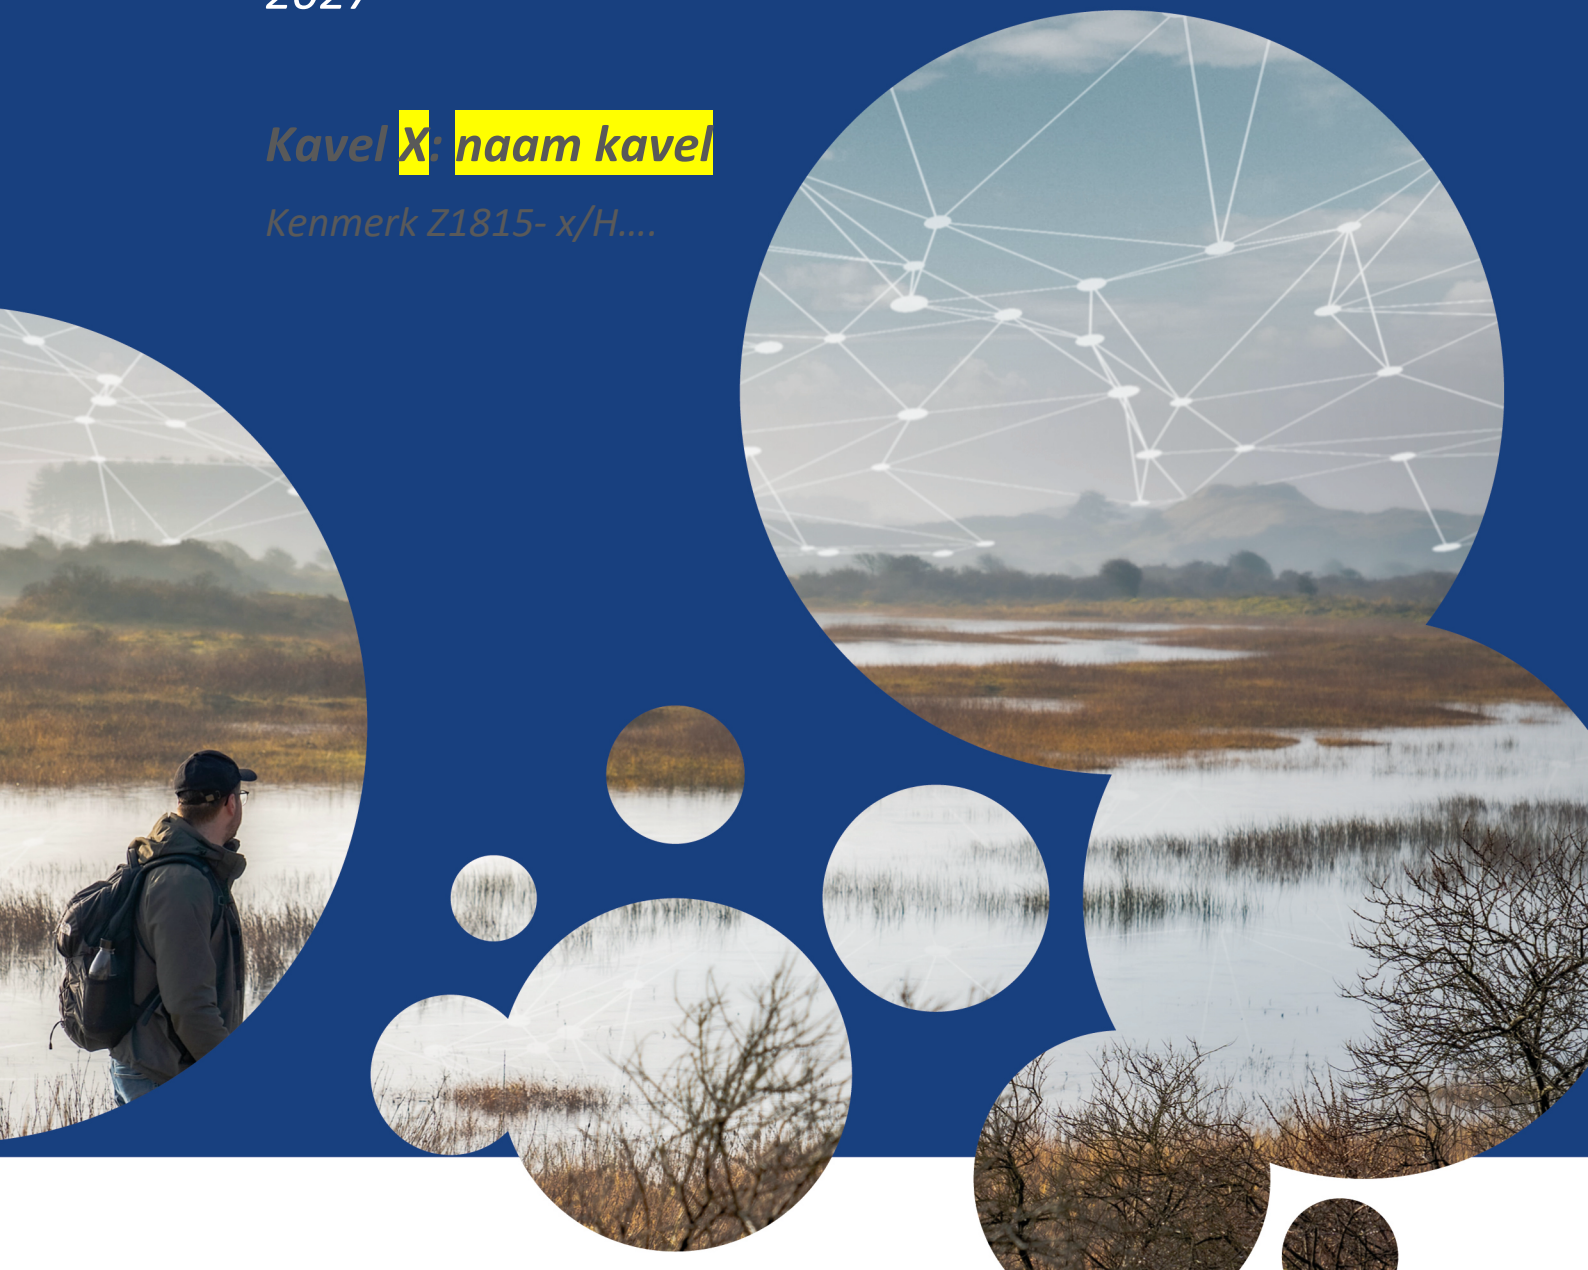

# Nadere Overeenkomst AHN6 – BM6 2025 / 2026 / 2027

## Kavel X: Naam kavel [voor elk Kavel een eigen Nadere Overeenkomst]

### Partijen

De Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis gevestigd in Amersfoort, hiertoe vertegenwoordigd door drs. G.J.A. Smits gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen: **Opdrachtgever**,  
en

<Naam Opdrachtnemer inclusief rechtspersoonlijkheid>, (statutair) gevestigd te <(postcode)> <stad>, aan <adres>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer><mevrouw> <titel> <voorletters> <achternaam>, <functie>, hierna te noemen 'Opdrachtnemer';

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als "Partijen" en afzonderlijk als "Partij";

### Nemen in aanmerking dat:

- a. Opdrachtgever en Opdrachtnemer de Raamovereenkomst AHN6 en BM 6 2024 / 20236 / 2027, Kavel <...X+Y...>, met kenmerk Zxxx/Hxxx zijn aangegaan;
- b. Partijen de afspraken in het kader van Kavel <....> in een Nadere Overeenkomst wensen vast te leggen;

### Verklaren het volgende overeen te komen:

#### Artikel 1. Definities

1. In deze Nadere Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Raamovereenkomst AHN6 en BM 6 2024 / 20236 / 2027 - <naam Opdrachtnemer Raamovereenkomst>, met kenmerk Zxxx/Hxxx.

#### Artikel 2. Voorwerp van de Overeenkomst

1. Deze Overeenkomst is een Nadere Overeenkomst in de zin van de in artikel 1 genoemde Raamovereenkomst.
2. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht, welke opdracht Opdrachtnemer hierbij aanvaardt, tot het verrichten van de inwinning, classificatie en vewerking van  
<OF> LIDAR data en Beeldmateriaal data voor Kavel <....> als beschreven in bijlage 4 van de Raamovereenkomst,  
<OF> Beeldmateriaal data voor Kavel <....> als beschreven in bijlage 4 van de Raamovereenkomst,  
overeenkomstig de eisen die voortvloeien uit de Raamovereenkomst en deze Nadere Overeenkomst.

- Op deze Nadere Overeenkomst is het bepaalde in de in artikel 1 genoemde Raamovereenkomst van toepassing.

### Artikel 3. Ingangsdatum en duur van de Nadere Overeenkomst

- Deze Nadere Overeenkomst komt tot stand door ondertekening door Partijen en duurt voort tot totdat het resultaat van de Diensten en leveringen is geaccepteerd door Opdrachtgever.
- De Overeenkomst bestaat uit maximaal 3 jaargangen: 2025, 2026 en 2027. De Overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor jaargang 2025. Opdrachtgever heeft het recht maar niet de verplichting om Opdrachtnemer de inwinning van de optionele jaargangen 2026 en 2027 op te dragen.
- Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk 15 september van het lopende contractjaar schriftelijk in kennis of hij het eerstvolgende optiejaar opdraagt aan Opdrachtnemer.

### Artikel 4. Planning

- Opdrachtnemer dient de hierna genoemde activiteiten of (sub)producten uiterlijk op de hieronder genoemde mijlpaaldatum te hebben uitgevoerd of geleverd.

Nr.	(Sub)product / activiteit	Mijlpaaldatum	Terugkoppeling door Opdrachtgever	Facturatieschema		
				Combi	AHN	BM
1	Vliegplan	15 december	Uiterlijk 2 weken na oplevering	10%	10%	10%
2A	Afronding inwinning BM Afronding inwinning Combi	23 april				
2B	Afronding inwinning AHN	23 maart				
3	Vluchtrapportage* <sup>1</sup>	2 weken na afronding inwinning perceel	Uiterlijk 2 weken na oplevering	15%	30%	15%
4	Luchtopnamen, camera kalibraties, vluchtrapport* <sup>2</sup> en beeldmiddenoverzicht en per blok	Uiterlijk 4 weken na afronding inwinning blok	Uiterlijk 1 week na oplevering	15%		15%
5	Quick ortho's	Uiterlijk 5 weken na afronding inwinning blok	Uiterlijk 1 week na oplevering	2,5%		5%
6A	Geometrisch correcte dataset in geval van Combi	8 weken na afronding inwinning perceel én in geen geval later later dan 18 juni	Rapport ingangscntrole volgt twee weken na levering Rapport kwaliteitscontrole 6 weken na levering	7,5%		
6B	Geometrisch correcte dataset in geval van AHN	8 weken na afronding inwinning perceel én in geen geval later later dan 18 mei	Rapport ingangscntrole volgt twee weken na levering Rapport kwaliteitscontrole 6 weken na levering		15%	
7	Orthofotomozaïeken	Uiterlijk 10 weken na afronding inwinning blok	Uiterlijk 2 weken na oplevering	10%		20%

8	Aerotriangulatie (AT) en blokvereffening incl. eventuele paspunten per blok	Uiterlijk 12 weken na afronding inwinning blok, uiterlijk	Uiterlijk 3 weken na oplevering	5%		10%
9A	Geclassificeerde dataset in geval van Combi	Uiterlijk 16 weken na afronding inwinning perceel, uiterlijk 13 augustus (daarna aanvang malus voor AHN)	Rapport ingangscontrolerapport volgt twee weken na levering Rapport kwaliteitscontrole 6 weken na levering	10%		
9B	Geclassificeerde dataset in geval van AHN	Uiterlijk 16 weken na afronding inwinning perceel, uiterlijk 12 juli (daarna aanvang malus voor AHN)	Rapport ingangscontrolerapport volgt twee weken na levering Rapport kwaliteitscontrole 6 weken na levering		20%	
10	Eindoplevering*3	Voor 1 oktober		25%	25%	25%
Totaal				100%	100%	100%

\*1 = Compleet overzicht van de gehele inwinperiode/ perceel.

\*2 = Compleet overzicht van het afgeronde blok.

\*3 - zie lid 4.

- De in lid 1 onder nr. 1 en nr. 3 genoemde (sub)producten dienen te worden geleverd aan het door Opdrachtgever daartoe beschikbaar gestelde e-mailadres.
- Opdrachtnemer levert de in lid 1 onder nr. 4 tot en met 10 genoemde (sub)producten door deze (sub)producten volledig in de door Opdrachtgever aangewezen cloudomgeving beschikbaar te stellen.
- Opdrachtnemer dient i dient na de laatste deellevering een evaluatierapport op te leveren en te bespreken met Opdrachtgever. In het evaluatierapport dient te worden ingegaan op de belangrijkste knelpunten, leerpunten en gesignaleerde risico's of kansen die voortvloeien uit de inwinning van het vigerende inwinningsjaar, met een vooruitblik voor een volgend inwinjaar. Het evaluatierapport is beperkt tot enkele pagina's. Van eindoplevering is sprake na bespreking en acceptatie van het evaluatierapport.

#### Artikel 5. Prijs en facturatie

- Opdrachtnemer levert de prestatie tegen een vaste totaalprijs per jaargang.
- De vaste totaalprijs per jaargang bedraagt op basis van artikel 4 van de Raamovereenkomst:
  - eerste jaargang (2025): € xxx,xx;
  - tweede jaargang (2026): € xxx,xx;
  - derde jaargang (2027): € xxx,xx.
- De in lid 2 genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
- De in lid 2 genoemde prijzen voor de tweede en derde jaargang zijn exclusief indexatie.
- De vaste totaalprijs voor de door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst te leveren prestaties is inclusief alle bijkomende voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde kosten, waaronder doch niet uitsluitend eventuele benodigde materialen, apparatuur, reis- en verblijfkosten. Opdrachtnemer kan onder geen beding andere of extra kosten in rekening brengen.
- Facturatie vindt plaats na acceptatie van de prestaties overeenkomstig het betaalschema in artikel 4.1.

#### Artikel 6. <eventueel optioneel kavelspecifiek additioneel artikel>

- <.....>

2. <.....>

7. Slotbepaling

1. Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend, Amersfoort.

Amersfoort,	XXX,
PLAATS DATUM	PLAATS DATUM
Het Waterschapshuis	XXXXXX
Namens deze	Namens deze

Secretaris-directeur	XXXX
Drs. G.J.A. Smits	XXXXX
