

### **Projectovereenstemming (POS)**

Contractnummer (casenr.) : C2329402/5915435

Contract betreffende : N 321.11 Grave – Cuijk, betreft reconstructie gedeelte Maasveld

aanleg rotondes en fietspaden t.h.v. Gassel

Documentnummer : N 321 POS voorcalc. D.19014 Enexis B.V.

### **De ondergetekenden:**

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, gevestigd te 's-Hertogenbosch te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. van Helvert, projectleider infrastructurele werken, hierna verder te noemen: "Verzoeker"

en

Enexis Beheer B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen "Beheerder",

Hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en ieder een "Partij".

### **Partijen zijn het volgende overeen gekomen:**

#### **1. Aanpassing**

Vanwege de reconstructie van de N321 gedeelte Maasveld t.h.v. Gassel, voert Beheerder de noodzakelijke aanpassingen aan zijn kabels en/of leidingen, vastgelegd in het definitief ontwerp met registratienummers; D.22777-LS, D.22777-LD en D.22777-MS d.d. 20-10-2023 (zie bijlage 3).

#### **2. Planning en Aanpassing**

1. Beheerder voert de aanpassingen aan zijn kabels en/of leidingen uit in overleg en samenwerking met de coördinerende partij namens de Provincie Noord Brabant. De coördinerende partij is de ON namens de Provincie Noord Brabant die de gehele civiele reconstructie aan de provinciale weg N 321 uitvoert. Uitgangspunt voor de uitvoeringstijd van de benodigde aanpassingen/verleggingen behorende tot categorie 2, plaatsvinden in de periode vanaf 1 Januari 2025 tot en met 31 December 2026.  
De detailplanning voor het aanpassen/verleggen k&l wordt tijdens uitvoeringsoverleggen georganiseerd door de ON met de beheerder nader afgestemd en vastgelegd.  
Deze vastgestelde detailplanning k&l maakt een belangrijk deel uit van de POS.  
De detailplanning moet ten minste 12 weken voor de benodigde werkzaamheden gedeeld zijn met de beheerder. Met dit termijn kan de beheerder de werkzaamheden opnemen in de planning.

2. Beheerder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en/of toestemmingen voor het uitvoeren van aanpassingen aan zijn kabels en/of leidingen. Indien de benodigde vergunningen en/ of toestemmingen niet tijdig verkregen zijn, dan wel er sprake is van overmacht, zullen de werkzaamheden in overleg als nodig worden opgeschort dan wel aangepast. Partijen zullen in dergelijke gevallen trachten de doorlooptijd waar mogelijk in te korten teneinde vertragingen te voorkomen c.q. te minimaliseren.
3. Beheerder dient zijn werk uit te voeren in overeenstemming met de coördinerende partij .....Infra BV (naam civiele aannemer) en deel te nemen aan eventuele V&G- afstemmingsoverleggen.
4. Binnen 30 werkdagen na gereed melding van de werkzaamheden overlegt beheerder aan opdrachtnemer de as built-gegevens van de aangepaste kabels en/of leidingen, tenzij Partijen onderling anders overeenkomen. Tussentijds zal door beheerder wekelijks een digitale deelrevisie worden verstrekt aan de opdrachtnemer.
5. Indien zich wijzigingen voordoen in het verleggingstracé k&l, zullen partijen hierover nader in overleg met elkaar treden.
6. Opdrachtnemer zal binnen de projectgrenzen van het Provinciaal Inpassingsplan aan beheerder een k&l- tracé aanbieden, welke op toekomstig maaiveld is gebracht, vrij toegankelijk en vrij van obstakels.  
Buiten de projectgrenzen behoort dit tot de verplichting van acceptant.
7. Opdrachtnemer zal éénmalig, voorafgaand aan de start van de uitvoeringswerkzaamheden van de beheerder, het tracé voor de kabel- en/of leiding aanpassingen door middel van piketten uitzetten. Tevens zal opdrachtnemer de uitzetgegevens in een digitaal bestand aanleveren in X-Y en Z coördinaten aan de beheerder.
8. Beheerder zal na gereedkomen van de werkzaamheden aantonen dat de geroerde grond verdicht is in de bermen (toekomstige bermen) tot een waarde van 1 mPa. Onder verhardingen (toekomstige verhardingen) geldt een verdichting van 4 mPa.
9. Het verwijderen van de buiten bedrijf gestelde kabels en/of leidingen behoort tot de verplichting van de beheerder.
10. Het toepassen van door de wegbeheerder goedgekeurde verkeersmaatregelen en tijdige communicatie naar de omgeving behoort eveneens tot de verplichting van de beheerder.
11. Beheerder verplicht zich de werkzaamheden, daar waar mogelijk, gezamenlijk met andere kabel –en leidingbeheerders uit te voeren, teneinde kosten- en of tijdsbesparing te bereiken.
12. De beheerder doet de startmelding uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden.
13. De schriftelijke startmelding en gereedmelding wordt door de beheerder gericht aan:  
Ad Wagenaars, projectcoördinator k&l namens de provincie Noord-Brabant (awagenaars@brabant.nl) en (naam coördinator k&l van de opdrachtnemer) namens de Fa. .... (.....@.....nl).

### **3. Kostenraming**

De kosten van de aanpassing zijn door beheerder geraamd op € 344.682,33.

Deze kostenraming is op basis van voorcalculatie en op basis van de DO- tekeningen met registratienummers; D.22777-LS, D.22777-LD en D.22777-MS d.d. 20-10-2023 (zie bijlage 3).

De kostenraming moet inzicht geven in de te verwachten te verwerken hoeveelheden, stuksprijzen, uren en prijzen per activiteit, alsmede een gespecificeerd overzicht van alle overige te verwachten kosten.

#### **4. Nadeelcompensatie**

Wanneer beheerder schade lijdt die niet (geheel) voor zijn rekening dient te komen kan beheerder conform de Regeling nadeelcompensatie wegens Noord-Brabant een vergoeding aanvragen bij Gedeputeerde Staten, die het nadeel vaststellen. De berekening van de hoogte van de nadeelcompensatie wordt door Gedeputeerde Staten aan de hand van de Regeling nadeelcompensatie wegens Noord-Brabant gedaan. Aan elders gemaakte afspraken kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze overeenkomst kan, wat betreft de hoogte van de nadeelcompensatievergoeding, geen rechten worden ontleend. Het staat de beheerder vrij om in de kostenraming de hoogte van de volgens hem te ontvangen nadeelcompensatie aan te geven. Deze indicatie heeft echter geen gevolgen voor de uiteindelijke hoogte van de te ontvangen nadeelcompensatie.

De schadevergoeding is op basis van de kostenraming (bijlage I) en de rechtsposities (bijlage 2) voorlopig geraamd op **€164.619,16**  
(zegge; honderd vier en zestig duizend, zes honderd negentien euro en zestien eurocent.)

#### **5. Afwijken van de in de Projectovereenstemming gemaakte afspraken**

Indien door of namens de verzoeker een andere aanpassing dan in de projectovereenstemming overeen gekomen aanpassing gewenst is, dan dient dit door of namens de verzoeker met de beheerder overeengekomen te worden. Deze wijziging van de projectovereenstemming dient, na instemming van de beheerder, middels een verzoek tot aanpassing aan de projectovereenstemming toegevoegd te worden.

#### **6. Contactpersonen**

Alle correspondentie met uitzondering van het verzoek om nadeelcompensatie dient onder vermelding van C2329402/5915435 te worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.

Contactpersoon namens Verzoeker:

Naam : A.A.P. Wagenaars

Adres : Brabantlaan 1

Plaats : 's-Hertogenbosch

Tel. nr. : 073-6808047/ 06-18303373

E-mail : awagenaars@Brabant.nl

Contactpersoon Beheerder:

Naam : Daan van Rhee

Adres : Reitscheweg 31

Plaats : 's-Hertogenbosch

Tel. nr. : 0621691302

E-mail : Daan.van.Rhee@enexis.nl

## 7. Ondertekening

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Verzoeker,  
T. Van Helvert



Namens de Beheerder,  
Bas Wehman



Plaats 's-Hertogenbosch  
Datum 30-04-2024

Plaats, 's-Hertogenbosch  
Datum

Bijlagen:

1. Kostenraming verlegging/aanpassing d.d. 20-10-2023;
2. De gegevens (kadastrale tekening bestaande ligging) omtrent de rechtspositie;
3. Definitief ontwerp aanpassing/verlegging, D.22777-LS, D.22777-LD en D.22777-MS d.d. 20-10-2023 (zie bijlage 3);
4. Detail/Tijdsplanning aanpassingen/verleggingen (door ON en beheerder nader af te stemmen, na gunning).

Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS f1-bl1

Provincie Noord-Brabant

|                                         |                             |                   |        |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Beheerder                               | Enexis Netbeheer B.V.       |                   |        |                |
| Knelpunt:                               | Rec N 321 D.22777-LS f1-bl1 |                   |        |                |
| Kabel/leiding:                          | 01047E-LS                   |                   |        |                |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter:   | 4x150Al, 4x6Cu - 1973       |                   |        |                |
| Prijspeil kostenraming:                 | november 2023               |                   |        |                |
| Onnauwkeurigheidsmarge:                 | +/- 10%                     |                   |        |                |
|                                         |                             |                   |        |                |
| Omschrijving                            | Eenheid                     | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag |
| 1. Materiaalkosten                      | st.                         | € 4.926,26        | 1      | € 4.926,26     |
|                                         |                             |                   |        |                |
| Totaal materiaalkosten                  |                             |                   |        | €              |
| 2. Kosten van uit en in bedrijf stellen | st.                         | € 518,40          |        | € 518,40       |
|                                         |                             |                   |        |                |
| Totaal uit en in bedrijfstellen         |                             |                   |        | €              |
| 3. Kosten van ontwerp en begeleiding    | st.                         | € 2.354,40        | 1      | € 2.354,40     |
|                                         |                             |                   |        |                |
| Totaal ontwerp en begeleiding           |                             |                   |        | €              |
| 4. Uitvoeringskosten                    | st.                         | € 11.114,54       | 1      | € 11.114,54    |
|                                         |                             |                   |        |                |
| Totaal uitvoeringskosten                |                             |                   |        | €              |
| Totaal begroting                        |                             |                   |        | € 18.913,60    |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f1-bl1**

**Provincie Noord-Brabant**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f1-bl1 |
| Kabel/leiding: | 01047E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | C      | 1619       | Provincie Noord Brabant                   | parallel                                 | 199                            | 97,55 %         |
| 2.            | Grave               | C      | 1619       | Provincie Noord Brabant                   | kruisend                                 | 5                              | 2,45 %          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>204</b>                     | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |         |
|----------------|---------|
| Parallel       | 97,55 % |
| Kruisend       | 2,45 %  |
| Buiten de weg  | 0,00 %  |
| Zakelijk recht | 0,00 %  |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>   |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 4.926,26         |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 518,40           |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 2.354,40        | € 0000,00          |
| Uitvoeringskosten            | € 272,42+         | € 10.039,00 +      |
|                              | <b>€ 2.626,82</b> | <b>€ 16.286,79</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f1-bl1**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f1-bl1 |
| Kabel/leiding:                        | 01048E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x16Cu - 1974               |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag    |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 263,91          | 1      | € 263,91          |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 0,00            |        | € 0,00            |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uit en in bedrijf stellen</b>        |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 844,56          | 1      | € 844,56          |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                   |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 2.727,32        | 1      | € 2.727,32        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 3.835,79</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f1-bl1**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f1-bl1 |
| Kabel/leiding: | 01048E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | C      | 1619       | Provincie Noord Brabant                   | kruisend                                 | 24                             | 100,00 %        |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>24</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 0,00 %   |
| Kruisend       | 100,00 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 263,91          |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 0000,00         |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 844,56          | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 2.727,32+       | € 0000,00 +       |
|                              | <b>€ 3.571,88</b> | <b>€ € 263,91</b> |



**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f1-bl1**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f1-bl1 |
| Kabel/leiding:                        | 01049E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x16Cu - 2005               |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag    |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 375,25          | 1      | € 375,25          |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 0,00            |        | € 0,00            |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 1.008,72        | 1      | € 1.008,72        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                   |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 3.657,25        | 1      | € 3.657,25        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 5.041,22</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f1-bl1**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f1-bl1 |
| Kabel/leiding: | 01049E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 2.            | Grave               | C      | 1619       | Provincie Noord Brabant                   | kruisend                                 | 25                             | 75,76%          |
| 3.            | Grave               | C      | 1293       | Gemeente Oss                              | buitenleiding                            | 8                              | 24,24%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>33</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |         |
|----------------|---------|
| Parallel       | 0,00 %  |
| Kruisend       | 75,76 % |
| Buiten de weg  | 24,24 % |
| Zakelijk recht | 0,00 %  |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b> |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 375,25         |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 0000,00        |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 1.008,72        | € 0000,00        |
| Uitvoeringskosten            | € 3.657,25+       | € 0000,00 +      |
|                              | <b>€ 4.665,97</b> | <b>€ 375,25</b>  |

**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f2-bl2**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f2-bl2 |
| Kabel/leiding:                        | 01052E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x95Al, 4x6Cu, 1974         |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag    |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 883,45          | 1      | € 883,45          |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 1.036,80        |        | € 1.036,80        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 1.240,92        | 1      | € 1.240,92        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                   |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 3.946,70        | 1      | € 3.946,70        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 7.107,87</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f2-bl2**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f2-bl2 |
| Kabel/leiding: | 01052E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | C      | 1354       | Gemeente Land van Cuijk                   | Langsliggend                             | 25                             | 74,76%          |
| 2.            | Grave               | C      | 1353       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 8                              | 24,24%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>33</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |         |
|----------------|---------|
| Parallel       | 74,76 % |
| Kruisend       | 24,24 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %  |
| Zakelijk recht | 0,00 %  |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 883,45          |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 1.036,80        |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 1.240,92        | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 956,78 +        | € € 2.989,92 +    |
|                              | <b>€ 2.197,70</b> | <b>€ 4.910,18</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f2-bl2**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f2-bl2 |
| Kabel/leiding:                        | 01050E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x6Cu, 2011                 |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 350,14          | 1      | € 350,14           |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 0,00            |        | € 0,00             |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijf stellen</b>        |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 2.107,08        | 1      | € 2.107,08         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 8.238,32        | 1      | € 8.238,32         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 10.695,54</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f2-bl2**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f2-bl2 |
| Kabel/leiding: | 01050E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | C      | 1618       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 25                             | 35,71%          |
| 2.            | Grave               | C      | 591        | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 10                             | 14,29%          |
| 3.            | Grave               | C      | 30         | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 20                             | 28,57%          |
| 4.            | Grave               | C      | 592        | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 15                             | 21,43%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>70</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 0,00 %   |
| Kruisend       | 100,00 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| Kostensoort                  | Verzoeker          | Beheerder       |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00          | € 350,14        |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00          | € 0000,00       |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 2.107,08         | € 0000,00       |
| Uitvoeringskosten            | € 8.238,32+        | € 0000,00 +     |
|                              | <b>€ 10.345,40</b> | <b>€ 350,14</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f2-bl2**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f2-bl2 |
| Kabel/leiding:                        | 01053E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x6Cu, 1974                 |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag    |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 46,17           | 1      | € 46,17           |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 0,00            |        | € 0,00            |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 681,48          | 1      | € 681,48          |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                   |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 1.107,38        | 1      | € 1.107,38        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 1.835,03</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f2-bl2**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f2-bl2 |
| Kabel/leiding: | 01053E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | C      | 1618       | Gemeente Land van Cuijk                   | Langsliggend                             | 50                             | 100,00%         |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>50</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 100,00 % |
| Kruisend       | 0,00 %   |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b> | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00        | € 46,17           |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00        | € 0000,00         |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 681,48         | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 0000,00 +      | € 1.107,38+       |
|                              | <b>€ 681,48</b>  | <b>€ 1.153,55</b> |



**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f2-bl2**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f2-bl2 |
| Kabel/leiding:                        | 02055E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x150Al, 2009               |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag    |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 2.355,75        | 1      | € 2.355,75        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 345,60          |        | € 345,60          |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 1.703,16        | 1      | € 1.703,16        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                   |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 4.718,62        | 1      | € 4.718,62        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 9.123,13</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f2-bl2**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f2-bl2 |
| Kabel/leiding: | 02055E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | C      | 1618       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 10                             | 14,29%          |
| 2.            | Grave               | C      | 1619       | Provincie Noord-Brabant                   | Kruisend                                 | 60                             | 85,71%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>70</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 0,00 %   |
| Kruisend       | 100,00 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 2.355,75        |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 345,60          |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 1.703,16        | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 4.718,62+       | € 0000,00 +       |
|                              | <b>€ 6.421,78</b> | <b>€ 2.701,35</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f3-bl3**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f3-bl3 |
| Kabel/leiding:                        | 02055E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x150Al, 2009               |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag    |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 867,63          | 1      | € 867,63          |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 0.00            |        | € 0,00            |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 1.479,60        | 1      | € 1.479,60        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                   |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 1.775,15        | 1      | € 1.775,15        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 4.122,38</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f3-bl3**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f3-bl3 |
| Kabel/leiding: | 02055E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | L      | 1936       | Provincie Noord-Brabant                   | Langsliggend                             | 30                             | 100,00%         |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>30</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 100,00 % |
| Kruisend       | 0,00 %   |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 867,63          |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 0000,00         |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 1.479,60        | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 0000,00 +       | € 1.775,15+       |
|                              | <b>€ 1.479,60</b> | <b>€ 2.642,78</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f3-bl3**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f3-bl3 |
| Kabel/leiding:                        | 02056E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x95Al, 4x6Cu, 1961         |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 2.727,43        | 1      | € 2.727,43         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 345,60          |        | € 345,60           |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 1.990,44        | 1      | € 1.990,44         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 11.307,85       | 1      | € 11.307,85        |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 16.371,32</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f3-bl3**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f3-bl3 |
| Kabel/leiding: | 02056E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | L      | 1029       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 10                             | 9,52%           |
| 2.            | Grave               | L      | 1936       | Provincie Noord-Brabant                   | Kruisend                                 | 60                             | 57,14%          |
| 3.            | Grave               | L      | 1619       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 20                             | 19,05%          |
| 4.            | Grave               | L      | 1024       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 15                             | 14,29%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>105</b>                     | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 0,00 %   |
| Kruisend       | 100,00 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| Kostensoort                  | Verzoeker          | Beheerder         |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00          | € 2.727,43        |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00          | € 345,60          |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 1.990,44         | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 11.307,85+       | € 0000,00 +       |
|                              | <b>€ 13.298,29</b> | <b>€ 3.073,03</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f3-bl3 / LS-f4-bl4**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.                |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f3-bl3 / f4-bl4 |
| Kabel/leiding:                        | 02057E-LS                            |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x50Cu, 4x6Cu, 1961                  |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023                        |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                              |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 7.020,10        | 1      | € 7.020,10         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 0,00            |        | € 0,00             |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 3.204,36        | 1      | € 3.204,36         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 17.429,18       | 1      | € 17.429,18        |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 27.653,64</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f3-bl3 LS-f4-bl4**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.                |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f3-bl3 / f4-bl4 |
| Kabel/leiding: | 02057E-LS                            |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | L      | 1936       | Provincie Noord-Brabant                   | Parallel                                 | 245                            | 80,33%          |
| 2.            | Grave               | L      | 1163       | Gemeente Land van Cuijk                   | Parallel                                 | 60                             | 25,53%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>305</b>                     | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 100,00 % |
| Kruisend       | 0,00 %   |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>   |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 7.020,10         |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 0000,00          |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 3.204,36        | € 12.246,53        |
| Uitvoeringskosten            | € 0000,00 +       | € 17.429,18+       |
|                              | <b>€ 3.204,36</b> | <b>€ 24.449,28</b> |



**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f4-bl4**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f4-bl4 |
| Kabel/leiding:                        | 03058E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x50Cu, 4x6Cu, 1961         |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag  |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-----------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 0,00            | 1      | € 0,00          |
|                                                |         |                   |        |                 |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>        |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 0,00            |        | € 0,00          |
|                                                |         |                   |        |                 |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>        |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 611,28          | 1      | € 611,28        |
|                                                |         |                   |        |                 |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                 |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 302,62          | 1      | € 302,62        |
|                                                |         |                   |        |                 |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>        |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 913,90</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f4-bl4**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f4-bl4 |
| Kabel/leiding: | 03058E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | L      | 1936       | Provincie Noord-Brabant                   | Parallel                                 | 10                             | 50,00%          |
| 2.            | Grave               | L      | 1163       | Gemeente Land van Cuijk                   | Parallel                                 | 10                             | 50,00%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>20</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 100,00 % |
| Kruisend       | 0,00 %   |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b> | <b>Beheerder</b> |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00        | € 0000,00        |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00        | € 0000,00        |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 611,28         | € 0000,00        |
| Uitvoeringskosten            | € 0000,00 +      | € 302,62+        |
|                              | <b>€ 611,28</b>  | <b>€ 302,62</b>  |

**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f5-bl5**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f5-bl5 |
| Kabel/leiding:                        | 04059E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x95Al, 1961                |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 3.520,32        | 1      | € 3.520,32         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 345,60          |        | € 345,60           |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 1.642,68        | 1      | € 1.642,68         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 10.439,09       | 1      | € 10.439,09        |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 15.947,68</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f5-bl5**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f5-bl5 |
| Kabel/leiding: | 04059E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | L      | 1936       | Provincie Noord-Brabant                   | Parallel                                 | 2                              | 1,04%           |
| 2.            | Grave               | L      | 1936       | Provincie Noord-Brabant                   | Parallel                                 | 190                            | 98,96%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>192</b>                     | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 100,00 % |
| Kruisend       | 0,00 %   |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>   |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 3.520,32         |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 345,60           |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 1.642,68        | € 0000,00          |
| Uitvoeringskosten            | € 0000,00 +       | € 10.439,09+       |
|                              | <b>€ 1.642,68</b> | <b>€ 14.305,00</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f5-bl5**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f5-bl5 |
| Kabel/leiding:                        | 04060E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x6Cu, 1990                 |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag    |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 46,17           | 1      | € 46,17           |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 0,00            |        | € 0,00            |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uit en in bedrijf stellen</b>        |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 854,28          | 1      | € 854,28          |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                   |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 557,10          | 1      | € 557,10          |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 1.457,55</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f5-bl5**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f5-bl5 |
| Kabel/leiding: | 04060E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | L      | 1936       | Provincie Noord-Brabant                   | Kruisend                                 | 30                             | 100,00%         |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>30</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 0,00 %   |
| Kruisend       | 100,00 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b> |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 46,17          |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 0000,00        |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 854,28          | € 0000,00        |
| Uitvoeringskosten            | € 557,10, +       | € 0000,00+       |
|                              | <b>€ 1.411,38</b> | <b>€ 46,17</b>   |

**Bijlage 1: Kostenraming: Laagspanning, tekening D.22777-LS-f5-bl5**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LS f5-bl5 |
| Kabel/leiding:                        | 04061E-LS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 4x50Cu, 4x6Cu, 1961         |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 6.210,87        | 1      | € 6.210,87         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 0,00            |        | € 0,00             |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 3.540,24        | 1      | € 3.540,24         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 25.311,26       | 1      | € 25.311,26        |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 35.062,37</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Laagspanning, tekening D.22777-LS f5-bl5**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LS f5-bl5 |
| Kabel/leiding: | 04061E-LS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | L      | 1832       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 10                             | 9,09%           |
| 2.            | Grave               | M      | 249        | Provincie Noord-Brabant                   | Kruisend                                 | 50                             | 45,45%          |
| 3.            | Grave               | M      | 251        | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 50                             | 45,45%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>110</b>                     | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 0,00 %   |
| Kruisend       | 100,00 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>   | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00          | € 6.210,87        |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00          | € 0000,00         |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 3.540,24         | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 25.311,26+       | € 0000,00+        |
|                              | <b>€ 28.851,50</b> | <b>€ 6.210,87</b> |



**Bijlage 1: Kostenraming: Middenspanning, tekening D.22777-MS-f2-bl1**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-MS-f2-bl1 |
| Kabel/leiding:                        | 01071E-MS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 3x35Cu, 1961                |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 6.768,08        | 1      | € 6.768,08         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 1.123,20        |        | € 1.123,20         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 3.796,20        | 1      | € 3.796,20         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 17.504,08       | 1      | € 17.504,08        |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 29.191,56</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Middenspanning, tekening D.22777-MS f2-bl1**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-MS-f2-bl1 |
| Kabel/leiding: | 01071E-MS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | C      | 1619       | Provincie Noord-Brabant                   | Parallel                                 | 160                            | 72,73%          |
| 2.            | Grave               | C      | 1619       | Provincie Noord-Brabant                   | Kruisend                                 | 40                             | 18,18%          |
| 3.            | Grave               | C      | 1618       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 20                             | 9,09%           |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>220</b>                     | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |         |
|----------------|---------|
| Parallel       | 72,73%  |
| Kruisend       | 27,27 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %  |
| Zakelijk recht | 0,00 %  |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>   |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 6.768,08         |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 1.123,20         |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 3.796,20        | € 0000,00          |
| Uitvoeringskosten            | € 4.773,84+       | € 12.730,24+       |
|                              | <b>€ 8.570,04</b> | <b>€ 20.621,52</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Middenspanning, tekening D.22777-MS-f2-bl1 / tekening D.22777-MS-f3-bl2**

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.                   |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-MS-f2-bl1 / MS-f3-bl2 |
| Kabel/leiding:                        | 02072E-MS                               |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 3x35Cu, 1961                            |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023                           |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                                 |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 10.482,00       | 1      | € 10.482,00        |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 864,00          |        | € 864,00           |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 2.008,80        | 1      | € 2.008,80         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 29.326,59       | 1      | € 29.326,59        |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 42.681,39</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Middenspanning, tekening D.22777-MS f2-bl1 / tekening D.22777-MS-f3-bl2**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.                   |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-MS-f2-bl1 / MS-f3-bl2 |
| Kabel/leiding: | 02072E-MS                               |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | C      | 1619       | Provincie Noord-Brabant                   | Parallel                                 | 225                            | 50,00%          |
| 2.            | Grave               | L      | 1936       | Provincie Noord-Brabant                   | Parallel                                 | 225                            | 50,00%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>450</b>                     | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |         |
|----------------|---------|
| Parallel       | 100,00% |
| Kruisend       | 0,00 %  |
| Buiten de weg  | 0,00 %  |
| Zakelijk recht | 0,00 %  |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>   |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 10.482,00        |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 864,00           |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 2.008,80        | € 0000,00          |
| Uitvoeringskosten            | € 0000,00+        | € 29.326,59+       |
|                              | <b>€ 2.008,80</b> | <b>€ 40.672,59</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Middenspanning, tekening D.22777-MS-f4-bl3**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-MS-f4-bl3 |
| Kabel/leiding:                        | 02072E-MS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 3x35Cu, 1961                |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 5.348,72        | 1      | € 5.348,72         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 0,00            |        | € 0,00             |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 2.440,80        | 1      | € 2.440,80         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 10.563,33       | 1      | € 10.563,33        |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 18.352,84</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Middenspanning, tekening D.22777- MS-f4-bl3**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-MS-f4-bl3 |
| Kabel/leiding: | 02072E-MS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | C      | 1936       | Provincie Noord-Brabant                   | Parallel                                 | 90                             | 50,00%          |
| 2.            | Grave               | L      | 1163       | Gemeente Land van Cuijk                   | Parallel                                 | 90                             | 50,00%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>180</b>                     | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |         |
|----------------|---------|
| Parallel       | 100,00% |
| Kruisend       | 0,00 %  |
| Buiten de weg  | 0,00 %  |
| Zakelijk recht | 0,00 %  |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>   |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 5.348,72         |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 0000,00          |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 2.440,80        | € 0000,00          |
| Uitvoeringskosten            | € 0000,00+        | € 10.563,33+       |
|                              | <b>€ 2.440,80</b> | <b>€ 15.912,04</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Middenspanning, tekening D.22777-MS-f5-bl4**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-MS-f5-bl4 |
| Kabel/leiding:                        | 04073E-MS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 3x35Cu, 1957                |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 4.954,75        | 1      | € 4.954,75         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 0,00            |        | € 0,00             |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 3.906,36        | 1      | € 3.906,36         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 19.457,66       | 1      | € 19.457,66        |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 28.318,77</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Middenspanning, tekening D.22777- MS-f5-bl4**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-MS-f5-bl4 |
| Kabel/leiding: | 04073E-MS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | M      | 249        | Provincie Noord-Brabant                   | Kruisend                                 | 50                             | 37,04%          |
| 2.            | Grave               | M      | 251        | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 55                             | 40,74%          |
| 3.            | Grave               | L      | 1845       | Gemeente Land van Cuijk                   | kruisend                                 | 10                             | 7,41%           |
| 4.            | Grave               | L      | 1845       | Gemeente Land van Cuijk                   | langsliggend                             | 10                             | 7,41%           |
| 5.            | Grave               | L      | 1832       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 10                             | 7,41%           |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>135</b>                     | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |         |
|----------------|---------|
| Parallel       | 7,41%   |
| Kruisend       | 92,59 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %  |
| Zakelijk recht | 0,00 %  |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>   | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00          | € 4.954,75        |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00          | € 0000,00         |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 3.906,36         | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 18.016,35+       | € 1.441,31+       |
|                              | <b>€ 21.922,71</b> | <b>€ 6.396,06</b> |



**Bijlage 1: Kostenraming: Middenspanning, tekening D.22777-MS-f6-bl5**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-MS-f6-bl5 |
| Kabel/leiding:                        | 04073E-MS                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 3x35Cu, 1961                |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 2.689,05        | 1      | € 2.689,05         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 345,60          |        | € 345,60           |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 2.034,72        | 1      | € 2.034,72         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 5.535,79        | 1      | € 5.535,79         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 10.605,16</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Middenspanning, tekening D.22777- MS-f6-bl5**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-MS-f6-bl5 |
| Kabel/leiding: | 04073E-MS                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | M      | 249        | Provincie Noord-Brabant                   | langsliggend                             | 80                             | 88,89%          |
| 2.            | Grave               | L      | 1384       | Gemeente Land van Cuijk                   | langsliggend                             | 10                             | 11,11%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>90</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |         |
|----------------|---------|
| Parallel       | 100,00% |
| Kruisend       | 0,00 %  |
| Buiten de weg  | 0,00 %  |
| Zakelijk recht | 0,00 %  |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 2.689,05        |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 345,60          |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 2.034,72        | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 0000,00+        | € 5.535,79+       |
|                              | <b>€ 2.034,72</b> | <b>€ 8.570,44</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Lagedruk, tekening D.22777-LD-f3-bl1**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LD-f3-bl1 |
| Kabel/leiding:                        | 01075G-LD                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 160 SPVC, 2014              |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 1.316,15        | 1      | € 1.316,15         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 259,20          |        | € 259,20           |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijf stellen</b>        |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 2.426,76        | 1      | € 2.426,76         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 12.372,18       | 1      | € 12.372,18        |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 16.374,29</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Lagedruk, tekening D.22777-LD-f3-bl1**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LD-f3-bl1 |
| Kabel/leiding: | 01075G-LD                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | L      | 1936       | Provincie Noord-Brabant                   | Kruisend                                 | 60                             | 66,67%          |
| 2.            | Grave               | L      | 1619       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 20                             | 22,22%          |
| 3.            | Grave               | L      | 1024       | Gemeente Land van Cuijk                   | kruisend                                 | 10                             | 11,11%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>90</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 0,00%    |
| Kruisend       | 100,00 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>   | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 210,58           | € 1.105,56        |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00          | € 259,20          |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 2.426,76         | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 12.372,18+       | € 0000,00+        |
|                              | <b>€ 15.009,52</b> | <b>€ 1.364,76</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Lagedruk, tekening D.22777-LD-f4-bl2**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LD-f4-bl2 |
| Kabel/leiding:                        | 02076G-LD                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 160 SPVC, 2011              |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag    |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 536,39          | 1      | € 536,39          |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 691,20          |        | € 691,20          |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uit en in bedrijfstellen</b>         |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 2.296,08        | 1      | € 2.296,08        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                   |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 1.004,36        | 1      | € 1.004,36        |
|                                                |         |                   |        |                   |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>          |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 4.528,03</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Lagedruk, tekening D.22777-LD-f4-bl2**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LD-f4-bl2 |
| Kabel/leiding: | 02076G-LD                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | L      | 1936       | Provincie Noord-Brabant                   | Kruisend                                 | 35                             | 100,00%         |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>35</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 0,00%    |
| Kruisend       | 100,00 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>  | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00         | € 536,39          |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00         | € 691,20          |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 2.296,08        | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 1.004,36+       | € 0000,00+        |
|                              | <b>€ 3.300,44</b> | <b>€ 1.227,59</b> |

**Bijlage 1: Kostenraming: Lagedruk, tekening D.22777-LD-f5-bl3**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LD-f5-bl3 |
| Kabel/leiding:                        | 04078G-LD                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 160 SPVC, 1980              |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 4.644,40        | 1      | € 4.644,40         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 691,20          |        | € 691,20           |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijf stellen</b>        |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 3.122,28        | 1      | € 3.122,28         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 14.723,80       | 1      | € 14.723,80        |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 23.181,68</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Lagedruk, tekening D.22777-LD-f5-bl3**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LD-f5-bl3 |
| Kabel/leiding: | 04078G-LD                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | L      | 1845       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 15                             | 9,09%           |
| 2.            | Grave               | M      | 249        | Provincie Noord-Brabant                   | Kruisend                                 | 65                             | 39,39%          |
| 3.            | Grave               | M      | 251        | Gemeente Land van Cuijk                   | kruisend                                 | 85                             | 51,52%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>165</b>                     | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 0,00%    |
| Kruisend       | 100,00 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>   | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00          | € 4.644,40        |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00          | € 691,20          |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 3.122,28         | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 14.723,80+       | € 0000,00+        |
|                              | <b>€ 17.846,08</b> | <b>€ 5.335,60</b> |



**Bijlage 1: Kostenraming: Lagedruk, tekening D.22777-LD-f6-bl4**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beheerder                             | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:                             | Rec N 321 D.22777-LD-f6-bl4 |
| Kabel/leiding:                        | 04080G-LD                   |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter: | 160 SPVC, 1980              |
| Prijspeil kostenraming:               | november 2023               |
| Onnauwkeurigheidsmarge:               | +/- 10%                     |

| Omschrijving                                   | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Begroot bedrag     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>1. Materiaalkosten</b>                      | st.     | € 2.373,23        | 1      | € 2.373,23         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal materiaalkosten</b>                  |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>2. Kosten van uit en in bedrijf stellen</b> | st.     | € 518,40          |        | € 518,40           |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uit en in bedrijf stellen</b>        |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>3. Kosten van ontwerp en begeleiding</b>    | st.     | € 1.656,72        | 1      | € 1.656,72         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal ontwerp en begeleiding</b>           |         |                   |        |                    |
| <b>4. Uitvoeringskosten</b>                    | st.     | € 8.819,24        | 1      | € 8.819,24         |
|                                                |         |                   |        |                    |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                |         |                   |        | <b>€</b>           |
| <b>Totaal begroting</b>                        |         |                   |        | <b>€ 13.367,58</b> |

**Bijlage 2: Gegevens rechtsposities: Lagedruk, tekening D.22777-LD-f6-bl4**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Beheerder:     | Enexis Netbeheer B.V.       |
| Knelpunt:      | Rec N 321 D.22777-LD-f6-bl4 |
| Kabel/leiding: | 04080G-LD                   |

| Nr.           | Kadastrale gemeente | Sectie | Perceel-nr | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding Verzoeker | Afstand leiding binnen perceel | Percentage      |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.            | Grave               | L      | 1384       | Gemeente Land van Cuijk                   | Kruisend                                 | 20                             | 28,57%          |
| 2.            | Grave               | M      | 249        | Provincie Noord-Brabant                   | Kruisend                                 | 50                             | 71,43%          |
|               |                     |        |            |                                           |                                          |                                |                 |
| <b>totaal</b> |                     |        |            |                                           |                                          | <b>70</b>                      | <b>100,00 %</b> |

**Verhoudingen in percentages:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Parallel       | 0,00%    |
| Kruisend       | 100,00 % |
| Buiten de weg  | 0,00 %   |
| Zakelijk recht | 0,00 %   |

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:

| <b>Kostensoort</b>           | <b>Verzoeker</b>   | <b>Beheerder</b>  |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Materiaalkosten              | € 0000,00          | € 2.373,23        |
| Kosten uit/in bedrijf        | € 0000,00          | € 518,40          |
| Kosten ontwerp & begeleiding | € 1.656,72         | € 0000,00         |
| Uitvoeringskosten            | € 8.819,24+        | € 0000,00+        |
|                              | <b>€ 10.475,96</b> | <b>€ 2.891,63</b> |

[illegible]

The drawing is a technical plan view of a road intersection and bridge. It features a multi-lane road with a bridge crossing a waterway. The drawing is color-coded with pink, blue, and green lines and shapes. A detailed legend is located at the bottom right, listing various symbols and their corresponding road features.

| Symbol                   | Legend                             |
|--------------------------|------------------------------------|
| [Pink line]              | Projektová čára                    |
| [Blue line]              | Stávající čára                     |
| [Green line]             | Stávající čára                     |
| [Pink circle]            | Stávající okružní značení          |
| [Blue circle]            | Stávající okružní značení          |
| [Pink rectangle]         | Stávající obdélníkové značení      |
| [Blue rectangle]         | Stávající obdélníkové značení      |
| [Pink triangle]          | Stávající trojúhelníkové značení   |
| [Blue triangle]          | Stávající trojúhelníkové značení   |
| [Pink arrow]             | Stávající šipové značení           |
| [Blue arrow]             | Stávající šipové značení           |
| [Pink cross]             | Stávající křížové značení          |
| [Blue cross]             | Stávající křížové značení          |
| [Pink T-shape]           | Stávající T-ovské značení          |
| [Blue T-shape]           | Stávající T-ovské značení          |
| [Pink Y-shape]           | Stávající Y-ovské značení          |
| [Blue Y-shape]           | Stávající Y-ovské značení          |
| [Pink Z-shape]           | Stávající Z-ovské značení          |
| [Blue Z-shape]           | Stávající Z-ovské značení          |
| [Pink diamond]           | Stávající diamantové značení       |
| [Blue diamond]           | Stávající diamantové značení       |
| [Pink circle with cross] | Stávající kruhové značení s křížem |
| [Blue circle with cross] | Stávající kruhové značení s křížem |
| [Pink circle with dot]   | Stávající kruhové značení s tečkou |
| [Blue circle with dot]   | Stávající kruhové značení s tečkou |
| [Pink circle with X]     | Stávající kruhové značení s X      |
| [Blue circle with X]     | Stávající kruhové značení s X      |
| [Pink circle with V]     | Stávající kruhové značení s V      |
| [Blue circle with V]     | Stávající kruhové značení s V      |
| [Pink circle with W]     | Stávající kruhové značení s W      |
| [Blue circle with W]     | Stávající kruhové značení s W      |
| [Pink circle with U]     | Stávající kruhové značení s U      |
| [Blue circle with U]     | Stávající kruhové značení s U      |
| [Pink circle with T]     | Stávající kruhové značení s T      |
| [Blue circle with T]     | Stávající kruhové značení s T      |
| [Pink circle with S]     | Stávající kruhové značení s S      |
| [Blue circle with S]     | Stávající kruhové značení s S      |
| [Pink circle with R]     | Stávající kruhové značení s R      |
| [Blue circle with R]     | Stávající kruhové značení s R      |
| [Pink circle with Q]     | Stávající kruhové značení s Q      |
| [Blue circle with Q]     | Stávající kruhové značení s Q      |
| [Pink circle with P]     | Stávající kruhové značení s P      |
| [Blue circle with P]     | Stávající kruhové značení s P      |
| [Pink circle with O]     | Stávající kruhové značení s O      |
| [Blue circle with O]     | Stávající kruhové značení s O      |
| [Pink circle with N]     | Stávající kruhové značení s N      |
| [Blue circle with N]     | Stávající kruhové značení s N      |
| [Pink circle with M]     | Stávající kruhové značení s M      |
| [Blue circle with M]     | Stávající kruhové značení s M      |
| [Pink circle with L]     | Stávající kruhové značení s L      |
| [Blue circle with L]     | Stávající kruhové značení s L      |
| [Pink circle with K]     | Stávající kruhové značení s K      |
| [Blue circle with K]     | Stávající kruhové značení s K      |
| [Pink circle with J]     | Stávající kruhové značení s J      |
| [Blue circle with J]     | Stávající kruhové značení s J      |
| [Pink circle with I]     | Stávající kruhové značení s I      |
| [Blue circle with I]     | Stávající kruhové značení s I      |
| [Pink circle with H]     | Stávající kruhové značení s H      |
| [Blue circle with H]     | Stávající kruhové značení s H      |
| [Pink circle with G]     | Stávající kruhové značení s G      |
| [Blue circle with G]     | Stávající kruhové značení s G      |
| [Pink circle with F]     | Stávající kruhové značení s F      |
| [Blue circle with F]     | Stávající kruhové značení s F      |
| [Pink circle with E]     | Stávající kruhové značení s E      |
| [Blue circle with E]     | Stávající kruhové značení s E      |
| [Pink circle with D]     | Stávající kruhové značení s D      |
| [Blue circle with D]     | Stávající kruhové značení s D      |
| [Pink circle with C]     | Stávající kruhové značení s C      |
| [Blue circle with C]     | Stávající kruhové značení s C      |
| [Pink circle with B]     | Stávající kruhové značení s B      |
| [Blue circle with B]     | Stávající kruhové značení s B      |
| [Pink circle with A]     | Stávající kruhové značení s A      |
| [Blue circle with A]     | Stávající kruhové značení s A      |

[illegible][illegible]

Technical drawing of a road intersection and surrounding urban area. The drawing shows a main road with a roundabout and several side streets. Buildings are represented by simple outlines, and green areas indicate vegetation. The drawing is color-coded with red dashed lines for property boundaries and blue lines for road infrastructure. A legend at the bottom right explains the symbols used.

**Legend:**


- Red dashed lines:** Property boundaries (Grundergrundbesitz).
- Blue lines:** Road infrastructure (Straßen, Wege, etc.).
- Green areas:** Vegetation (Grünflächen).
- Black lines:** Building outlines (Gebäude).
- Yellow areas:** Other land use or planning zones.

**Scale:** 1:500


**North Arrow:** Indicated by a small arrow pointing towards the top right of the drawing.

[illegible][illegible]


D22777-MS -f4-b13

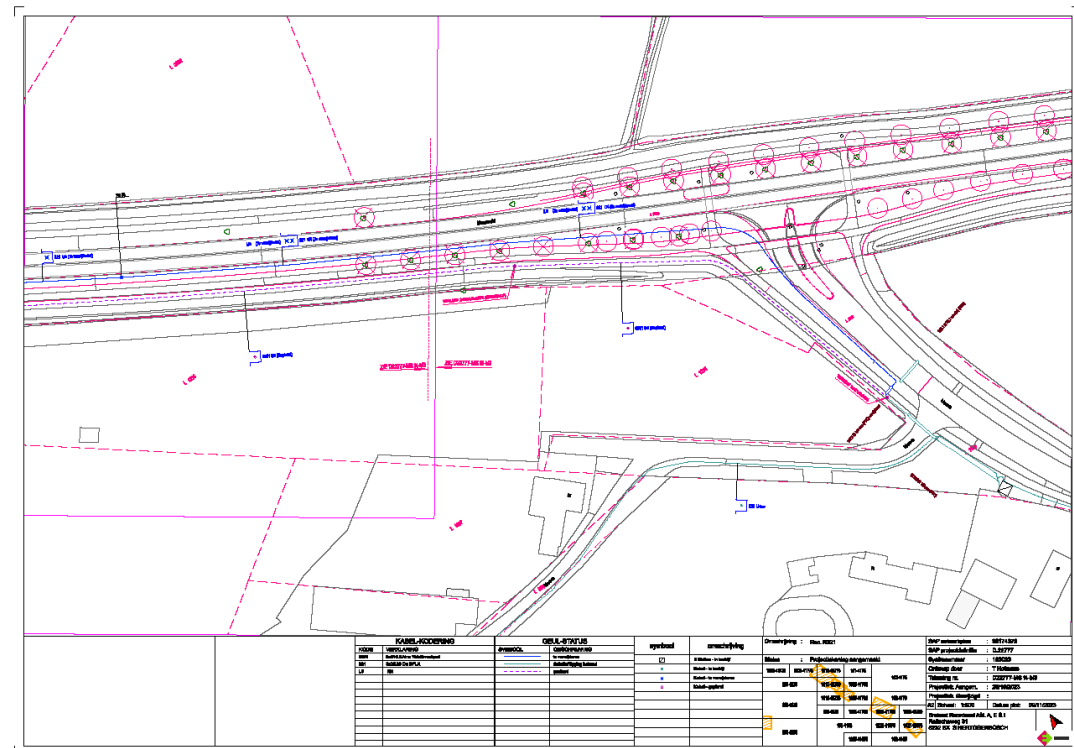

D22777-MS -f5-b14

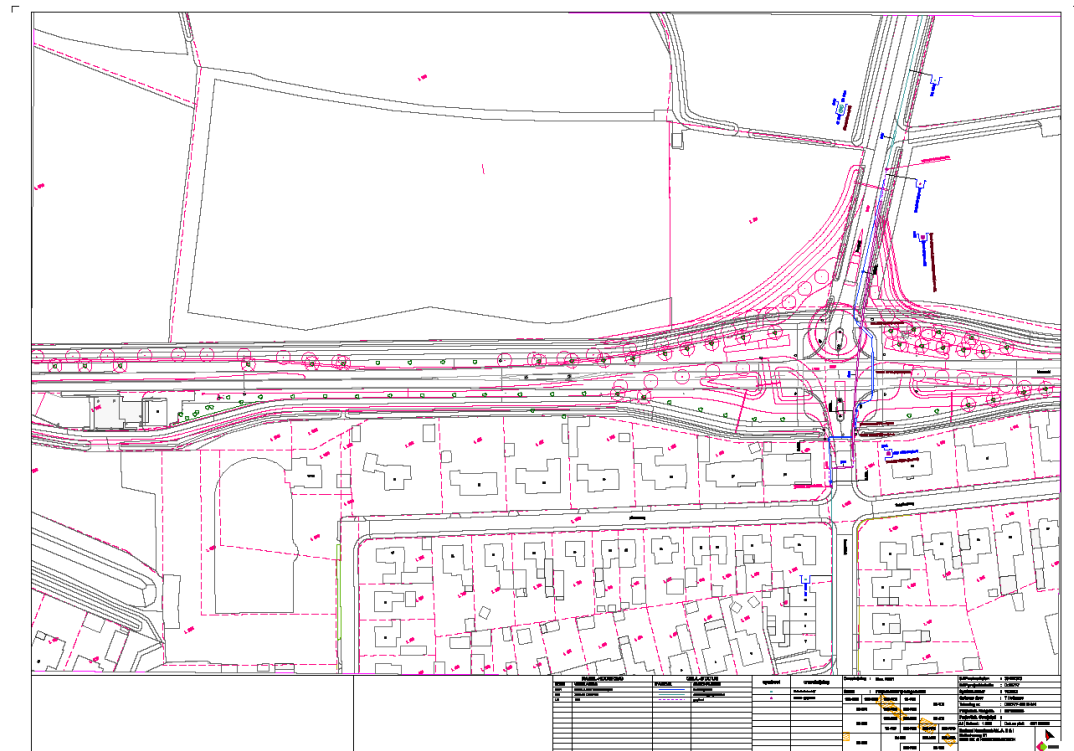


N 321 POS voorcalc. D.19014 Enexis B.V. concept

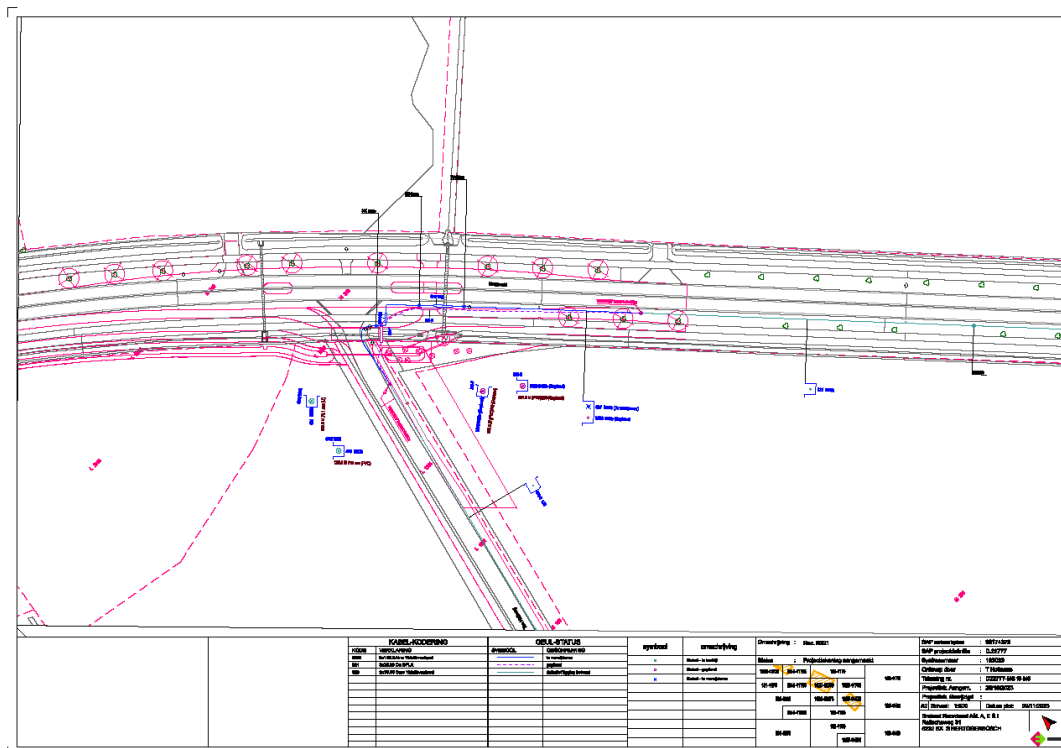




Lagedruk gasnet tekeningen: D22777-LD f3-bl1

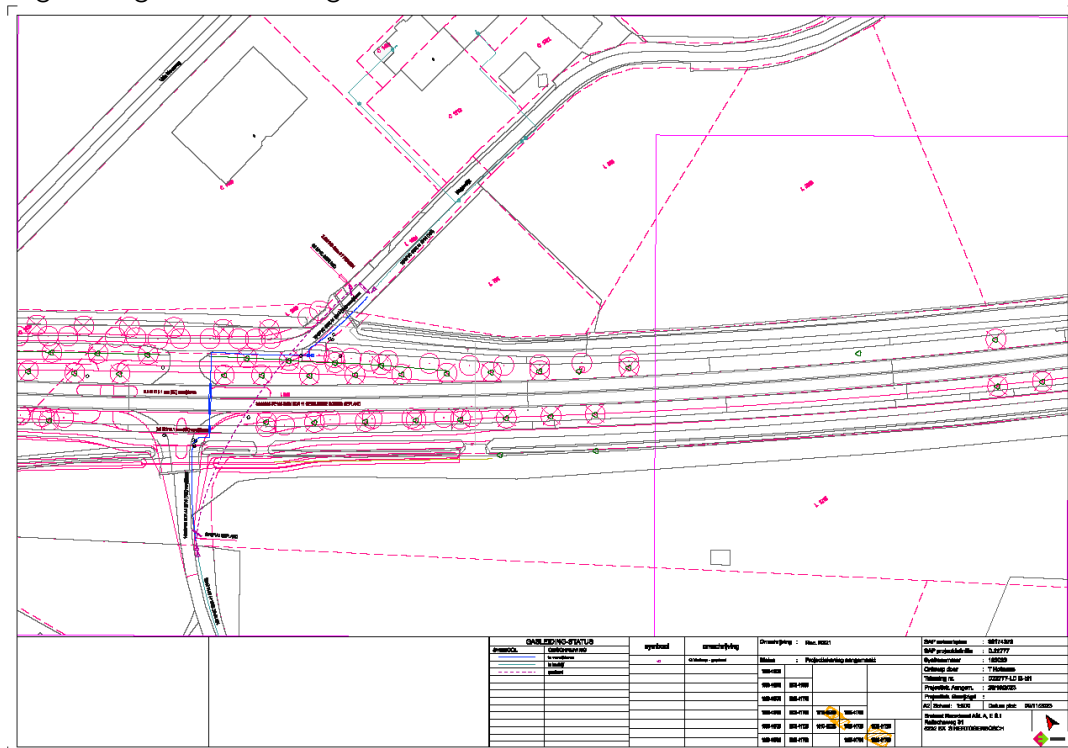

D22777-LD f4-b12

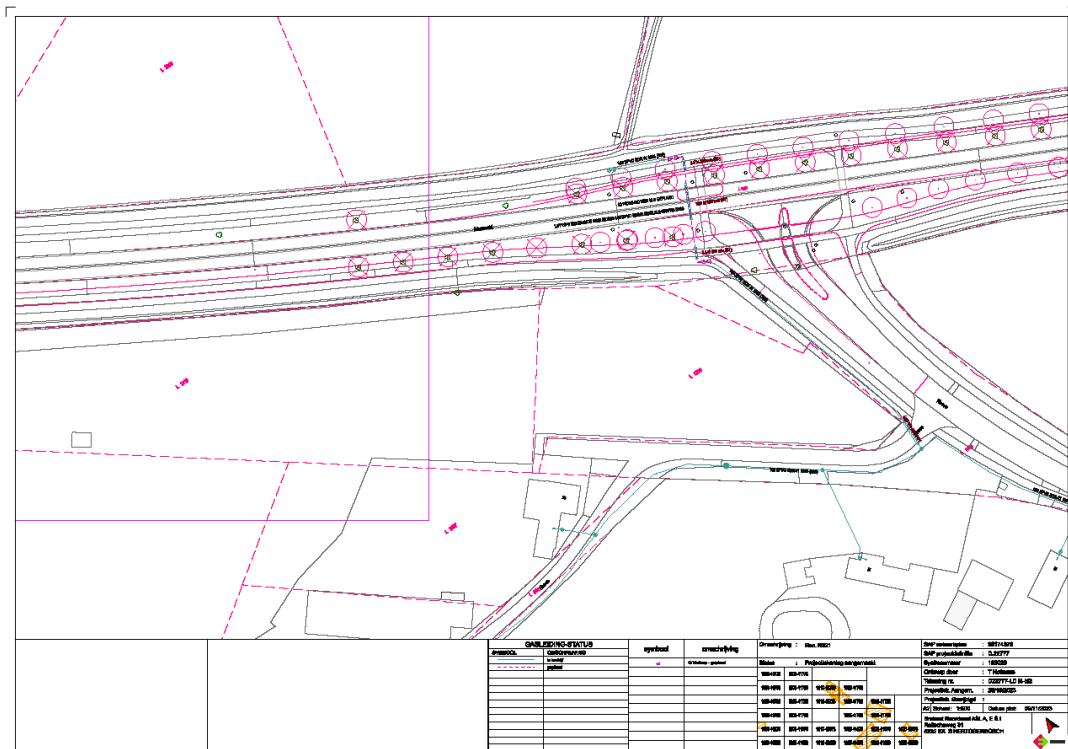

[illegible][illegible]
