




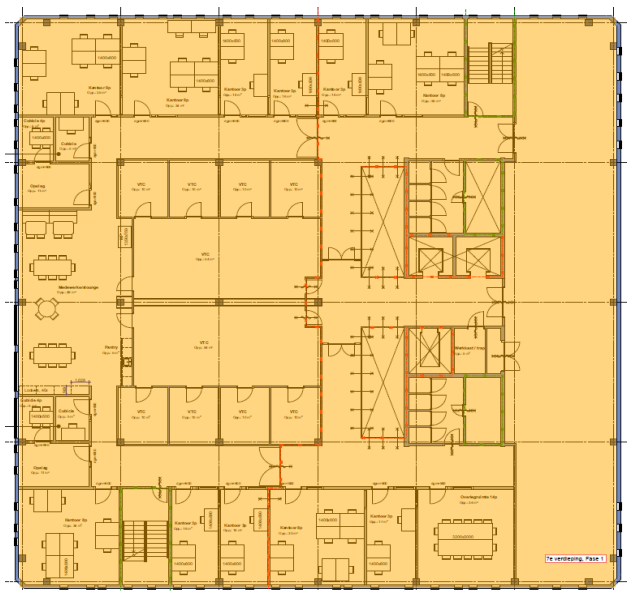

7^e verdieping Fase 1, VTC- ruimtes vrij

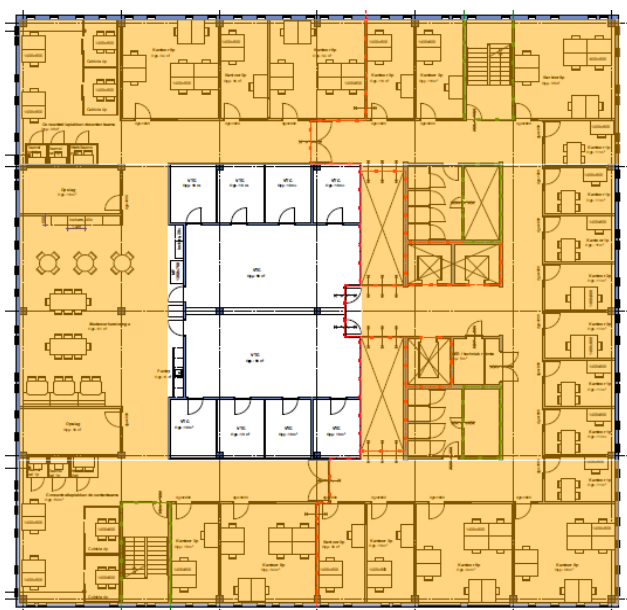

6^e verdieping Fase 1, VTC- ruimtes blijven in gebruik!

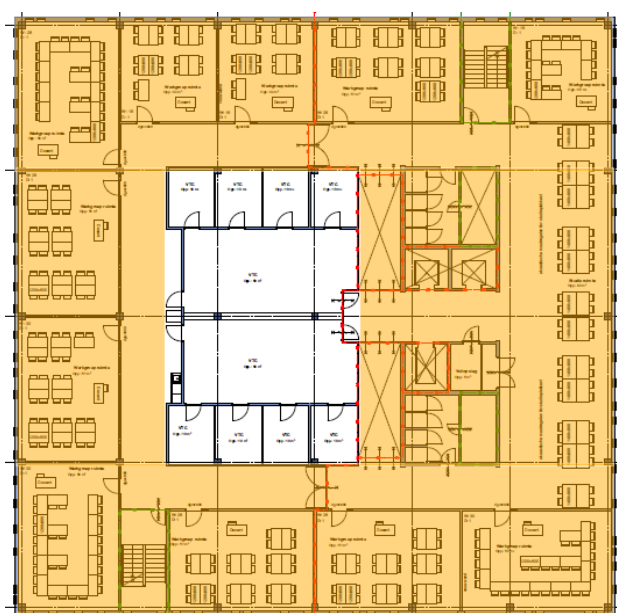

5^e verdieping Fase 1, VTC- ruimtes blijven in gebruik !

7^e verdieping, Fase 1:

De gehele verdieping kan worden gerenoveerd, inclusief de VTC ruimtes (praktijkruimtes)

6^e verdieping, Fase 1:

Gelijktijdig met de renovatie van de 7e verdieping start de 6e verdieping.

De VTC- ruimtes dienen echter operationeel gehouden te worden zodat de lessen in deze ruimtes door kunnen gaan .

Hiervoor zullen tevens geluidwerende maatregelen moeten worden getroffen.

Idem t.b.v. de 5e verdieping.

Zodra de renovatie van de VTC- ruimtes op de 7e verdieping gereed is kan gestart worden met de renovatie van de volgende verdieping.

5^e verdieping, Fase 1:

Gelijktijdig met de renovatie van de 7e en de 6e verdieping start de 5e verdieping.

De VTC- ruimtes dienen echter operationeel gehouden te worden zodat de lessen in deze ruimtes door kunnen gaan .

Hiervoor zullen tevens geluidwerende maatregelen moeten worden getroffen.

De renovatie van de 3 VTC- ruimtes dient binnen de planning van Fase 1 te worden uitgevoerd. Voorwaarde; slechts 1 verdieping met VTC- ruimtes per keer kan uit bedrijf worden genomen. De VTC- ruimtes op de andere 2 verdiepingen dienen in bedrijf te blijven.
