PM050B Productbeschrijving Planningsnota

Algemene beschrijving
De complexiteit van het projectmanagementproces vraagt om een managementrapportage waarin de Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) en IPM-rolhouders in één rapportage (Planningsnota) inzicht krijgen in hoeverre de mijlpalen gehaald kunnen worden.

Doelstelling:
Het genereren van een Planningsnota die samengevat en begrijpelijk relevante tijdsinformatie voor het project weergeeft ten bate van een optimale projectbeheersing. De Planningsnota wordt samen uitgevraagd met het product PM040B Probabilistische planning.

Uitgangspunten:

- Een geaccepteerd product “PM010B Opstellen deterministische planning” of geaccepteerd product “PM020B Actualiseren deterministische planning”
- Processchema “PM040B Probabilistische planning”
- Processchema “PM050B Planningsnota”
- Vigerende Handreiking PPI

Producteisen:

- Planningsnota dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
    - Managementsamenvatting met betrekking tot de relevante tijdsinformatie uit de Probabilistische planning
    - Algemene stand van zaken
    - Stand van zaken per IPM-rol
    - Veranderingen ten opzichte van de voorgaande geaccepteerde (Baseline) planning
    - Knelpunten en kansen
    - Per (scope/POF)mijlpaal een waarschijnlijkheidscurve (S-curve) waarin minimaal de P85 en de Pmeanwaarde zijn af te lezen
    - Tornadodiagram waarin is aangeven welke risico’s en activiteiten, inclusief marges, de meeste invloed hebben op het doorrekenen van de planning
    - Mijlpalenoverzicht met de scope/POF, deterministische en P85 data
    - Relatieschema waarin aangegeven is welke risico’s aan welke activiteiten zijn gekoppeld
    - Trenddiagram van de deterministische en P85 (scope/POF)mijlpalen
    - Analyse van het kritieke pad
    - Analyse van de resultaten uit de Probabilistische planning
    - Conclusie en forecast
    - Advies aan de MPB OG op basis van de conclusie en forecast
- Resultaten en besluiten planningssessie (zie product “PM040B probabilistische planning”).
- De Planningsnota dient door de MPB OG aantoonbaar te zijn geaccepteerd.

PM050B Processchema Planningsnota

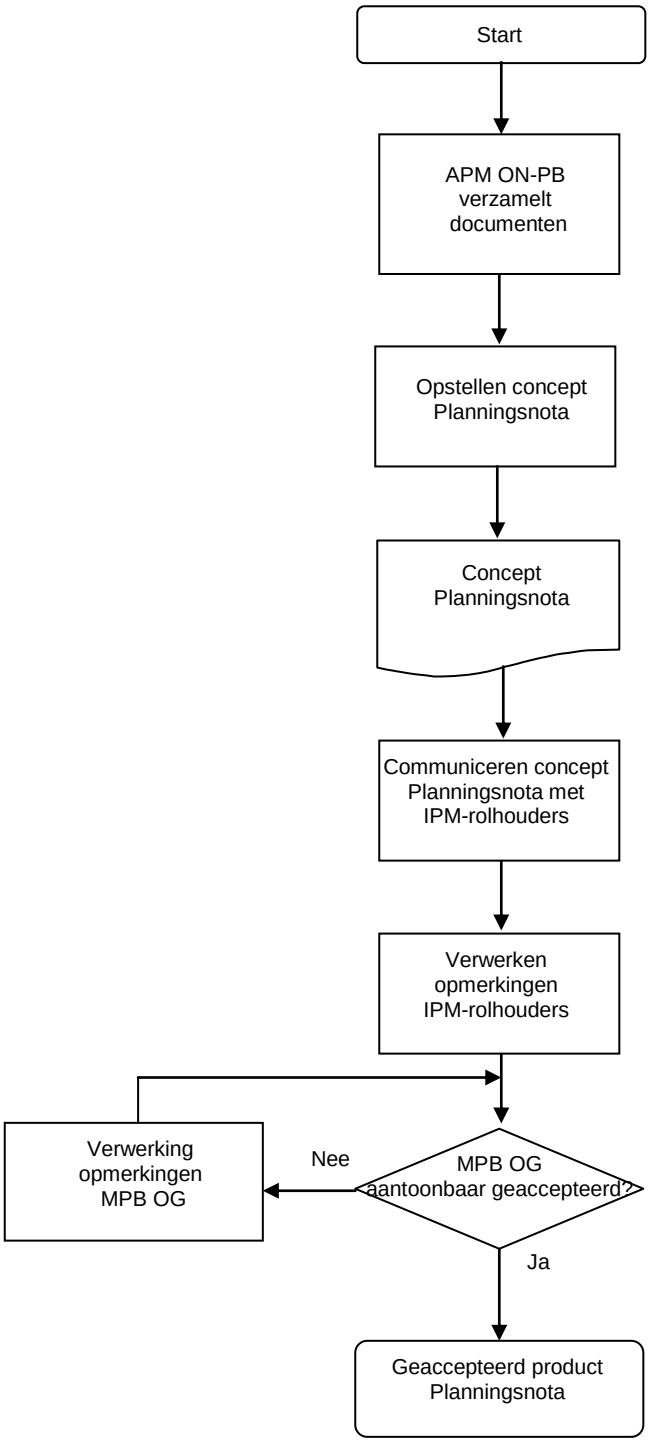

Proces: Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) verzamelt input documenten o.a.: door Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) aantoonbaar geaccepteerde:
- Actuele planning termijn x
- Baselineplanning termijn x
- Probabilistische planning termijn x
- Probabilistische analyse
- Bevindingennotitie termijn x

Proces: APM ON-PB stelt concept Planningsnota op. Opstellen o.b.v. verzamelde input, intake MPB OG en analyse van de resultaten uit de Probabilistische planning.

Output: Concept Planningsnota

Proces: APM ON-PB communiceert de Planningsnota met IPM-rolhouders en heeft hierin uitvoerings-/voorzittersrol. Doel communiceren: beoordeling concept Planningsnota door IPM-rolhouders

Proces: APM ON-PB verwerkt de opmerkingen van de IPM-rolhouders in de Planningsnota en levert Planningsnota aan MPB OG ter acceptatie.

Check: MPB OG beoordeelt de planningsnota en accepteert aantoonbaar.
