PM090A Productbeschrijving Product Toets ter acceptatie ingediende Baselineplanning

Algemene beschrijving
De planning is bij uitstek een instrument voor de beheersing van het project, bovendien is de planning vaak de basis voor de betaling. Opdrachtnemer (realisatiecontract) dient aan het begin van het werk en gedurende het werk bij grote wijzigingen nieuwe Baselineplanningen in. Deze planning wordt door Opdrachtnemer ter acceptatie aangeboden aan Opdrachtgever. De Baselineplanning moet op basis van de gestelde planningseisen in het hoofdcontract worden beoordeeld.

Doelstelling:
Het beoordelen, door middel van een documenttoets, van de door Opdrachtnemer ter acceptatie ingediende Baselineplanning aan de gestelde planningseisen in het hoofdcontract

Uitgangspunten:

- Processchema “PM090A Toets ter acceptatie ingediende Baselineplanning”
- Vigerend kader Contractbeheersing

Producteisen:

- De ter acceptatie ingediende Baselineplanning dient beoordeeld te worden op basis van de in het hoofdcontract gestelde planningseisen.
- De beoordeling dient, door middel van een documenttoets, uitgevoerd te worden conform de toetsdocumenten Contractbeheersing.
- Het toetsdocument dient het doel en specifieke producteisen en wensen vanuit de Opdrachtgever te bevatten.
- Het toetsdocument dient de bronnen, inclusief het door de Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) doorlopen proces met andere clusters/projectmedewerkers te bevatten.
- Het toetsdocument dient een conclusie of wel / niet wordt voldaan aan de planningseisen in het hoofdcontract te bevatten, evenals een advies aan Opdrachtgever en CM op basis van de conclusie.
- Het toetsdocument dient door de Contractmanager (CM) en Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) aantoonbaar te zijn geaccepteerd.

PM090A Processchema Toets ter acceptatie ingediende Baselineplanning

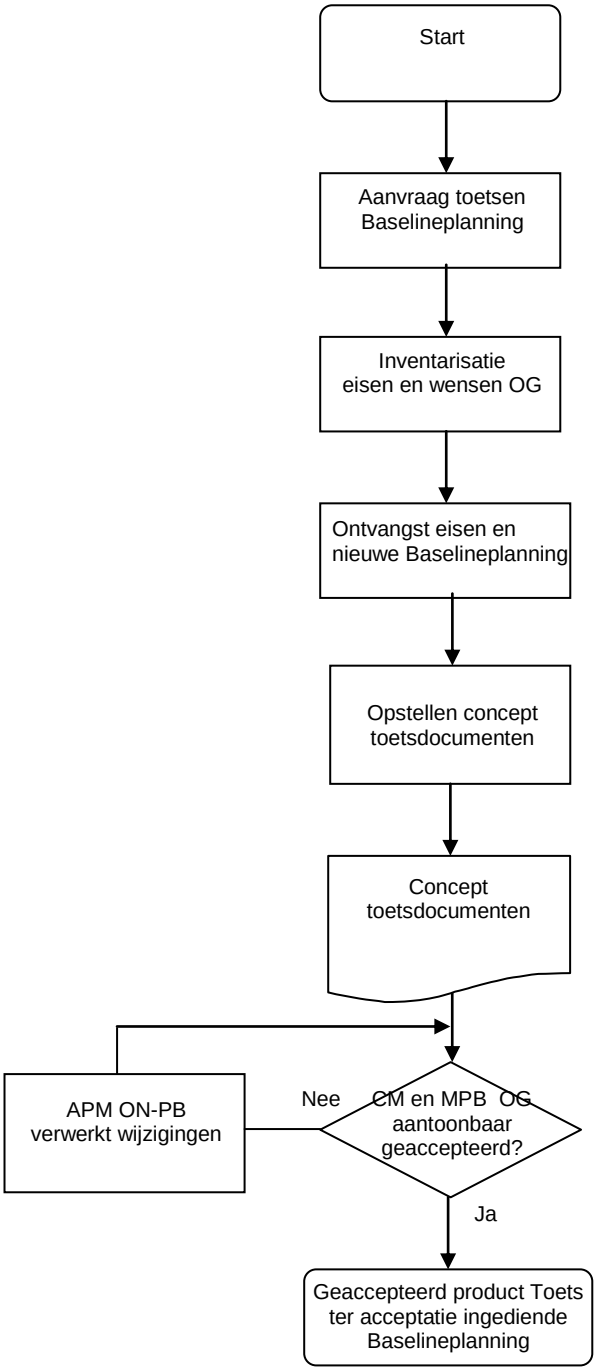

Proces:	Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) ontvangt een aanvraag voor Toets ter acceptatie ingediende Baselineplanning van Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) of Contractmanager (CM)
Proces:	APM ON-PB inventariseert doel en specifieke producteisen en wensen in overleg met Opdrachtgever en bespreekt het vervolgproces
Proces:	APM ON-PB neemt gestelde planningseisen in het hoofdcontract en nieuwe Baselineplanning in ontvangst.
Proces:	APM ON-PB beoordeelt ingediende Baselineplanning en stelt concept toetsdocument op. APM ON-PB communiceert met belanghebbenden/IPM-rolhouders en/of andere adviseurs
Output:	APM ON-PB levert beoordeling Baselineplanning (concept toetsdocumenten) Contractmanager (CM)en MPB OG ter beoordeling en acceptatie
Check:	CM en MPB OG beoordelen de toetsdocumenten en accepteren aantoonbaar
