


Herinrichting Gemeentewerf & Inrichting energierotonde Ballumerbocht




Agenda

- Kennismaking
- Korte toelichting ontwerp
- Aandachtspunten werken op Ameland
- Aanbestedingsplanning

Kennismaking


- | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| • Arjan Geertsema | Projectleider | Gemeente Groningen |
| • Emma Kooij | Adviseur inkoop en aanbesteden | Gemeente Groningen |
| • Gerard Rijpstra | Technisch adviseur civiel | Gemeente Ameland |
| • Hans Kuperus | Directievoerder | Gemeente Ameland |

Ontwerp

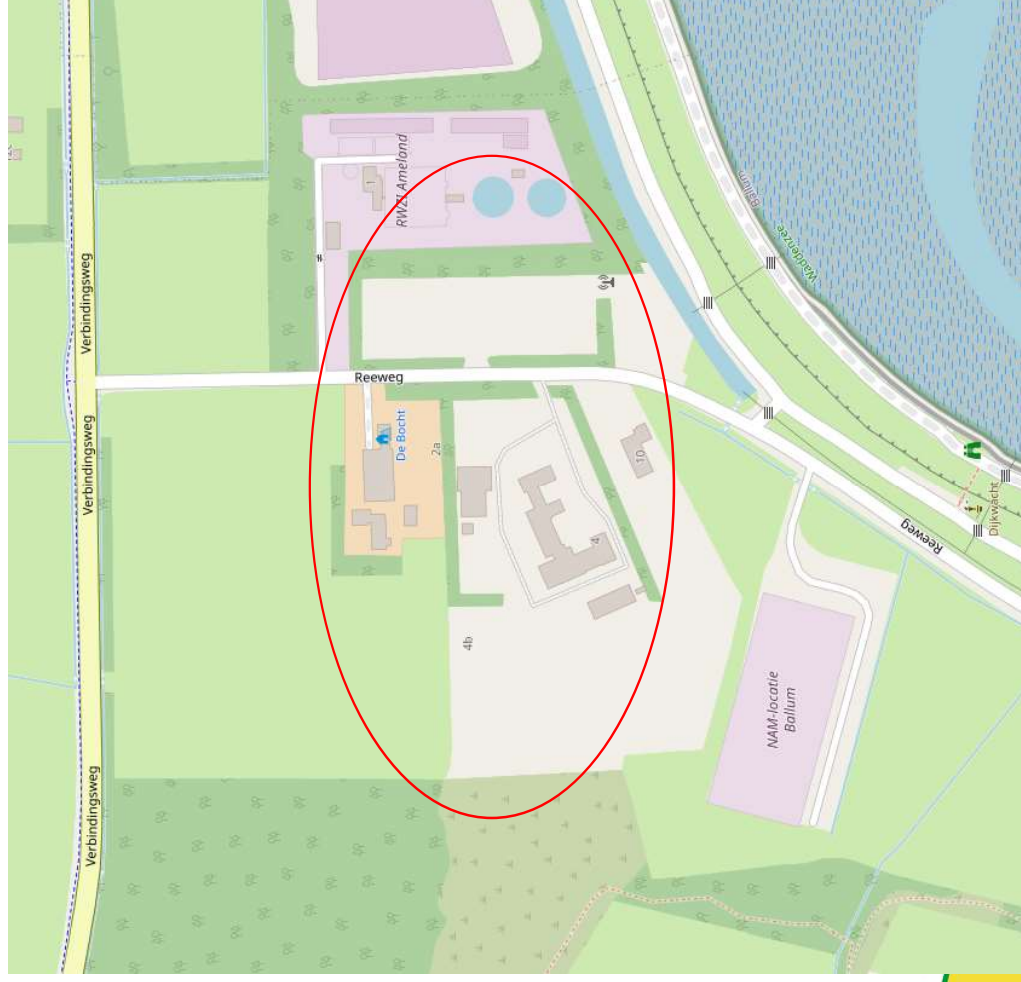

Ontwerp



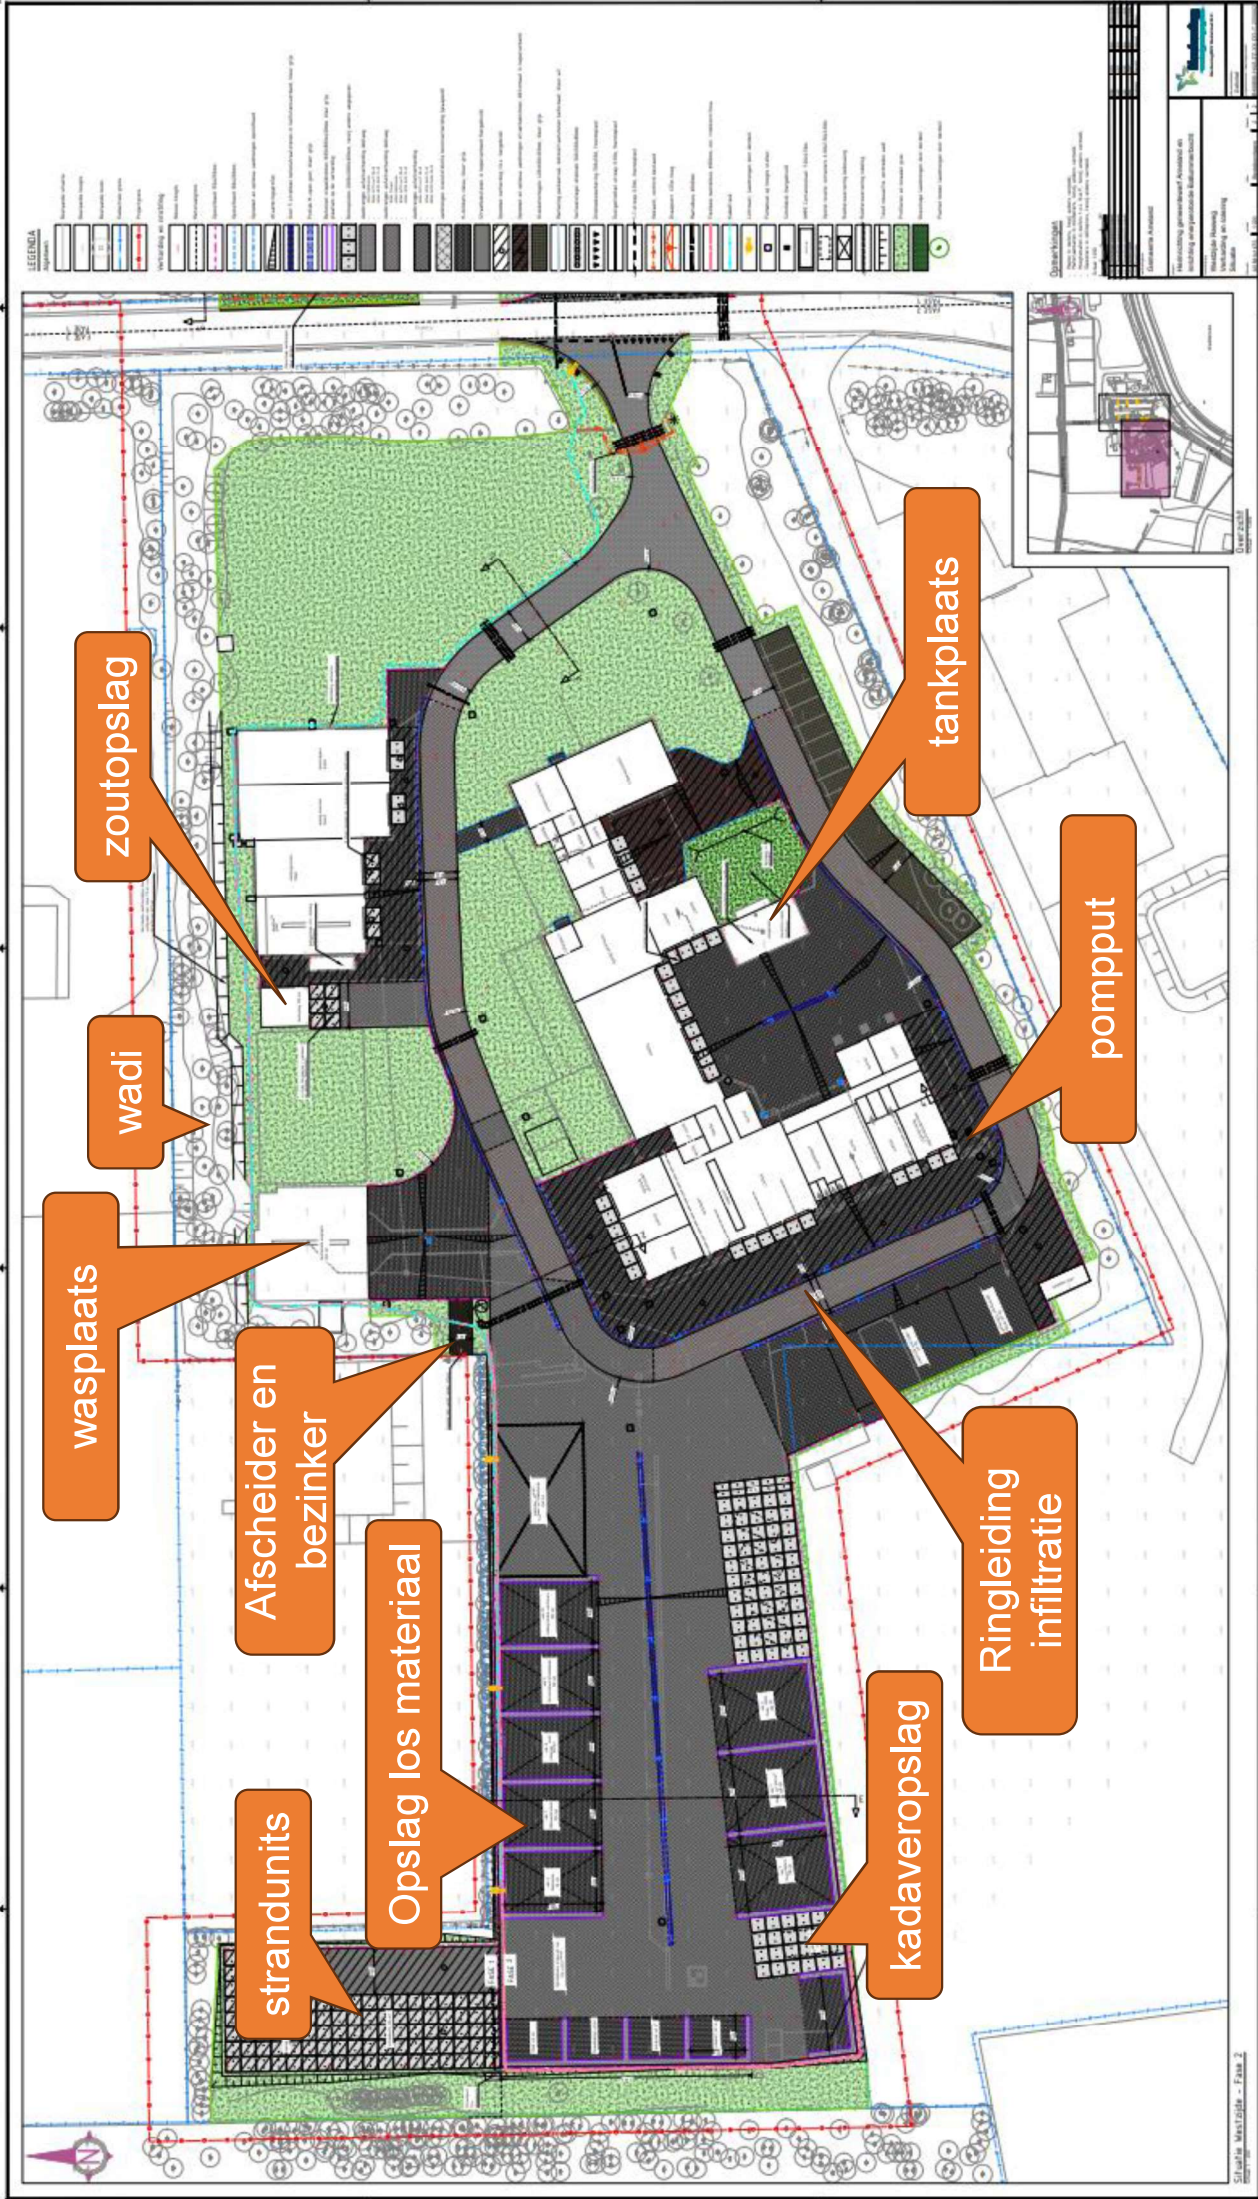


Aandachtspunten werken op Ameland

- Transport van personeel, materiaal en materieel via de veerdienst
- Afstemming op bootdiensten en logistieke planning
- Invloed van reistijd op werktijden
- Mogelijke noodzaak tijdelijke huisvesting
- Extra kosten door eilandlogistiek



Transport & logistiek

- Aan- en afvoer verloopt via de veerboot
- Materieel tijdig reserveren en aanmelden
- Langere voorbereidingstijd voor leveringen
- Minder flexibiliteit bij spoedleveringen

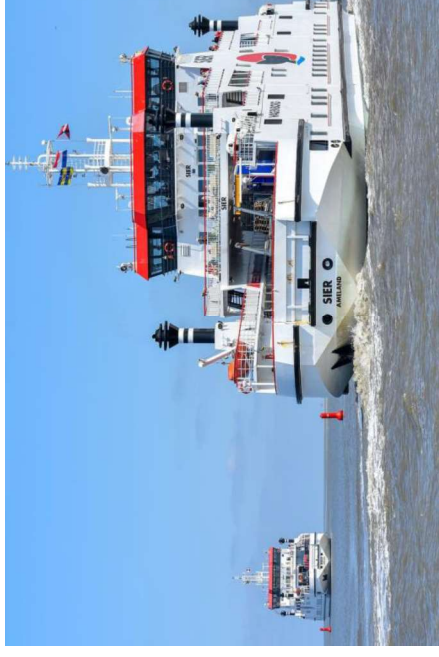


Personeel & werktijden

- Werktijden afhankelijk van boottijden
- Dagelijks reizen beperkt effectieve werktijd
- Vertraging mogelijk door weersomstandigheden
- Strakke dagplanning noodzakelijk



Huisvesting

- Beperkte beschikbaarheid accommodaties
- Tijdige reservering noodzakelijk
- Afweging tussen reizen en verblijf
- Verblijf op Ameland kan efficiënter zijn



Samenvatting

Eilandlogistiek vraagt zorgvuldige voorbereiding

Planning moet aansluiten op veerdienstregeling

Transport en verblijf brengen extra kosten mee

Aannemers dienen rekening te houden met beperkte flexibiliteit

Aanbestedingsplanning

De inschrijffase	
19-5-2026	Aankondiging van de opdracht
27-5-2026 16 uur	Digitale informatiebijeenkomst
2-6-2026 10 uur	Uiterste ontvangst van vragen voor inschrijvingen
8-6-2026	Publicatie van de nota van inlichtingen
16-6-2026 10 uur	Uiterste ontvangst van vragen voor inschrijvingen (ronde 2)
18-6-2026	Publicatie van de nota van inlichtingen (ronde 2)
30-6-2026 10 uur	Uiterste termijn van indiening inschrijvingen
30-6-2026	Openen van de kluis
30-7-2026	Gestanddoening
De beoordelingsfase	
n.v.t.	Toetsen en beoordelen van de inschrijvingen
De gunningsfase	
8-7-2026	Bekendmaking van de voorgenomen gunning
29-7-2026	Definitieve opdrachtverlening

Herinrichting Gemeentewerf

“Goed voorbereid naar de overkant.”

